

## PHẦN I: KIẾN TRÚC

(10%)

GIÁO VIÊN H- ÓNG DÃN: PGS-TS. NGUYỄN XUÂN LIÊN

NHIỆM VỤ :

- Giải pháp kiến trúc th- ợng tầng.
- Giải pháp giao thông cho công trình.
- Giải pháp kiến trúc mặt bằng.
- Giải pháp kiến trúc mặt đứng.
- Giải pháp giao thông nội bộ.
- Giải pháp chiếu sáng.
- Giải pháp chống nóng, thông gió.
- Giải pháp thoát khí cho WC.
- Hệ thống cung cấp và thoát n- óc.

## I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Tên công trình: “Trụ sở làm việc công ty Nông nghiệp Hải Dương”.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Hải Dương.
- Chức năng: Phục vụ cho các phòng ban chức năng làm việc, phòng họp, phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc công ty.
- Quy mô xây dựng: Công trình xây dựng là một tòa nhà 9 tầng có đầy đủ các chức năng làm việc của một trụ sở văn phòng. Công trình đ- ợc thiết kế theo phong cách Pháp cổ nh- ng vẫn mang dáng vẻ hiện đại của một trụ sở văn phòng làm việc, t- ờng xứng với quy hoạch tổng thể của khu vực, sự phát triển của đất n- ớc và nhu cầu làm việc của con ng- ời.

## II. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC:

### 1. Giải pháp kiến trúc th- ợng tầng:

Toàn bộ công trình thể hiện phong cách kiến trúc Pháp cổ nh- ng vẫn mang dáng vẻ hiện đại của một công trình trụ sở văn phòng làm việc.

### 2. Giải pháp giao thông cho công trình:

- Xung quanh công trình là các đ- ờng nội khu 2 làn xe. Các đ- ờng này nối với đ- ờng giao thông của thành phố.
- Các chức năng của đ- ờng giao thông nội khu:
  - + Nối liền giao thông giữa các khu nhà và với đ- ờng giao thông của thành phố.
  - + Đảm bảo cho xe con, xe cứu hoả, thông tắc cống ngầm, bể phốt... tiếp cận đ- ợc với công trình.

### 3. Giải pháp kiến trúc mặt bằng:

- Công trình đ- ợc bố trí có mặt bằng hình chữ nhật chiều dài của công trình là: 24 m, chiều rộng: 15,3 m, và có h- ống Bắc-Nam rất thuận tiện về h- ống gió và h- ống chiếu sáng.
- Khu WC đ- ợc bố trí ở cùng một vị trí thông suốt từ tầng một đến mái vẫn đảm bảo hợp lý theo từng tầng, phù hợp với không gian đi lại trong công trình.
- Giao thông đi lại đ- ợc bố trí một thang máy và một thang bộ ở giữa công trình thuận tiện cho việc đi lại giữa các tầng, và giữa các phòng ban. Các bình chữa cháy đ- ợc bố trí ở cầu thang bộ.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

## 4. Giải pháp kiến trúc mặt đứng:

- Công trình có chiều cao đỉnh mái là : 35,1 m
- Chiều cao các tầng là : 3,6 m.
- Cốt cao trìngh một cao hơn cốt vỉa hè là : 450 cm.
- Ban công tầng có lan can sử dụng con tiện bằng xi măng. T-ờng mặt ngoài đ-ợc quét vôi màu vàng chanh. Các đ-ờng phào, chỉ đ-ợc quét vôi màu nâu đậm. Cửa sổ bằng kính mở tr-ợt về hai phía. Cửa đi làm bằng gỗ đ-ợc trang trí với các đ-ờng phào nổi rất khoẻ khoắn. Tất cả làm cho mặt đứng của công trình rất trang nhã mà vẫn mang phong cách hiện đại.

## 5. Giải pháp giao thông nội bộ:

Để đảm bảo thuận lợi cho giao thông giữa các tầng tránh ùn tắc số giờ cao điểm và để đề phòng sự cố mất điện, cháy nổ công trình bố trí một cầu thang bộ ở giữa công trình, giao thông giữa các căn phòng đ-ợc thực hiện nhờ hành lang rộng 2,7 m ở tr-ớc cửa các căn phòng.

## 6. Giải pháp chiếu sáng:

Các căn phòng đều có cửa sổ kính nên đảm bảo tốt việc lấy sáng tự nhiên. Ngoài ra còn có hệ thống đèn trần phục vụ cho việc chiếu sáng khi đêm xuống.

## 7. Giải pháp chống nóng, thông gió:

Để chống nóng cho các căn phòng thì t-ờng bao quanh nhà đ-ợc xây gạch 220 vừa mang tính chất chịu lực vừa còn để tạo bề dày cách nhiệt.

Mái của công trình đ-ợc sử dụng lớp bê tông xỉ vừa để tạo độ dốc và để cách nhiệt cho công trình,lớp trên cùng đ-ợc lát gạch chống nóng. Cửa sổ ở các phòng có tác dụng lấy ánh sáng, thông gió và làm giảm sức nóng cho phòng.

## 8. Giải pháp thoát khí cho WC:

Các khu WC đều đ-ợc bố trí ở cùng một vị trí thông suốt với các tầng từ tầng một đến tầng 9 cho nên không khí trong các WC sẽ đ-ợc thoát ra ngoài thông qua cửa ở các hộp kĩ thuật chạy từ tầng một đến mái.

## 9. Hệ thống cấp điện:

Nguồn điện cung cấp cho công trình là mạng 1-ối điện thành phố 220V/380V trong khu có bố trí một trạm biến áp công suất 2000KVA để cung cấp điện cho khu vực. Năng l-ợng điện đ-ợc sử dụng cho các nhu cầu sau:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

- Điện thấp sáng trong nhà.
- Điện thấp sáng ngoài nhà.
- Máy điều hoà nhiệt độ cho các căn phòng.
- Điện máy tính, máy bơm n- ớc, cầu thang máy.
- Các nhu cầu khác.

## 10. Hệ thống cung cấp và thoát n- ớc:

### 10.1. Hệ thống cấp n- ớc:

N- ớc từ hệ thống cấp n- ớc thành phố chảy vào bể ngầm của công trình từ đó dùng bơm cao áp đ- a n- ớc lên két n- ớc của tầng mái từ đó n- ớc sẽ đ- ợc đ- a tới các nơi sử dụng, khu vệ sinh và các vị trí cứu hoả.

### 10.2. Hệ thống thoát n- ớc:

- Thoát n- ớc m- a trên mái bằng cách tạo dốc mái để thu n- ớc về các ống nhựa PVC có đ- ờng kính  $d = 100$  chạy từ mái xuống đất và sả vào các rãnh thoát n- ớc (chạy xung quanh công trình) rồi thu về các ga tr- ớc khi đ- a vào hệ thống thoát n- ớc của thành phố.

- Thoát n- ớc thải của các khu WC bằng các đ- ờng ống đi trong t- ờng hộp kỹ thuật từ WC dẫn xuống bể phốt, bể xử lý n- ớc thải tr- ớc khi đ- a ra hệ thống thoát n- ớc của thành phố.

## III. GIẢI PHÁP KẾT CẤU:

### 1. Giải pháp về vật liệu:

#### 1.1 Vật liệu phần thô:

- Cát đổ bê tông dùng cát vàng.
- Bê tông dùng BT cấp độ bền B15
- Cát xây trát dùng cát đen.
- Sỏi, đá dăm kích th- ớc 1x2cm.
- Xi măng PC 300.
- Thép có đ- ờng kính  $d < 10$  mm dùng thép AI ( $R_a = 230$  MPa).
- Thép có đ- ờng kính  $d > 10$  mm dùng thép AII ( $R_a = 280$  MPa).

#### 1.2. Vật liệu để hoàn thiện:

##### a. Nền (sàn) các tầng:

- Nền lát gạch lát  $300 \times 300$

- Nền khu vực WC lát gạch chống trơn  $200 \times 300$

##### b. T- ờng:

- Mặt ngoài sơn vàng chanh

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

- Mặt trong vàng kem
- Phào chỉ mặt ngoài sơn màu nâu đậm
- Tường khu vực WC ốp gạch men kính cao 1,8 m

c. Trần:

- Toàn bộ trần đ- ợc sơn màu trắng.

d. Cửa:

- Cửa phòng là pano đặc, gỗ dổi
- Cửa sổ trong là pano kính, ngoài cửa sổ chớp gỗ dổi
- Cửa WC là cửa kính khung nhôm.
- Cửa thoảng khu vực WC là cửa chớp kính.

## 2. Giải pháp về kết cấu công trình trên mặt đất:

- Với mặt bằng công trình không lớn lắm rộng, yêu cầu công năng và sử dụng của nhà thuộc loại nhà để làm việc nên bố trí kết cấu hệ khung cột, dầm, sàn nh- bình th- ờng, dầm nhịp khoảng 6,3 m và không có dầm phụ.
- VỚI NHÀ TRỤ SỞ DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC CÓ CHIỀU CAO LỚN TẢI TRỌNG LỚN ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ CHO KẾT CẤU CHỊU LỰC TẠ BỐ TRÍ KẾT CẤU HỆ KHUNG BTCT CHỊU LỰC.

## 3. Giải pháp về sơ đồ tính:

- Khi xác định nội lực trong các cấu kiện của công trình nếu xét đầy đủ, chính xác tất cả các yếu tố của công trình thì rất phức tạp. Vì vậy, ng-ời ta dùng sơ đồ tính của công trình để tiện cho việc tính toán mà vẫn đảm bảo an toàn, phản ánh sát thực sự làm việc thực tế của công trình.
- Để có sơ đồ tính ta l-ợc bỏ các yếu tố không cơ bản và giữ lại các yếu tố chủ yếu quyết định khả năng làm việc của công trình. Việc lựa chọn sơ đồ tính rất quan trọng vì nó phụ thuộc vào hình dạng kết cấu, độ cứng, độ ổn định và độ bền của cấu kiện.

- Tiến hành chuyển công trình về sơ đồ tính gồm các b- ớc sau:
  - + Thay các thanh bằng các đ- ờng trung gian gọi là trực.
  - + Thay vật liệu, tiết diện bằng các đặc tr- ng E, J, F, W...
  - + Thay liên kết thực bằng liên kết lý t- ờng.
  - + Đ- a tải trọng tác dụng lên cấu kiện về trực cấu kiện.

## 4. Giải pháp về móng cho công trình:

Công trình nhà thuộc loại nhà cao tầng, tải trọng truyền xuống nền đất lớn nên bắt buộc phải sử dụng ph- ơng án móng sâu (móng cọc). Để có đ- ợc ph- ơng án tối - u cần phải có sự so sánh, lựa chọn đánh giá nên xem sử

# **TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

---

dụng ph- ơng án nào nh- : móng cọc đóng, cọc ép hay cọc khoan nhồi... Để đánh giá một cách hợp lý nhất, ta dựa vào tải trọng cụ thể của công trình và dựa vào điều kiện địa chất thực tế của công trình.

## **PHẦN II: KẾT CẤU**

### **(45 %)**

**GIÁO VIÊN H- ÓNG DẪN: PGS-TS. NGUYỄN XUÂN LIÊN**

#### **NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN:**

- Thiết kế khung trục 5.
- Thiết kế sàn tầng điển hình.
- Thiết kế móng trục 5.
- Thiết kế cầu thang bộ trục (3-4).

**CH- ƠNG 1.**

**PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP KẾT CẤU.**

**I. KHÁI QUÁT CHUNG.**

Xuất phát từ đặc điểm công trình là khối nhà nhiều tầng (9tầng), chiều cao công trình 35,1 m, tải trọng tác dụng vào công trình t- ơng đối phức tạp. Nên cần có hệ kết cấu chịu hợp lý và hiệu quả. Có thể phân loại các hệ kết cấu chịu lực của nhà nhiều tầng thành hai nhóm chính nh- sau:

- + Nhóm các hệ cơ bản: Hệ khung, hệ t- ờng, hệ lõi, hệ hộp.
- + Nhóm các hệ hỗn hợp: Đ- ợc tạo thành từ sự kết hợp giữa hai hay nhiều hệ cơ bản trên.

**1. Hệ khung chịu lực.**

Hệ kết cấu thuần khung có khả năng tạo ra các không gian lớn, linh hoạt thích hợp với các công trình công cộng. Hệ kết cấu khung có sơ đồ làm việc rõ ràng nh- ng lại có nh- ợc điểm là kém hiệu quả khi chiều cao công trình lớn, khả năng chịu tải trọng ngang kém, biến dạng lớn. Để đáp ứng đ- ợc yêu cầu biến dạng nhỏ thì mặt cắt tiết diện, dầm cột phải lớn nên lãng phí không gian sử dụng, vật liệu, thép phải đặt nhiều. Trong thực tế kết cấu thuần khung BTCT đ- ợc sử dụng cho các công trình có chiều cao 20 tầng đối với cấp phòng chống động đất  $\leq 7$ ; 15 tầng đối với nhà trong vùng có chấn động động đất đến cấp 8 và 10 tầng đối với cấp 9.

**2. Hệ kết cấu vách và lõi cứng chịu lực.**

Hệ kết cấu vách cứng có thể đ- ợc bố trí thành hệ thống thành một ph- ơng, 2 ph- ơng hoặc liên kết lại thành các hệ không gian gọi là lõi cứng. Đặc điểm quan trọng của loại kết cấu này là khả năng chịu lực ngang tốt nên th- ờng đ- ợc sử dụng cho các công trình có chiều cao trên 20 tầng. Tuy nhiên độ cứng theo ph- ơng ngang của của các vách t- ờng tỏ ra là hiệu quả ở những độ cao nhất định. Khi chiều cao công trình lớn thì bản thân vách cũng phải có kích th- ớc đủ lớn mà điều đó khó có thể thực hiện đ- ợc. Ngoài ra hệ thống vách cứng trong công trình là sự cản trở để tạo ra các không gian rộng.

**3. Hệ kết cấu. (Khung và vách cứng)**

Hệ kết cấu (khung và vách cứng) đ- ợc tạo ra bằng sự kết hợp hệ thống khung và hệ thống vách cứng. Hệ thống vách cứng th- ờng đ- ợc tạo ra tại

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

khu vực cầu thang bộ, cầu thang máy. Khu vệ sinh chung hoặc ở các t-ờng biên là các khu vực có t-ờng liên tục nhiều tầng. Hệ thống khung đ-ợc bố trí tại các khu vực còn lại của ngôi nhà. Hai hệ thống khung và vách đ-ợc liên kết với nhau qua hệ kết cấu sàn trong tr-ờng hợp này hệ sàn liên khối có ý nghĩa rất lớn. Th-ờng trong hệ thống kết cấu này hệ thống vách đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng ngang. Hệ khung chủ yếu đ-ợc thiết kế để chịu tải trọng thẳng đứng. Sự phân rõ chức năng này tạo điều kiện để tối - u hóa các cấu kiện, giảm bớt kích th- ớc cột và dầm đáp ứng đ-ợc yêu cầu của kiến trúc.

Hệ kết cấu khung + vách tỏ ra là hệ kết cấu tối - u cho nhiều loại công trình cao tầng. Loại kết cấu này sử dụng hiệu quả cho các ngôi nhà đến 40 tầng, nếu công trình đ-ợc thiết kế cho vùng động đất cấp 8 thì chiều cao tối đa cho loại kết cấu này là 30 tầng, cho vùng động đất cấp 9 là 20 tầng.

## II. GIẢI PHÁP KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.

### 1. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu chịu lực chính.

Căn cứ vào thiết kế kiến trúc, đặc điểm cụ thể của công trình: Diện tích mặt bằng, hình dáng mặt bằng, hình dáng công trình theo ph-ong đứng, chiều cao công trình.Công trình cần thiết kế có: Diện tích mặt bằng không lớn lắm, mặt bằng đối xứng, BxL=15,3x24 m hình dáng công trình theo ph-ong đứng đơn giản không phức tạp. Về chiều cao thì điểm cao nhất của công trình là 35,1 m (tính đến nóc tum cầu thang).

Dựa vào các đặc điểm cụ thể của công trình ta chọn hệ kết cấu chịu lực chính của công trình là hệ khung chịu lực.

*Quan niệm tính toán:*

- Khung chịu lực chính: Trong sơ đồ này khung chịu tải trọng đứng theo diện chịu tải của nó và một phần tải trọng ngang, các nút khung là nút cứng.

- Công trình thiết kế có chiều dài 24 (m), chiều rộng 15,3 (m) độ cứng theo ph-ong dọc nhà lớn hơn độ cứng theo ph-ong ngang nhà.

Do đó khi tính toán để đơn giản và thiêng về an toàn ta tách một khung theo ph-ong ngang nhà tính nh- khung phẳng.

### 2. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu sàn nhà.

Trong công trình hệ sàn có ảnh h- ống rất lớn tới sự làm việc không gian của kết cấu. Việc lựa chọn ph-ong án sàn hợp lý là điều rất quan trọng.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

Do vậy, cần phải có sự phân tích đúng để lựa chọn ra phong án phù hợp với kết cấu của công trình. Ta xét các phong án sàn sau:

## 2.1. Sàn sàn toàn khối.

Cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn.

*Ưu điểm:* Tính toán đơn giản, đợc sử dụng phổ biến ở nước ta với công nghệ thi công phong phú nên thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi công.

*Nhược điểm:* Chiều cao dầm và độ vồng của bản sàn rất lớn khi vẹt khẩu độ lớn, dẫn đến chiều cao tầng của công trình lớn nên gây bất lợi cho kết cấu công trình khi chịu tải trọng ngang và không tiết kiệm chi phí vật liệu. Không tiết kiệm không gian sử dụng.

## 2.2. Sàn ô cờ.

Cấu tạo gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phong, chia bản sàn thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách giữa các dầm không quá 2m. Phù hợp cho nhà có hệ thống lối cột vuông.

*Ưu điểm:* Tránh đợc có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm đợc không gian sử dụng và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và không gian sử dụng lớn nhội trờng, câu lạc bộ.

*Nhược điểm:* Không tiết kiệm, thi công phức tạp. Mặt khác, khi mặt bản sàn quá rộng cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó cũng tránh đợc những hạn chế do chiều cao dầm chính phải cao để giảm độ vồng.

## 2.3. Sàn không dầm (sàn nấm).

Cấu tạo gồm các bản kê trực tiếp lên cột. Đầu cột làm mõ cột để đảm bảo liên kết chắc chắn và tránh hiện tượng đâm thủng bản sàn. Phù hợp với mặt bằng có các ô sàn có kích thước nhau.

*Ưu điểm:*

- + Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm đợc chiều cao công trình.
- + Tiết kiệm đợc không gian sử dụng.
- + Thích hợp với những công trình có khẩu độ vừa ( $6 \div 8m$ ) và rất kinh tế với những loại sàn chịu tải trọng  $>1000 \text{ kg/m}^2$ .

*Nhược điểm:*

- + Chiều dày bản sàn lớn, tốn vật liệu.
- + Tính toán phức tạp.

## **TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

+ Thi công khó vì nó không đ- ợc sử dụng phổ biến ở n- ớc ta hiện nay, nh- ng với h- ống xây dựng nhiều nhà cao tầng, trong t- ơng lai loại sàn này sẽ đ- ợc sử dụng rất phổ biến trong việc thiết kế nhà cao tầng.

*Kết luận.*

Căn cứ vào:

+ Đặc điểm kiến trúc và đặc điểm kết cấu của công trình: Kích th- ớc các ô bản sàn không giống nhau nhiều.

+ Cơ sở phân tích sơ bộ ở trên.

Kết luận lựa chọn ph- ơng án sàn s- ờn toàn khối để thiết kế cho công trình.

**CH- ƠNG 2.**

**XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH TH- ỚC CÁC CẤU KIỆN VÀ XÁC ĐỊNH  
TẢI TRỌNG ĐƠN VỊ.**

**I. CHỌN KÍCH THỰC CÁC CẤU KIỆN**

**1. Quan niệm tính toán.**

Công trình là “trụ sở công ty nông nghiệp Hải Đông” công trình cao 9 tầng, b- ớc nhịp khung lớn nhất là 6,3 m. Do đó ở đây ta sử dụng hệ khung dầm chịu tải trọng của nhà. Kích th- ớc của công trình theo ph- ơng ngang là 15,3 m và theo ph- ơng dọc là 24 m. Độ cứng của nhà theo ph- ơng dọc lớn hơn so với độ cứng của nhà theo ph- ơng ngang. Toà nhà có thang máy nh- ng đ- ợc xây bằng gạch. Do vậy ta có thể tính toán nhà theo sơ đồ khung ngang phẳng thuần tuý.

**2. Sơ bộ chọn kích th- ớc sàn, dầm, cột.**

Nội lực trong khung phụ thuộc vào độ cứng của các cấu kiện dầm, cột. Do vậy tr- ớc hết ta phải sơ bộ xác định kích th- ớc của các tiết diện. Gọi là sơ bộ vì sau này còn phải xem xét lại, nếu cần thiết thì phải sửa đổi.

**2.1.Kích th- ớc chiều dày bản sàn.**

$$h_s = \frac{KL_n}{37+8\alpha} ; \alpha = \frac{L_n}{l_d}$$

**2.1.1. Ô sàn 1**

Kích th- ớc  $l_1 \times l_2 = 4,5 \times 6,3$  m

$$\alpha_1 = \frac{4,5}{6,3} = 0,7143$$

-Hoạt tải tính toán

$$P_{s1} = P^c \cdot n = 200 \cdot 1,2 = 240 \text{ daN/m}^2$$

(TCVN 2737 – 1995)

-Tính tải tính toán ch- a kề đến trọng l- ợng bản thân sàn.

+Gạch ceramic dày 8 mm,  $\gamma_0 = 2000 \text{ daN/m}^3 \rightarrow 0,008 \cdot 2000 = 16 \text{ daN/m}^2$

$$g_g = 16 \cdot 1,1 = 17,6 \text{ daN/m}^2$$

+Vữa trát dày 30 mm,  $\gamma_0 = 2000 \text{ daN/m}^3 \rightarrow 0,03 \cdot 2000 = 60 \text{ daN/m}^2$

$$g_v = 60 \cdot 1,3 = 78 \text{ daN/m}^2$$

+Vữa trát dày 20 mm,  $\gamma_0 = 2000 \text{ daN/m}^3 \rightarrow 0,02 \cdot 2000 = 40 \text{ daN/m}^2$

$$g_{vt} = 40 \cdot 1,3 = 52 \text{ daN/m}^2$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

-Tổng cộng  $g^t = 17,6 + 78 + 52 = 147,6 \text{ daN/m}^2$

-Do không có t-ờng xây trực tiếp lên sàn nên:

$$g_0 = g^t = 147,6 \text{ daN/m}^2$$

-Tải trọng phân bố tính toán trên sàn:

$$q_0 = g_0 + p_s = 240 = 147,6 = 387,6 \text{ daN/m}^2$$

$$q_0 < 400 \text{ daN/m}^2 \rightarrow K = 1$$

Chiều dày sàn O<sub>1</sub>:

$$h_{s1} = \frac{1,4,5}{37 + 8,0,7143} = 0,10053$$

Chọn h<sub>s1</sub>=10 cm

-Nếu kề đến trọng l-ợng bản thân sàn O<sub>1</sub>

+ Tính tải tính toán

$$g_{s1} = g_0 + \gamma_{bt} \cdot h_{s1} \cdot n = 147,6 + 2500 \cdot 0,1 \cdot 1,1 = 422,6 \text{ daN/m}^2$$

+ Tổng tải trọng phân bố trên sàn O<sub>1</sub>:

$$q_{s1} = p_{s1} + g_{s1} = 240 + 422,6 = 662,6 \text{ daN/m}^2$$

2.1.2. Ô sàn 2 (sàn hành lang).

-Kích th- ớc l<sub>1</sub>xl<sub>2</sub> = 2,7x4,5 m

-Hoạt tải tính toán

$$p_{s2} = p^c \cdot n = 300 \cdot 1,2 = 360 \text{ daN/m}^2 \text{ (TCVN 2737 - 1995)}$$

-Tính tải ch- a kề đến trọng l-ợng bản thân sàn: g<sub>0</sub>=147,6 daN/m<sup>2</sup>

-Tải trọng phân bố tính toán trên sàn

$$q_{s2} = g_0 + p_{s2} = 147,6 + 360 = 507,6 \text{ daN/m}^2$$

$$K = \sqrt[3]{\frac{q_{s2}}{400}} = \sqrt[3]{\frac{507,6}{400}} = 1,08$$

$$\alpha_2 = \frac{Ln}{Ld} = \frac{2,7}{4,5} = 0,6$$

Chiều dày sàn O<sub>2</sub>:

$$h_{s2} = \frac{1,08 \cdot 2,7}{37 + 8,0,6} = 0,0697(m)$$

Chọn h<sub>s2</sub>=8cm

-Nếu kề đến trọng l-ợng bản thân sàn O<sub>2</sub>:

+Tính tải tính toán sàn O<sub>2</sub>

$$g_{s2} = g_0 + \gamma_{bt} \cdot h_{s2} \cdot n = 147,6 + 2500 \cdot 0,08 \cdot 1,1 = 367,6 \text{ daN/m}^2$$

+Tổng tải trọng phân bố tính toán sàn O<sub>2</sub>:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$q_{s2}=p_{s2}=g_{s2}=360+367,6 \text{ daN/m}^2$$

2.1.3. Ô sàn 3.

-Kích th- óc  $l_1 \times l_2 = 1,2 \times 4,5 \text{ m}$ .

$$\alpha_3 = \frac{1,2}{4,5} = 0,267$$

-Hoạt tải tính toán:

$$p_{s3}=p_{s2}=240 \text{ daN/m}^2$$

(TCVN 2737 – 1995)

-Tính tải tính toán ch- a kề trọng l- ợng bản thân sàn:

$$g_{o3}^{tt} = 147,6 \text{ daN/m}^2$$

-Tải trọng phân bố tính toán trên sàn:

$$q_{o3}=g_{o3}=p_{s3}=387,6 \text{ daN/m}^2$$

$$q_0 < 400 \text{ daN/m}^2 \rightarrow K=1.$$

Chiều dày sàn O<sub>3</sub>:

$$h_{s3} = \frac{1,1,2}{37 + 0,267} = 0,0306(m)$$

Chọn h<sub>s3</sub>=10 cm.

- Nếu kề đến trọng l- ợng bản thân :

+Tính tải sàn O<sub>3</sub>:

$$g_{s3}=147,6+2500.0,1.1,1=422,6 \text{ daN/m}^2$$

+Tổng:

$$q_{s3}=240 +422,6 = 662,6 \text{ daN/m}^2$$

2.1.4.Sàn mái.

-Hoạt tải tính toán:

$$p_m=p^c.n=7,5.1,3=97,5 \text{ daN/m}^2$$

(TCVN 2737 – 1995)

-Tính tải tính toán ch- a kề đến trọng l- ợng bản thân sàn.

+Gạch chống nóng dày 20 mm:

$$\gamma_0=2000 \text{ daN/m}^2 \rightarrow 0,02.2000 = 40 \text{ daN/m}^2$$

$$g_v=40.1,1=44 \text{ daN/m}^2$$

$$+Vữa lót dày 30 mm, \gamma_0=2000 \text{ daN/m}^2 \rightarrow 0,03.2000 = 60 \text{ daN/m}^2$$

$$g_u=60.1,3=78 \text{ daN/m}^2$$

+Bê tông xỉ tạo dốc dày 50 mm:

$$\gamma_0=1200 \text{ daN/m}^2 \rightarrow 0,05.1200 = 60 \text{ daN/m}^2$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$g_{bt}=60,1,3=78 \text{ daN/m}^2$$

+Bê tông chống thấm dày 50 mm,

$$\gamma_0=2500 \text{ daN/m}^2 \rightarrow g_{btc}=0,05 \cdot 2500=125 \text{ daN/m}^2$$

+Vữa trát dày 20mm:  $\rightarrow 0,02 \cdot 2000=40 \text{ daN/m}^2$

$$g_t=40,1,3=52 \text{ daN/m}^2$$

-Tổng cộng:  $g=377 \text{ daN/m}^2$

-Do không có t-ờng xây trực tiếp lên sàn:

$$g_0=g=377 \text{ daN/m}^2$$

Tải trọng phân bố tính toán trên sàn

$$q=g_0+p_m=377+97,5=349,5 \text{ daN/m}^2$$

Chọn chiều dày mái là  $h_{sm}=10 \text{ cm}$

Nếu kể đến trọng l-ợng bê tông mái

-Tính tải tính toán sàn mái

$$g_m=g_0+\gamma_{bt} \cdot h_{sm} \cdot n = 377+2500 \cdot 0,1 \cdot 1,1=597 \text{ daN/m}^2$$

- Tổng tải trọng phân bố tính toán trên mái

$$q_m=p_m+g_m=97,5+597=694,5 \text{ daN/m}^2$$

## 2.2.Lựa chọn kích th-ớc sơ bộ dầm

### 2.2.1.Dầm ngang:(dầm khung)

-Kích th-ớc các nhịp dầm ngang là:  $l_{AB}=6,3 \text{ m}; l_{BC}=2,7 \text{ m};$

$l_{CD}=6,3 \text{ m}$ ; Côngxôn  $l_c=1,2 \text{ m}$

+Chiều cao tiết diện dầm nhịp AB , CD và Côngxôn chọn nh- sau:

$$h_d = \frac{l_d}{m_d} = \frac{6,3}{10} = 0,63 \text{ m} \rightarrow \text{Chọn } h_d = 700 \text{ mm}$$

$$b = (0,3 \div 0,5) \times h \rightarrow \text{Chọn } b = 220 \text{ mm}$$

+ Chiều cao tiết diện dầm nhịp BC chọn nh- sau:

$$h_d = \frac{l_d}{m_d} = \frac{2,7}{10} = 0,27 \text{ m} \rightarrow \text{Chọn } h_d = 300 \text{ mm}$$

$$b = (0,3 \div 0,5) \times h \rightarrow \text{Chọn } b = 220 \text{ mm}$$

### 2.2.2.Dầm dọc: Nhịp dầm L = 4,5 m.

+ Chiều cao tiết diện dầm:

$$h_d = \frac{l_d}{m_d} = \frac{4,5}{12} = 0,375 \text{ m} \rightarrow \text{Chọn } h_d = 400 \text{ mm}$$

+Bề rộng tiết diện dầm: Chọn  $b_d = 220 \text{ mm}$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Vật liệu th- ớc tiết diện dầm: b×h = 220×400 mm

## 2.2.3.Kiểm tra tiết diện dầm theo tải trọng.

-Kiểm tra dầm nhịp AB.

$$h_0 = 2 \cdot \sqrt{\frac{M}{R_b \cdot b}}.$$

R<sub>b</sub> : Cấp độ bền chịu nén của bê tông.

Bê tông cấp độ bền B15 có R<sub>b</sub> = 8,5 MPa.

b : bề rộng dầm, b = 0,22 m.

M : Mômen do tải trọng tác dụng lên dầm. M = (0,6÷0,7) M<sub>0</sub>.

$$M_0 : Mômen tính cho dầm đơn giản có 2 đầu gối tựa. M_0 = \frac{qL^2}{8}.$$

$$q = B.(p_s + g_s) + g_d = 4,5 \cdot 6,626 + 0,22 \cdot 0,7 \cdot 250 = 68,317 \text{ KN/m}$$

$$M_0 = \frac{qL^2}{8} = \frac{68,317 \cdot 6,3^2}{8} = 338,9 \text{ KN.m}$$

$$M = 0,6 M_0 = 203,36 \text{ KN.m}$$

$$h_0 = 2 \cdot \sqrt{\frac{M}{R_b \cdot b}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{203,36}{8,5 \cdot 1000 \cdot 0,22}} = 0,659 \text{ m} = 65,9 \text{ mm}$$

$$h^{gt}_0 = 70 - 2,5 = 67,5 \text{ mm}.$$

h<sub>0</sub> < h<sup>gt</sup><sub>0</sub> → tiết diện dầm sơ bộ thoả mãn về điều kiện kiểm tra tải trọng.

## 2.3.Lựa chọn sơ bộ kích th- ớc cột.

- Diện tích tiết diện ngang của cột sơ bộ chọn theo công thức:

$$A = k \cdot \frac{N}{R_b}$$


-Trong đó:

+N: Lực dọc trong cột do tải trọng đứng,xác định đơn giản bằng cách tính tổng tải trọng đứng tác dụng lên phạm vi truyền tải vào cột.

+R<sub>b</sub>: C- ờng độ chịu nén của bêtông, sử dụng bêtông cấp độ bền B15 có R<sub>b</sub>=8,5 MPa

+k: hệ số kể đến ảnh h- ờng của Mômen, k =1,0÷1,5.

+Diện truyền tải của các cột trục 5 đ- ợc xác định nh- hình vẽ d- ới đây

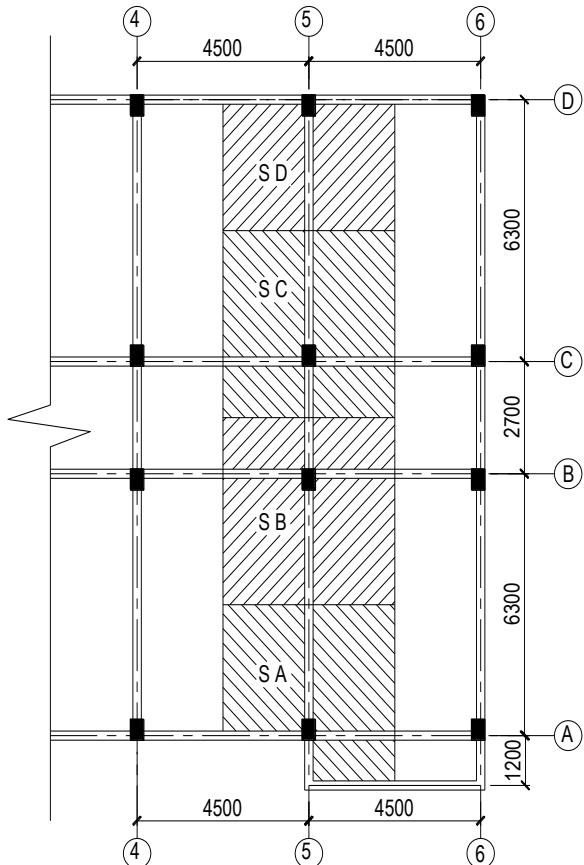

### 2.3.1. Cột trục A.

-Diện tích truyền tải:

$$S_A = 4,5 \cdot \frac{6,3}{2} + \frac{4,5}{2} \cdot 1,2 = 16,875 \text{ cm}^2$$

-Xác định lực dọc N:

+Lực do tải trọng phân bố đều trên bản sàn:

$$N_1 = q_s \cdot S_A = 662,6 \cdot 16,875 = 11181,375 \text{ daN.}$$

+Lực do t-òng ngắn 110 :

$$N_2 = g_t \cdot h_t \cdot l_t = 296,6 \cdot 3,0 \cdot 5,3 \cdot 3,6 = 3356,64 \text{ daN.}$$

+Lực do t-òng ngắn 220 :

$$N_3 = g_t \cdot h_t \cdot l_t = 514 \cdot (4,5+1,2) \cdot 3,6 = 10547,28 \text{ daN.}$$

+Lực do t-òng chắn mái 220 :

$$N_4 = g_t \cdot h_t \cdot l_t = 514 \cdot (4,5+1,2) \cdot 1,2 = 3515,76 \text{ daN.}$$

+Lực do tải trọng phân bố đều trên bản sàn mái:

$$N_5 = q_m \cdot S_A = 694,5 \cdot 16,875 = 11719,68 \text{ daN.}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Nhà 9 tầng (8 sàn+1 mái) :

$$N = 8.(N_1 + N_2 + N_3) + 1.(N_4 + N_5)$$

$$N = 8(11181,375 + 3356,64 + 10547,28) + 1.(3515,76 + 11719,68) \\ = 161826,86 \text{ daN}$$

$$A = 1,1 \cdot \frac{161826,86}{85} = 2094,23 \text{ cm}^2$$

Chọn bxh = 35x60 = 2100 cm<sup>2</sup>

-Dự kiến giảm tiết diện cột 2 lần,lần 1tầng 5, lần 2 ở tầng 8.

+Tiết diện cột trục A từ tầng 1 đến tầng 4 là: bxh = 350x600 mm.

+Tiết diện cột trục A từ tầng 5 đến tầng 7:

$$N = 4.(N_1 + N_2 + N_3) + 1.(N_4 + N_5) \\ = 4.(11181,375 + 3356,64 + 10547,28) + 1.(3515,76 + 11719,68) \\ = 78841,4 \text{ daN}$$

$$A = 1,1 \cdot \frac{78841,4}{85} = 1020,3 \text{ cm}^2$$

Chọn bxh = 22x50 = 1100 cm<sup>2</sup>.

+Tiết diện cột trục A từ tầng 8 đến tầng 9

$$N = 1.(N_1 + N_2 + N_3) + 1.(N_4 + N_5) \\ = 1.(11181,375 + 3356,64 + 10547,28) + 1.(3515,76 + 11719,68) \\ = 40320,73 \text{ daN}$$

$$A = 1,1 \cdot \frac{40320,73}{85} = 521,8 \text{ cm}^2$$

Chọn bxh = 22x30 = 660 cm<sup>2</sup>

## 2.3.2. Cột trục B

-Diện tích truyền tải:

$$S_B = (\frac{6,3}{2} + \frac{2,7}{2}) \cdot 4,5 = 20,25 \text{ cm}^2$$

-Xác định lực dọc N:

+Lực do tải trọng phân bố đều trên bản sàn:

$$N_1 = q_s \cdot S_B = 662,6 \cdot 20,25 = 13417,65 \text{ daN.}$$

+Lực do t-ờng ngắn 110 :

$$N_2 = g_t \cdot h_t \cdot l_t = 296 \cdot (6,3 \cdot 0,5 + 4,5) \cdot 3,6 = 8152 \text{ daN.}$$

+Lực do tải trọng phân bố đều trên bản sàn mái:

$$N_3 = q_m \cdot S_B = 694,5 \cdot 20,25 = 23908,16 \text{ daN.}$$

Nhà 9 tầng (8 sàn+1 mái) :

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$N = 8.(N_1 + N_2) + N_3$$

$$\begin{aligned} N &= 8(13417,65 + 8152) + 23908,16 \\ &= 173485,4 \text{ daN} \end{aligned}$$

$$A = 1,1 \cdot \frac{173485,4}{85} = 2042,5 \text{ cm}^2$$

Chọn bxh = 35x55 = 1925 cm<sup>2</sup>

-Dự kiến giảm tiết diện cột 2 lần,lần 1tầng 5, lần 2 ở tầng 8.

+Tiết diện cột trục B từ tầng 1 đến tầng 4 là: bxh = 350x550 mm.

+Tiết diện cột trục B từ tầng 5 đến tầng 7:

$$\begin{aligned} N &= 4.(N_1 + N_2) + N_3 \\ &= 4.(13417,65 + 8152) + 23908,16 \\ &= 77659,76 \text{ daN} \end{aligned}$$

$$A = 1,1 \cdot \frac{77659,76}{85} = 1005 \text{ cm}^2$$

Chọn bxh = 22x45 = 990 cm<sup>2</sup>.

+Tiết diện cột trục B từ tầng 8 đến tầng 9

$$\begin{aligned} N &= 1.(N_1 + N_2) + N_3 \\ &= (13417,65 + 8152) + 23908,16 \\ &= 48477,8 \text{ daN} \end{aligned}$$

$$A = 1,1 \cdot \frac{48477,8}{85} = 570,32 \text{ cm}^2$$

Chọn bxh = 22x30 = 660 cm<sup>2</sup>

2.3.3.Cột trục C.

(T-ống tự cột trục B)

2.3.4.Cột trục D.

-Diện tích truyền tải:

$$S_D = 4,5 \cdot \frac{6,3}{2} = 14,175 \text{ cm}^2$$

-Xác định lực dọc N:

+Lực do tải trọng phân bố đều trên bản sàn:

$$N_1 = q_s \cdot S_D = 662,6 \cdot 14,175 = 9392,35 \text{ daN}.$$

+Lực do t-òng ngắn 110 :

$$N_2 = g_t \cdot h_t \cdot l_t = 296,6 \cdot 3,0 \cdot 5,3,6 = 3356,64 \text{ daN}.$$

+Lực do t-òng ngắn 220 :

$$N_3 = g_t \cdot h_t \cdot l_t = 514,4 \cdot 5,3,6 = 8326,8 \text{ daN}.$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+Lực do t-ờng chấn mái 220 :

$$N_4 = g_t \cdot h_t \cdot l_t = 514,4 \cdot 5,1,2 = 2775,6 \text{ daN}.$$

+Lực do tải trọng phân bố đều trên bản sàn mái:

$$N_5 = q_m \cdot S_D = 694,5 \cdot 14,175 = 9844,538 \text{ daN}.$$

Nhà 9 tầng (8 sàn+1 mái) :

$$N = 8.(N_1 + N_2 + N_3) + 1.(N_4 + N_5).$$

$$N = 8(9392,35 + 3356,64 + 8326,8) + 1.(2775,6 + 9844,538)$$

$$= 158750,45 \text{ daN}$$

$$A = 1,1 \cdot \frac{158750,45}{85} = 1867,6 \text{ cm}^2$$

Chọn bxh = 35x50 = 1750 cm<sup>2</sup>

-Dự kiến giảm tiết diện cột 2 lần,lần 1tầng 5, lần 2 ở tầng 8.

+Tiết diện cột trục A từ tầng 1 đến tầng 4 là: bxh = 350x500 mm.

+Tiết diện cột trục A từ tầng 5 đến tầng 7:

$$N = 4.(N_1 + N_2 + N_3) + 1.(N_4 + N_5)$$

$$= 4.(9392,35 + 3356,64 + 8326,8) + 1.(2775,6 + 9844,538)$$

$$= 96923,3 \text{ daN}$$

$$A = 1,1 \cdot \frac{96923,3}{85} = 1140,27 \text{ cm}^2$$

Chọn bxh = 22x45 = 990 cm<sup>2</sup>.

+Tiết diện cột trục B từ tầng 8 đến tầng 9

$$N = 1.(N_1 + N_2 + N_3) + 1.(N_4 + N_5)$$

$$= (9392,35 + 3356,64 + 8326,8) + 1.(2775,6 + 9844,538)$$

$$= 33695,93 \text{ daN}$$

$$A = 1,1 \cdot \frac{33695,93}{85} = 436,068 \text{ cm}^2$$

Chọn bxh = 22x30 = 660 cm<sup>2</sup>

Tiết diện cột phải đảm bảo điều kiện ổn định:

$$\lambda_{cột} \leq [\lambda_{cột}]$$

- $[\lambda_{cột}]$ : Độ mảnh giới hạn của cột nhà  $[\lambda_{cột}] = 31$ .

Chọn chiều sâu chôn móng từ mặt đất tự nhiên cốt -450 trổ xuống:

$$H_m = 500 \text{ mm} = 0,5 \text{ m.}$$

Chiều cao cột tầng 1:

$$H_{t1} = H_t + z + H_m + h_d/2 = 3,6 + 0,45 + 0,5 - 0,3/2 = 4,4 \text{ m}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

Sơ đồ tính cột theo TCVN 5574-91 – Cột trong nhà khung BTCT sàn đổ tại chỗ là:

$$l_0 = 0,7 \times H = 0,7 \times 3,6 = 2,52 \text{ m}$$

$$\lambda_{\text{cột}} = \frac{l_0}{b} = \frac{2,52}{0,35} = 7,2 < [\lambda_{\text{cột}}] = 31$$

Vậy cột đảm bảo điều kiện ổn định.

## II. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐƠN VỊ.

### 1.Xác định tĩnh tải đơn vị .

- Tĩnh tải sàn văn phòng:  $g_s = 422,6 \text{ daN/m}^2$
- Tĩnh tải sàn hành lang :  $g_{hl} = 367,6 \text{ daN/m}^2$
- Tĩnh tải sàn mái:  $g_m = 472 \text{ daN/m}^2$
- Tĩnh tải do t-ờng xây 110:  $g_{t1} = 296 \text{ daN/m}^2$
- Tĩnh tải do t-ờng xây 220:  $g_{t2} = 514 \text{ daN/m}^2$

### 2.Xác định hoạt tải đơn vị.

- Hoạt tải sàn văn phòng:  $p_s = 240 \text{ daN/m}^2$
- Hoạt tải sàn hành lang:  $p_{hl} = 360 \text{ daN/m}^2$
- Hoạt tải sàn phòng họp:  $p_h = 480 \text{ daN/m}^2$
- Hoạt tải sàn mái:  $p_m = 240 \text{ daN/m}^2$
- Hoạt tải logia ban công:  $p_s = 240 \text{ daN/m}^2$

### 3.Xác định hệ số quy đổi tải trọng.

-Với ô sàn kích th- ớc  $2,7 \times 4,5 \text{ m}$ :

+Tải trọng truyền theo ph- ơng cạnh ngắn dạng tam giác có hệ số quy đổi sang dạng hình chữ nhật là  $k = 0,625$ .

+Tải trọng truyền theo ph- ơng cạnh dài dạng hình thang có hệ số quy đổi sang dạng hình chữ nhật là  $k = 0,839$  ( $\frac{l_2}{l_1} = \frac{4,5}{2,7} = 1,67$ , tra bảng 4-4.Sổ tay

thực hành kết cấu công trình)

-Với ô sàn kích th- ớc  $4,5 \times 6,3 \text{ m}$ :

+Tải trọng truyền theo ph- ơng cạnh ngắn dạng tam giác có hệ số quy đổi sang dạng hình chữ nhật là  $k = 0,625$ .

+Tải trọng truyền theo ph- ơng cạnh dài dạng hình thang có hệ số quy đổi sang dạng hình chữ nhật là  $k = 0,791$ . ( $\frac{l_2}{l_1} = \frac{6,3}{4,5} = 1,4$ , tra bảng 4-4.Sổ tay thực

hành kết cấu công trình)

## **TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

---

-Với sàn ô vắng kích th- ớc 1,2x4,5 m có :  $\frac{l_2}{l_1} = \frac{4,5}{1,2} = 3,75 > 2$  .Ô sàn làm việc một ph- ơng, tải trọng truyền theo ph- ơng cạnh ngắn.

CH- ƠNG 3  
THIẾT KẾ SÀN

I. KHÁI QUÁT CHUNG.

**1. Sơ đồ tính:** Các ô bản liên kết với dầm biên thì quan niệm tại đó sàn liên kết khớp với dầm, liên kết giữa các ô bản với dầm chính, phụ ở giữa thì quan niệm dầm liên kết ngầm với dầm.

**2. Phân loại các ô sàn:**

- Dựa vào kích thước các cạnh của bản sàn trên mặt bằng kết cấu ta phân các ô sàn ra làm 2 loại:

+ Các ô sàn có tỷ số các cạnh  $\frac{l_2}{l_1} \leq 2$  Ô sàn làm việc theo 2 phong

(Thuộc loại bản kề 4 cạnh): Gồm có:  $\hat{O}_1, \hat{O}_2, \hat{O}_4, \hat{O}_5, \hat{O}_7, \hat{O}_8, \hat{O}_9$ .

+ Các ô sàn có tỷ số các cạnh  $\frac{l_2}{l_1} > 2$  Ô sàn làm việc theo một phong

(Thuộc loại bản loại dầm) : Gồm có:  $\hat{O}_3, \hat{O}_6, \hat{O}_{10}$ .

II. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN.

**1. Sơ đồ truyền tải thẳng đứng.**

- Tải trọng thẳng đứng tác dụng lên sàn gồm có tĩnh tải và hoạt tải.

-Tải trọng truyền từ sàn vào dầm, từ dầm truyền vào cột.

-Tải trọng truyền từ sàn vào khung đ-ợc phân phối theo diện truyền tải.

**2. Nguyên tắc truyền tải của bản:**

-Khi  $\frac{l_2}{l_1} \leq 2$  bản làm việc 2 phong:


+ Tải trọng truyền từ sàn vào dầm theo phong cạnh ngắn có dạng tam giác.

+ Tải trọng truyền từ sàn vào dầm theo phong cạnh dài có dạng hình thang

- Khi  $\frac{l_2}{l_1} > 2$  bản làm việc 1 phong: bỏ qua sự uốn theo phong cạnh dài, tính toán nh- bản loại dầm theo phong cạnh ngắn.

-Các hệ số quy đổi từ tải trọng dạng tam giác và dạng hình thang về tải trọng dạng hình chữ nhật đ-ợc xác định trong ch- ơng 2-II ở trên.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

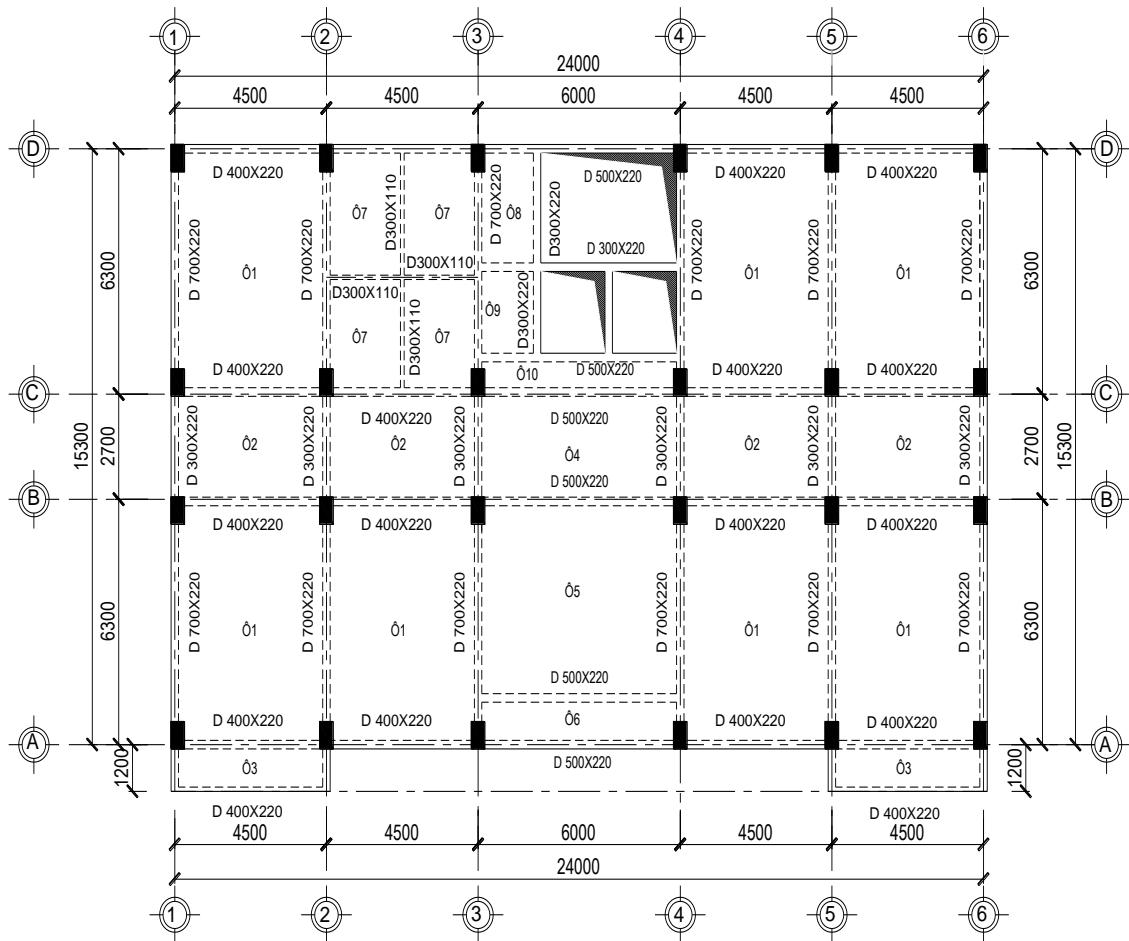

MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH

### 3. Tải trọng tác dụng lên sàn.

Tải trọng tác dụng lên sàn đã đ- ợc xác định trong phần: Xác định kích th- ớc sơ bộ cấu kiện ở trên.Bảng tổng hợp kết quả đ- ợc ghi trong bảng sau

Ô sàn	Kích th- ớc ( $l_1 \times l_2$ )	Tính tải daN/ $m^2$	Hoạ t tải daN/ $m^2$	Tải tính toán daN/ $m^2$
Ô1	4,5x6,3	422,6	240	662,6
Ô2	2,7x4,5	367,6	360	727,6
Ô3		422,6	240	662,6

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

---

	1,2x4,5			
Ô4	2,7x6	412,7	360	727,6
Ô5	5,1x6	422,6	360	662,6
Ô6	1,2x6	422,6	240	662,6
Ô7	3x4,5	412,7	200	612,7
Ô8	1,53x2,9	422,6	240	662,6
Ô9	1,53x2,3	422,6	240	662,6
Ô 10	0,88x6	422,6	360	662,6

### III. TÍNH TOÁN NỘI LỰC CỦA CÁC Ô SÀN.

#### 1. Xác định nội lực cho sàn.

-Để tính toán ta xét 1 ô bản bất kì trích ra từ các ô bản liên tục, gọi các cạnh bản là  $A_1, B_1, A_2, B_2$

-Gọi mômen âm tác dụng phân bố trên các cạnh đó là:  $M_I, M_{II}$

-Vùng giữa của ô bản có mô men d- ơng theo 2 ph- ơng là  $M_1, M_2$

-Các mô men nói trên đều đ- ợc tính cho mỗi đơn vị bê tông bản, lấy  $b = 1m$

-Tính toán bản theo sơ đồ khớp dẻo (trừ sàn vê sinh tính theo sơ đồ đàn hồi).

-Mô men d- ơng lớn nhất ở khoảng giữa ô bản, càng gần gối tựa mômen d- ơng càng giảm theo cả 2 ph- ơng. Nh- ng để đỡ phức tạp trong thi công ta bố trí thép đều theo cả 2 ph- ơng.

-Khi cốt thép trong mỗi ph- ơng đ- ợc bố trí đều nhau, dùng ph- ơng trình cân bằng mômen. Trong mỗi ph- ơng trình có sáu thành phần mômen.

$$\frac{q \times l_{01}^2 (l_{02} - l_{01})}{12} = (M_1 + M_I) l_{02} + (M_2 + M_{II}) l_{01}$$

+ Lấy  $M_1$  làm ẩn số chính và qui định tỉ số:  $\frac{M_2}{M_1}; \frac{M_I}{M_1}; \frac{M_{II}}{M_2}$  sẽ đ- a

ph- ơng trình về còn 1 ẩn số  $M_1$ , sau đó dùng các tỉ số đã qui định để tính lại các mômen khác.

#### 2. Tính sàn O1(ô sàn điển hình).

-Kích th- ớc ô sàn: 4,5x6,3 m

-Kích th- ớc tính toán:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

---


$$+l_{01} = l_1 - b = 4,5 - 0,22 = 4,28 \text{ m}$$

$$+l_{02} = l_2 - b = 6,3 - 0,22 = 6,08 \text{ m}$$

$$-\text{Tỉ số } \frac{l_{02}}{l_{01}} = \frac{6,08}{4,28} = 1,42 < 2 \rightarrow \text{ô bản làm việc 2 ph- ơng.}$$

-Bốn cạnh ô bản liên kết ngầm → tính theo bản kê 4 cạnh.

-Sơ đồ tính:

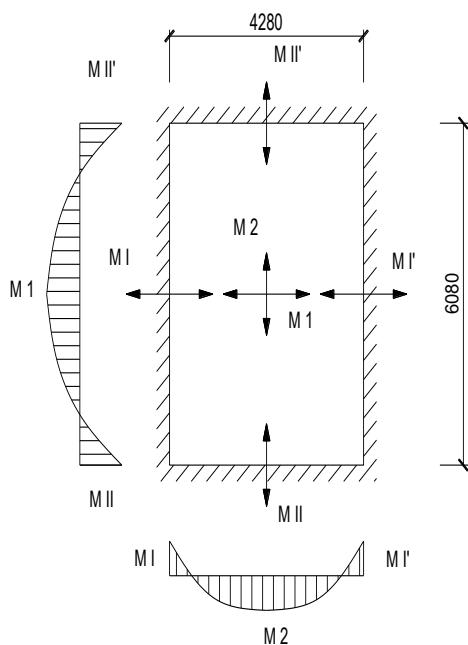

$$\frac{q \times l_{01}^2 (l_{02} - l_{01})}{12} = M_1 + M_I + M_{I'} + M_2 + M_{II} + M_{II'} \quad (1)$$

$$\frac{M_2}{M_1} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^2 = \left(\frac{4,28}{6,08}\right)^2 = 0,495 \rightarrow M_2 = 0,495 \cdot M_1$$

$$\frac{M_I}{M_1} = 1,5 \rightarrow M_I = M_{I'} = 1,5 \cdot M_1 ;$$

$$\frac{M_{II}}{M_2} = 1,5 \rightarrow M_{II} = M_{II'} = 1,5 \cdot M_1$$

Thay vào ph- ơng trình trên ta đ- ợc:

$$\frac{6,626 \cdot 4,28^2 \cdot (3,608 - 4,28)}{12} = (2M_1 + 3M_1) \cdot 6,08 + (5 \cdot 0,495 \cdot M_1) \cdot 4,28$$

$$40,99 \cdot M_1 = 141,2$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$M_1 = 3,44 \text{ KN.m}$$

$$M_2 = 1,7 \text{ KN.m}$$

$$M_I = M_{I'} = 5,16 \text{ KN.m}$$

$$M_{II} = M_{II'} = 2,55 \text{ KN.m}$$

-Tính toán cốt thép: (Chọn  $a_0=25 \text{ mm} \rightarrow h_0=h-a_0=100-25=85 \text{ mm}$ ).

+Cốt thép cho 1m dải bänder theo phong cách ngắn ở giữa nhịp.

$$\alpha_m = \frac{M_1}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{3,44}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0,085^2} = 0,056$$

$$\alpha_m < \alpha_{pl} = 0,255$$

Thoả mãn điều kiện hình thành khớp dẻo.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,97$$

$$A_1 = \frac{M_1}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{3,44}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,97 \cdot 0,085}$$

$$A_1 = 1,85 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$= 185 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8 \text{ s200}$  có  $A=251,5 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{2,51}{100 \cdot 8,5} = 0,29\% > \mu_{min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dải bänder có 6 thanh  $\phi 8$ .

+Cốt thép cho 1m dải bänder theo phong cách dài ở giữa nhịp.

$$(h_0' = h_0 - 0,5\phi_1 = 85 - 4 = 81 \text{ mm})$$

$$\alpha_m = \frac{M_2}{R_b \cdot b \cdot h_0'^2} = \frac{1,7}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0,081^2} = 0,0027$$

$$\alpha_m < \alpha_{pl} = 0,255$$

Thoả mãn điều kiện hình thành khớp dẻo.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,998$$

$$A_1 = \frac{M_1}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0'} = \frac{1,7}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,998 \cdot 0,081}$$

$$A_1 = 0,89 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$= 89 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8$  s200 có  $A=251,5 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{2,51}{100.8,1} = 0,3\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 6 thanh  $\phi 8$ .

+Cốt thép cho 1m dài bản theo ph- ơng cạnh ngắn ở gối.

$$\alpha_m = \frac{M_I}{R_b \cdot bh_0^2} = \frac{5,16}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1,0,085^2} = 0,0084$$

$$\alpha_m < \alpha_{pl} = 0,255$$

Thoả mãn điều kiện hình thành khớp dẻo.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,995$$

$$A_l = \frac{M_I}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{5,16}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,995 \cdot 0,085}$$

$$A_l = 2,7 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$= 270 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8$  s150 có  $A=335,1 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{3,351}{100.8,5} = 0,39\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 8 thanh  $\phi 8$ .

+Cốt thép cho 1m dài bản theo ph- ơng cạnh dài ở gối.

$$(h_0' = h_0 - 0,5\phi_1 = 85 - 4 = 81 \text{ mm})$$

$$\alpha_m = \frac{M_{II}}{R_b \cdot bh_0^2} = \frac{3,551}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1,0,081^2} = 0,0041$$

$$\alpha_m < \alpha_{pl} = 0,255$$

Thoả mãn điều kiện hình thành khớp dẻo.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,998$$

$$A_l = \frac{M_{II}}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{2,55}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,998 \cdot 0,081}$$

$$A_l = 1,33 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$= 133 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8$  s150 có  $A=355,1 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{3,551}{100.8,1} = 0,39 \% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 8 thanh  $\phi 8$ .

### 3. Tính sàn O5 (ô sàn kích thước lớn nhất).

-Kích th- ớc ô sàn:  $5,1 \times 6,0 \text{ m}$

-Kích th- ớc tính toán:


$$+l_{01} = l_1 - b = 5,1 - 0,22 = 4,88 \text{ m}$$

$$+l_{02} = l_2 - b = 6,0 - 0,22 = 5,78 \text{ m}$$

$$-\text{Tỉ số } \frac{l_{02}}{l_{01}} = \frac{5,78}{4,88} = 1,18 < 2 \rightarrow \text{ô bản làm việc 2 ph- ơng.}$$

-Bốn cạnh ô bản liên kết ngầm  $\rightarrow$  tính theo bản kê 4 cạnh.

-Sơ đồ tính:

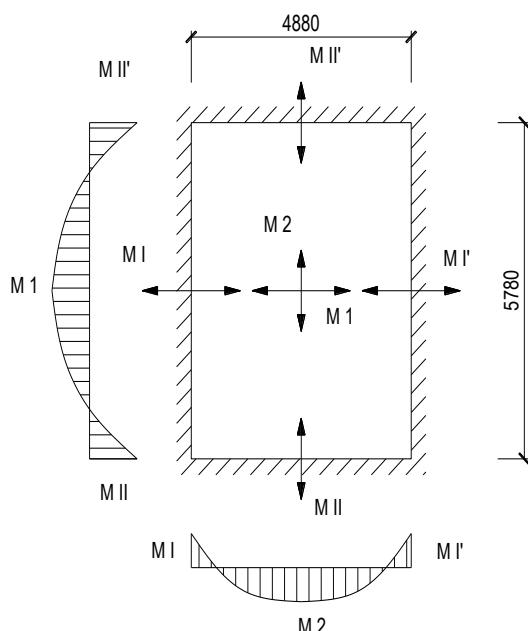

$$\frac{q \times l_{01}^2 (l_{02} - l_{01})}{12} = (M_1 + M_I + M_{I'}) l_{02} + (M_2 + M_{II} + M_{II'}) l_{01}$$

$$\frac{M_2}{M_1} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^2 = \left(\frac{4,88}{5,78}\right)^2 = 0,844 \rightarrow M_2 = 0,71 \cdot M_1$$

$$\frac{M_I}{M_1} = 1,5 \rightarrow M_I = M_{I'} = 1,5 \cdot M_1;$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\frac{M_{II}}{M_2} = 1,5 \rightarrow M_{II} = M_{II'} = 1,5.M_1$$

Thay vào ph- ơng trình trên ta đ- ợc:

$$\frac{6,626.4,88^2.(3,5,78 - 4,88)}{12} = (2M_1 + 3M_1).5,78 + (5,0,71.M_1).4,88$$

$$46,22.M_1 = 163,84$$

$$M_1 = 3,54 \text{ KN.m}$$

$$M_2 = 2,52 \text{ KN.m}$$

$$M_I = M_{I'} = 5,31 \text{ KN.m}$$

$$M_{II} = M_{II'} = 3,77 \text{ KN.m}$$

-Tính toán cốt thép: (Chọn  $a_0=25 \text{ mm} \rightarrow h_0= h - a_0 = 100 - 25 = 85 \text{ mm}$ ).

+Cốt thép cho 1m dải bản theo ph- ơng cạnh ngắn ở giữa nhịp.

$$\alpha_m = \frac{M_1}{R_b.bh_0^2} = \frac{3,54}{8,5.10^3.1.0,085^2} = 0,057$$

$$\alpha_m < \alpha_{pl} = 0,255$$

Thoả mãn điều kiện hình thành khớp dẻo.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,97$$

$$A_1 = \frac{M_1}{R_s.\zeta.h_0} = \frac{3,54}{225.10^3.0,97.0,085}$$

$$A_1 = 1,908.10^{-4} m^2 = 190,8 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8 \text{ s200}$  có  $A=251,5 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{2,51}{100.8,5} = 0,29\% > \mu_{min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dải bản có 6 thanh  $\phi 8$ .

+Cốt thép cho 1m dải bản theo ph- ơng cạnh dài ở giữa nhịp.

$$(h_0' = h_0 - 0,5\phi_1 = 85 - 4 = 81 \text{ mm})$$

$$\alpha_m = \frac{M_2}{R_b.bh_0^2} = \frac{2,52}{8,5.10^3.1.0,081^2} = 0,045$$

$$\alpha_m < \alpha_{pl} = 0,255$$

Thoả mãn điều kiện hình thành khớp dẻo.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,976$$

$$A_l = \frac{M_2}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{2,52}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,976 \cdot 0,081}$$

$$A_l = 1,4 \cdot 10^{-4} m^2 \quad 140 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8$  s200 có  $A=251,5 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{2,51}{100 \cdot 8,1} = 0,3\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 6 thanh  $\phi 8$ .

+ Cốt thép cho 1m dài bản theo phong cách ngắn ở gối.

$$\alpha_m = \frac{M_I}{R_b \cdot bh_0^2} = \frac{5,31}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1,0 \cdot 0,085^2} = 0,0865$$

$$\alpha_m < \alpha_{pl} = 0,255$$

Thoả mãn điều kiện hình thành khớp dẻo.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,954$$

$$A_l = \frac{M_I}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{5,31}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,954 \cdot 0,085}$$

$$A_l = 2,91 \cdot 10^{-4} m^2$$

$$= 291 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8$  s150 có  $A=335,1 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{3,351}{100 \cdot 8,5} = 0,39\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 8 thanh  $\phi 8$ .

+ Cốt thép cho 1m dài bản theo phong cách dài ở gối.

$$(h_0' = h_0 - 0,5\phi_1 = 85 - 4 = 81 \text{ mm})$$

$$\alpha_m = \frac{M_{II}}{R_b \cdot bh_0^2} = \frac{3,77}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1,0 \cdot 0,081^2} = 0,0676$$

$$\alpha_m < \alpha_{pl} = 0,255$$

Thoả mãn điều kiện hình thành khớp dẻo.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,964$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$A_l = \frac{M_{II}}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{3,77}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,964 \cdot 0,081}$$

$$A_l = 2,14 \cdot 10^{-4} m^2 = 214 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8$  s150 có  $A=335,1 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{3,351}{100 \cdot 8,5} = 0,39\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 8 thanh  $\phi 8$ .

## 4. Tính sàn O3 (ô vắng).

-Kích th- ớc ô sàn:  $1,2 \times 4,5 \text{ m}$

-Kích th- ớc tính toán:

$$+l_{01} = l_1 - b = 1,2 - 0,22 = 0,98 \text{ m}$$

$$+l_{02} = l_2 - b = 4,5 - 0,22 = 4,28 \text{ m}$$

$$-\text{Tỉ số } \frac{l_{02}}{l_{01}} = \frac{4,28}{0,98} = 4,36 > 2 \rightarrow \text{ô bản làm việc 1 ph- ơng.}$$

Cắt 1m dài bản theo ph- ơng cạnh ngắn.Coi bản nh- dầm có một đầu ngầm một đầu tự do.

-Mô men âm ở đầu ngầm :

$$M = \frac{q \cdot l^2}{2} = \frac{6,626 \cdot 0,98^2}{2} = 3,18 \text{ KN.m}$$

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{3,18}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0,085^2} = 0,0518$$

$$\alpha_m < \alpha_{pl} = 0,255$$

Thoả mãn điều kiện hình thành khớp dẻo.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,973$$

$$A_l = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{3,18}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,973 \cdot 0,085}$$

$$A_l = 1,708 \cdot 10^{-4} m^2 = 170,8 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8$  s150 có  $A=335,1 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{3,351}{100 \cdot 8,5} = 0,39\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 8 thanh  $\phi 8$ .

## 5. Tính sàn O7 (ô sàn vệ sinh).

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

-Để đơn giản trong tính toán và thiêng về an toàn, nội lực trong ô sàn vệ sinh đ- ợc tính theo sơ đồ đàn hồi và bỏ qua sự làm việc liên tục của các ô bản.

-Kích th- ớc ô sàn  $l_1 = 2,25 \text{ m}$ ;  $l_2 = 3 \text{ m}$ .

-Kích th- ớc tính toán:

$$+l_{01} = l_1 - b = 2,25 - 0,22 = 2,03 \text{ m}$$

$$+l_{02} = l_2 - b = 3,0 - 0,22 = 2,78 \text{ m}$$

-Xét tỷ số :  $\frac{l_{02}}{l_{01}} = \frac{2,78}{2,03} = 1,37 < 2 \rightarrow$  Bản làm việc theo 2 ph- ơng.

+ Theo ph- ơng cạnh ngắn:

$$\frac{h_d}{3} = \frac{300}{3} = 100\text{cm} = h_b = 100\text{cm} \rightarrow \text{Bản đ- ợc coi là ngầm vào dầm}$$

+ Theo ph- ơng cạnh dài:

$$\frac{h_d}{3} = \frac{700}{3} = 233,33\text{cm} > h_b = 100\text{cm} \rightarrow \text{Bản đ- ợc coi là ngầm vào dầm.}$$

Vậy ô bản  $\hat{O}_7$  đ- ợc coi là bản kê bốn cạnh, làm việc theo sơ đồ số 9

(Sách sổ tay thực hành kết cấu – PGS . PTS . Vũ Mạnh Hùng)

### 5.1.Tải trọng tính toán

- Mômen ở nhịp:

+Theo ph- ơng cách ngắn:  $M_1 = m_{11}P' + m_{91}P''$

+Theo ph- ơng cách dài:  $M_2 = m_{12}P' + m_{92}P''$

-Mômen âm:

+Theo ph- ơng cách ngắn:  $M_I = k_{91}P$

+Theo ph- ơng cách dài:  $M_{II} = k_{92}P$

( $m_{11}, m_{12}, m_{91}, m_{92}, k_{91}, k_{92}$  tra bảng 1-19.)

$$P = (P' + P'')$$

$$P' = (G + \frac{P}{2}).l_1.l_2 = (412,7 + \frac{200}{2}).2,03.2,78 = 2893,4 \text{ daN} = 28,93 \text{ KN}$$

$$P'' = \frac{P}{2}.l_1.l_2 = \frac{200}{2}.2,03.2,78 = 564,34 \text{ daN} = 5,64 \text{ KN}$$

$$P = 28,93 + 5,64 = 34,57 \text{ KN}$$

### 5.2. Xác định nội lực.

$$\text{Với : } \frac{l_2}{l_1} = \frac{2,78}{2,03} = 1,37, \text{ tra bảng 1 - 19}$$

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

(Sách sổ tay thực hành kết cấu – PGS. PTS . Vũ Mạnh Hùng) Ta có:  $m_{11} = 0,0464$ ;  $m_{12} = 0,0247$ ;

$$m_{91} = 0,0210; m_{92} = 0,0111;$$

$$k_{91} = 0,0424; k_{92} = 0,0251;$$

-Tính toán ta có:

$$M_1 = m_{11}P' + m_{91}P'' = 0,0464 \cdot 28,93 + 0,0210 \cdot 5,64 = 1,46 \text{ KN.m}$$

$$M_2 = m_{12}P' + m_{92}P'' = 0,0247 \cdot 28,93 + 0,0111 \cdot 5,64 = 0,46 \text{ KN.m}$$

$$M_I = 0,0424 \cdot 34,57 = 1,4657 \text{ KN.m}$$

$$M_{II} = 0,0251 \cdot 34,57 = 0,8677 \text{ KN.m}$$

-Tính toán cốt thép

+Cốt thép cho 1m dải bản theo ph- ơng cạnh ngắn ở giữa nhịp.

$$\alpha_m = \frac{M_1}{R_b b h_0^2} = \frac{1,46}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1,0085^2} = 0,023$$

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,988$$

$$A_1 = \frac{M_1}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{1,46}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,988 \cdot 0,085}$$

$$A_1 = 0,773 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 77,3 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8$  s200 có  $A=251,5 \text{ mm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{2,51}{100 \cdot 8,5} = 0,29\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dải bản có 6 thanh  $\phi 8$ .

+Cốt thép cho 1m dải bản theo ph- ơng cạnh dài ở giữa nhịp.

$$(h_0' = h_0 - 0,5\phi_1 = 85 - 4 = 81 \text{ mm})$$

$$\alpha_m = \frac{M_2}{R_b b h_0'^2} = \frac{0,46}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1,0081^2} = 0,00824$$

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,996$$

$$A_1 = \frac{M_2}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0'} = \frac{0,46}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,996 \cdot 0,081}$$

$$A_1 = 0,253 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$= 25,3 \text{ mm}^2$$

Chọn  $\phi 8$  s200 có  $A=251,5 \text{ mm}^2$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{2,51}{100.8,5} = 0,29\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 6 thanh φ8.

+Cốt thép cho 1m dài bản theo ph-ong cạnh ngắn ở gối.

$$\alpha_m = \frac{M_I}{R_b bh_0^2} = \frac{1,4657}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0,085^2} = 0,0238$$

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,988$$

$$A_l = \frac{M_I}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{1,4657}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,988 \cdot 0,085}$$

$$A_l = 0,775 \cdot 10^{-4} m^2 = 77,5 \text{ mm}^2$$

Chọn φ8 s200 có A=251,5 mm<sup>2</sup>

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{2,51}{100.8,5} = 0,29\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 6 thanh φ8.

+Cốt thép cho 1m dài bản theo ph-ong cạnh dài ở gối.

(h<sub>0'</sub> = h<sub>0</sub> - 0,5φ<sub>1</sub> = 85 - 4 = 81 mm)

$$\alpha_m = \frac{M_{II}}{R_b bh_0'^2} = \frac{0,8677}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0,081^2} = 0,01555$$

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,992$$

$$A_l = \frac{M_2}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0'} = \frac{0,8677}{225 \cdot 10^3 \cdot 0,992 \cdot 0,081}$$

$$A_l = 0,479 \cdot 10^{-4} m^2$$

$$= 47,9 \text{ mm}^2$$

Chọn φ8 200 có A=251,5 mm<sup>2</sup>

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{2,51}{100.8,5} = 0,29\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

Mỗi mét dài bản có 6 thanh φ8.

## 6. Bố trí thép .

Xem bản vẽ KC -04

**CH- ƠNG 4.**  
**TÍNH KHUNG TRỤC 5**

**I. SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 5.**

**1. Sơ đồ hình học và sơ đồ kết cấu.**

Từ sơ đồ hình học mô hình hoá các khung thành các thanh đứng (cột) và các thanh ngang (dầm) với trực của hệ kết cấu đ-ợc tính đến trọng tâm tiết diện các thanh.

**2. Nhịp tính toán của dầm.**

- Xác định nhịp tính toán của dầm AB.

$$L_{AB} = 6,3 + \frac{0,22}{2} + \frac{0,11}{2} - \frac{0,3}{2} - \frac{0,3}{2} = 6,165 \text{ m}$$

- Xác định nhịp tính toán của dầm BC.

$$L_{AB} = 2,7 - \frac{0,11}{2} - \frac{0,11}{2} + \frac{0,3}{2} + \frac{0,3}{2} = 2,89 \text{ m}$$

- Xác định chiều cao cột

+Chiều cao cột tầng 1:

Chọn chiều sâu chôn móng từ mặt đất tự nhiên cốt -450 trở xuống


$$h_m = 0,5 \text{ m.}$$

$$h_{t1} = 3,6 + 0,45 + 0,5 + 0,3/2 = 4,4 \text{ m.}$$

+Chiều cao cột các tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 là nhau và đều bằng 3,6 m.

+Sơ đồ kết cấu khung trục 5( hình vẽ trang bên).

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

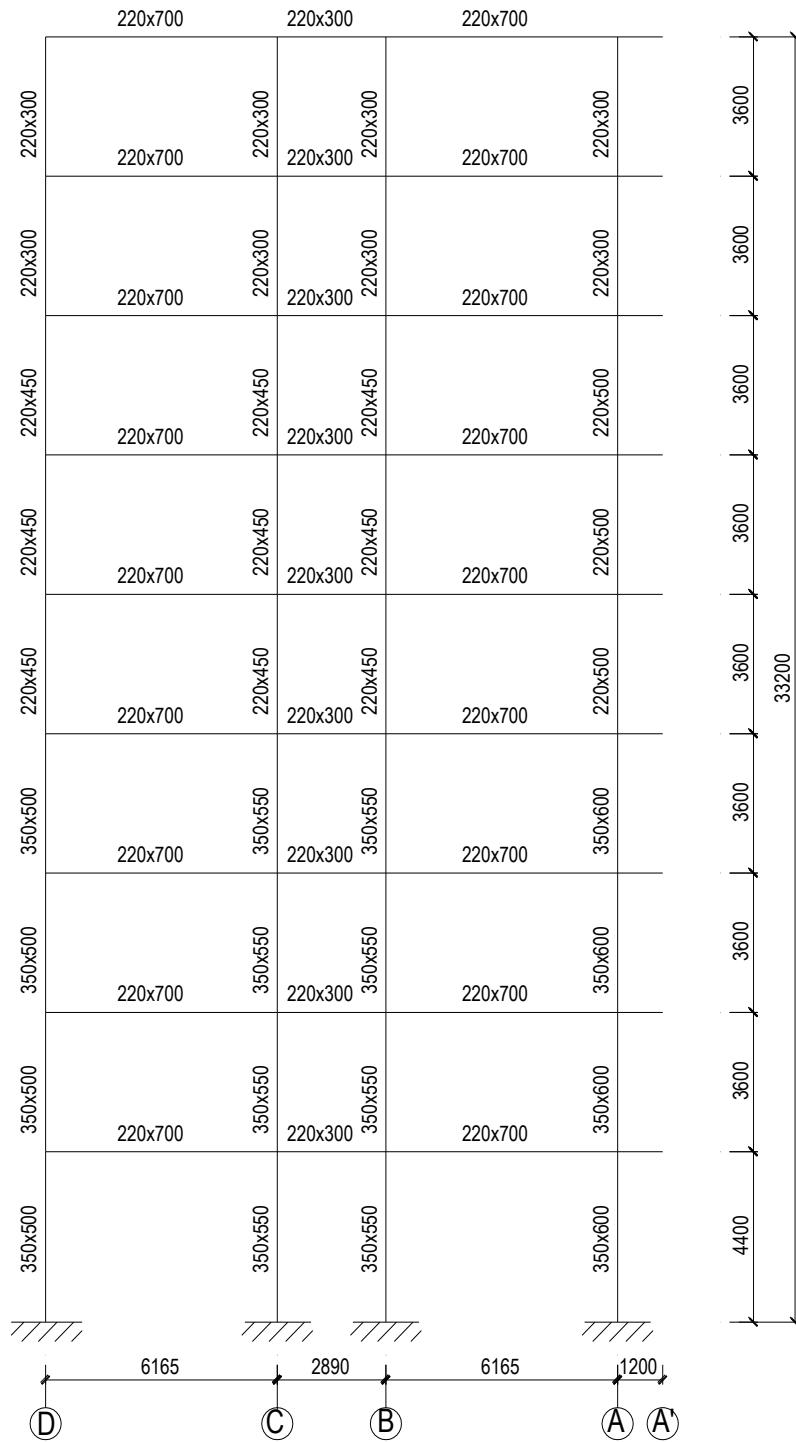

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

## II. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG VÀO KHUNG TRÚC 5.

Tải trọng bản thân các cấu kiện (dầm và cột) sẽ được phần mềm tính kết cấu SAP .2000 tự tính khi xác định nội lực của khung.

### 1. Tính tải

#### 1.1. Xác định tĩnh tải các tầng từ tầng 3 đến tầng 9.


- Với ô sàn 1 hệ số quy đổi tải trọng từ dạng hình thang sang dạng hình chữ nhật là:  $k_1 = 0,791$ .

- Với ô sàn 2 hệ số quy đổi tải trọng từ dạng hình thang sang dạng hình chữ nhật là:  $k_1 = 0,839$ .

- Tính hệ số giảm cửa: (cửa sổ 1,8 x 2,35 m)

$$\alpha_c = \frac{(4,5.3,6) - (1,8.2,35)}{4,5.3,6} = 0,74$$

- Sơ đồ truyền tải:

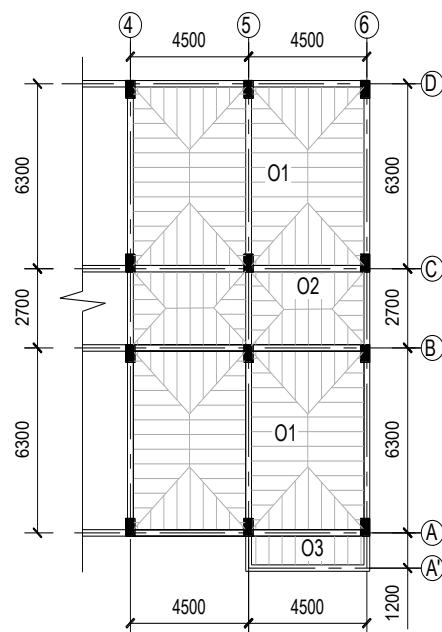

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

## 1.1.1. Tính tải phân bố.(daN/m)

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$g_1$	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Do t- ờng 110 xây trên đầm cao: <math>3,6-0,7=2,9</math> m <math>296,2,9</math></li> <li>-Do tải từ sàn truyền vào dạng hình thang: <math>442,6.(4,5-0,22).0,79</math></li> <li>-Tổng cộng:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>858,4</math></li> <li><math>1430,7</math></li> <li><math>2289,1</math></li> </ul>
$g_2$	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Do tải từ sàn truyền vào dạng hình tam giác: <math>367,96.(2,7-0,22).0,625</math></li> </ul>	$595,05$
$g_3$	$g_3 = g_1$	$2289,1$
$g_4$	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Do t- ờng 220 xây trên đầm cao: <math>3,6-0,7=2,9</math> m <math>514,2,9</math></li> </ul>	$1490,6$

## 1.1.2. Tính tải tập trung(daN).

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$G_A$	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Do trọng l- ợng bản thân đầm dọc: <math>0,22.0,4.2500.1,1.4,5</math></li> <li>-Do t- ờng 220 xây trên đầm dọc cao 3,2 m: <math>514,3,2,4,5,0,5</math></li> <li>-Do sàn truyền vào: <math>422,6.[\frac{(4,5 - 0,22)^2}{4} + \frac{(4,5 - 0,22)}{2} \cdot \frac{(1,2 - 0,22)}{2}]</math></li> <li>-Tổng cộng:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>1089</math></li> <li><math>3700,8</math></li> <li><math>2320,8</math></li> <li><math>7110,6</math></li> </ul>
$G_B$	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Do trọng l- ợng bản thân đầm dọc: <math>0,22.0,4.2500.1,1.4,5</math></li> <li>-Do t- ờng 110 xây trên đầm dọc cao 3,2 m:</li> </ul>	$1089$


# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

	296.3,2.4,5.0,74 -Do sàn hành lang truyền vào: $422,6.[(4,5 - 0,22) + (4,5 - 2,7)] \cdot \frac{(2,7 - 0,22)}{4}$ -Do sàn truyền vào: $422,6.[\frac{(4,5 - 0,22)^2}{4}]$ -Tổng cộng:	3154,17 1593 1935,33 7614,34
$G_C$	$G_C = G_B$	7614,34
$G_D$	-Do trọng l-ợng bản thân đầm dọc: $0,22.0,4.2500.1,1.4,5$ -Do t-ờng 220 xây trên đầm dọc cao 3,2 m: $514.3,2.4,5.0,74$ - Do sàn truyền vào: $422,6.[\frac{(4,5 - 0,22)^2}{4}]$ -Tổng cộng:	1089 5477,18 1935,33 8501,52
$G_A'$	-Do trọng l-ợng bản thân đầm dọc: $0,22.0,4.2500.1,1.4,5.0,5$ -Do t-ờng 220 xây trên đầm dọc cao 3,2 m: $514.3,2.4,5.0,5$ - Do sàn truyền vào: $422,6.[\frac{(4,5 - 0,22)}{2} \frac{(1,2 - 0,22)}{2}]$ -Tổng cộng:	544,5 3700,8 385,46 4630,76

## 1.2. Xác định tĩnh tải tầng 2.

Sơ đồ truyền tải

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

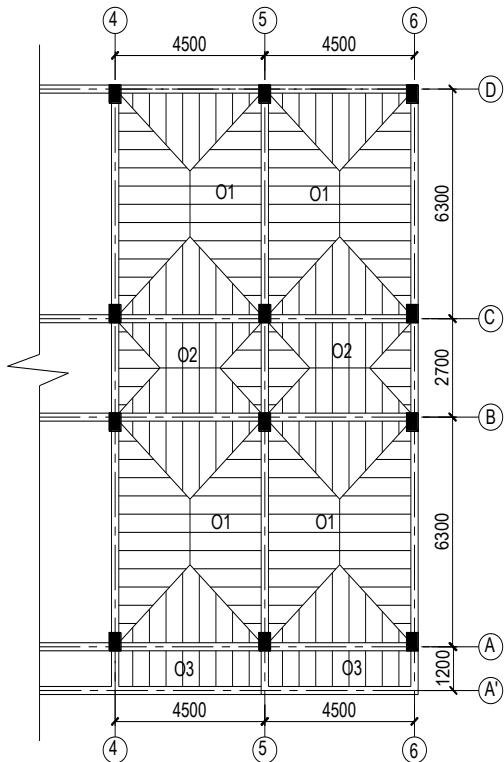

## 1.2.1. Tính tải phân bố.(daN/m)

(T- ơng tự các tầng 3 đến 9)

## 1.2.2. Tính tải tập trung(daN).


Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$G_A$	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Do trọng l- ợng bản thân dầm dọc: 0,22.0,4.2500.1,1.4,5</li> <li>-Do t- ờng 220 xây trên dầm dọc cao 3,2 m: 514.3,2.4,5.0,5</li> <li>-Do sàn truyền vào: <math>422,6 \cdot \left[ \frac{(4,5 - 0,22)^2}{4} + (4,5 - 0,22) \cdot \frac{(1,2 - 0,22)}{2} \right]</math></li> <li>-Tổng cộng:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1089</li> <li>3700,8</li> <li>2289,1</li> <li>1821,6</li> <li>8267</li> </ul>
$G_B$	-T- ơng tự các tầng 3 đến 9	7614,34
$G_C$	$G_C = G_B$	7614,34

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

$G_D$	-T- ơng tự các tầng 3 đến 9	8501,52
$G_{A'}$	-Do trọng l- ợng bản thân đầm dọc: 0,22.0,4.2500.1,1.4,5 -Do t- ờng 220 xây trên đầm dọc cao 3,2 m: 514.3,2.4,5.0,5 - Do sàn truyền vào: $422,6.[(4,5 - 0,22) \cdot \frac{(1,2 - 0,22)}{2}]$ -Tổng cộng:	1089 3700,8 770,93 5560,73

### 1.3. Xác định tĩnh tải tầng mái.

Sơ đồ truyền tải

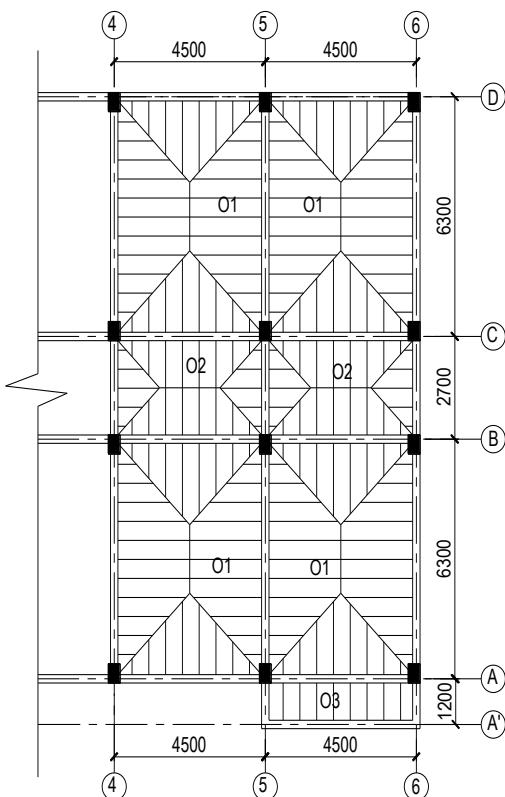

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

---

## 1.3.1. Tính tải phân bố.(daN/m)

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$g_1$	-Do sàn truyền vào dạng hình thang: $597.(4,5-0,22).0,791$	2021,13
$g_2$	-Do tải từ sàn truyền vào dạng hình tam giác: $597.(2,7-0,22).0,625$	731,16
$g_3$	$g_3 = g_1$	2021,13
$g_4$	-Do t-ờng mái 220 cao 1,2 m: $514.1,2$	616,8

## 1.3.2. Tính tải tập trung(daN).

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$G_A$	-Do trọng l-ợng bản thân dầm dọc: $0,22.0,4.2500.1,1.4,5$ -Do sàn truyền vào: $597.\left[\frac{(4,5-0,22)^2}{4} + \frac{(4,5-0,22)}{2}.\frac{(4,5+2,02).1,24}{2}\right]$ -Tổng cộng:	1089 3540 4629
$G_B$	Do sàn truyền vào: $597.\left[\frac{(4,5-0,22)^2}{4} + \frac{(4,5-0,22)}{2}.\frac{(1,2-0,22)}{2}\right]$ -Do trọng l-ợng bản thân dầm dọc: $0,22.0,4.2500.1,1.4,5$ -Tổng cộng:	5147,33 1089 6236,33
$G_C$	$G_C = G_B$	6236,33
$G_D$	-Do trọng l-ợng bản thân dầm dọc: $0,22.0,4.2500.1,1.4,5$ -Do sàn truyền vào:	1089


# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

	$597 \cdot \left[ \frac{(4,5 - 0,22)^2}{4} \right]$ -T- ờng chấn mái cao 1,2 m: 514.1,2.4,5 -Tổng cộng:	2734 2775,6 6598,6
G <sub>A'</sub>	-Do trọng l- ợng bản thân dầm dọc: 0,22.0,4.2500.1,1.4,5.0,5 -Do t- ờng mái 220 cao 1,2 m: 514.1,2.4,5.0,5 - Do sàn truyền vào: $597 \cdot \left[ \frac{(4,5 - 0,22)}{2} \cdot \frac{(1,2 - 0,22)}{2} \right]$ -Tổng cộng:	544,5 1387,8 805,95 2738,25

## 2. Hoạt tải 1.

### 2.1. Hoạt tải các tầng 2, 4, 6, 8.

Sơ đồ truyền tải

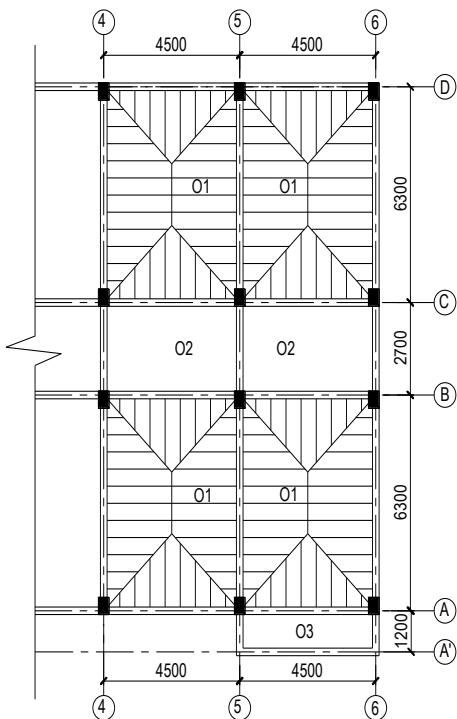

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

## 2.1.1. Hoạt tải phân bố.(daN/m)


Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$p_1$	-Do sàn truyền vào dạng hình thang: $240.(4,5-0,22).0,5.0,791$	406,25
$p_3$	$p_3 = p_1$ (Trừ tầng 2, $p_3 = 480.(4,5-0,22).0,5.0,791=812.49$ )	406,25

## 2.1.2. Hoạt tải tập trung(daN).

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$P_D$	-Do sàn O <sub>1</sub> truyền vào : $240 \cdot \frac{(4,5 - 0,22)^2}{4}$	406,25
$P_C$	$P_C = P_D$	
$P_B$	$P_B = P_C$	
$P_A$	$P_A = P_B$	406,25

## 2.2. Hoạt tải các tầng 3, 5, 7, 9.

Sơ đồ truyền tải :

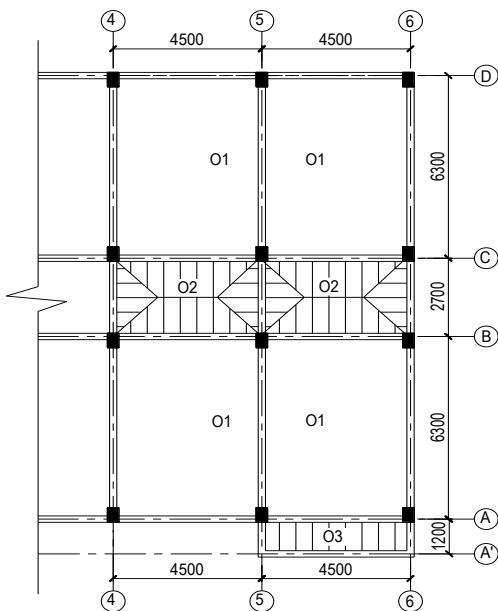

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

## 2.2.1. Hoạt tải phân bố.(daN/m)

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$p_2$	-Do sàn O <sub>2</sub> truyền vào dạng hình tam giác: $360 \cdot \frac{(2,7 - 0,22)}{2} \cdot 2,0,625$	558
$p_4$	Sàn O <sub>3</sub> làm việc một ph- ơng, $p_4 = 0$	0

## 2.2.2. Hoạt tải tập trung(daN).

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$P_C$	-Do sàn O <sub>2</sub> truyền vào : $360 \cdot \frac{(4,5 - 0,22) + 2,02}{2} \cdot 1,24$	1406,16
$P_B$	$P_B = P_C$	1406,16
$P_A$	-Do sàn O <sub>3</sub> truyền vào : $240 \cdot \frac{(4,5 - 0,22)}{2} \cdot \frac{(1,2 - 0,22)}{2} \cdot 1,24$	251,66
$P_{A'}$	$P_{A'} = P_A$	251,66

## 2.3. Hoạt tải tầng mái.

Sơ đồ truyền tải : giống nh- các tầng 2, 4, 6, 8, nh- ng khác v- giá trị.

### 2.3.1. Hoạt tải phân bố.(daN/m)

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$p_1$	-Do sàn O <sub>1</sub> truyền vào dạng hình thang: $97,5 \cdot \frac{(4,5 - 0,22)}{2} \cdot 2,0,791$	150,43
$p_3$	$p_3 = p_1$	150,43

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

## 2.3.2. Hoạt tải tập trung(daN).

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
P <sub>D</sub>	-Do sàn O <sub>1</sub> truyền vào : $97,5 \cdot \left[ \frac{(4,5 - 0,22)^2}{4} \right]$	446,511
P <sub>C</sub>	P <sub>B</sub> = P <sub>C</sub>	446,511
P <sub>B</sub>	-Do sàn O <sub>3</sub> truyền vào : $240 \cdot \left[ \frac{(4,5 - 0,22)}{2} \cdot \frac{(1,2 - 0,22)}{2} \right] \cdot 1,24$	446,511
P <sub>A</sub>	P <sub>A</sub> = P <sub>B</sub>	446,511

## 3. Hoạt tải 2.

Hoạt tải 2 đ- ợc chất lệc tầng lệc nhịp với hoạt tải 1.Cũng có nghĩa là :

- Sơ đồ truyền tải của hoạt tải 2 của các tầng 2, 4, 6, 8, giống sơ đồ truyền tải của hoạt tải 1 của các tầng 3, 5, 7, 9. Do hoạt tải đơn vị giống nhau lên cũng giống cả về giá trị.
- Sơ đồ truyền tải của hoạt tải 2 của các tầng 3, 5, 7, 9, giống sơ đồ truyền tải của hoạt tải 1 của các tầng 2, 4, 6, 8. Do hoạt tải đơn vị giống nhau lên cũng giống cả về giá trị.
- Sơ đồ truyền tải của hoạt tải 2 của tầng mái giống sơ đồ truyền tải của hoạt tải 2 của các tầng 2, 4, 6, 8, chỉ khác về giá trị :

*Hoạt tải phân bố(daN/m).*

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
p <sub>2</sub>	-Do sàn O <sub>2</sub> truyền vào dạng hình tam giác: $97,5 \cdot \frac{(2,7 - 0,22)}{2} \cdot 2,0,625$	151,125
p <sub>4</sub>	Sàn O <sub>3</sub> làm việc một ph- ơng.	0

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG


---

*Hoạt tải tập trung(daN).*

Tên tải	Loại tải trọng và cách tính	Kết quả
$P_C$	-Do sàn O <sub>2</sub> truyền vào : $97,5 \cdot \left[ \frac{(4,5 - 0,22) + 2,02}{2} \right] \cdot 1,24$	380,835
$P_B$	$P_B = P_C$	380,835
$P_A$	-Do sàn O <sub>3</sub> truyền vào : $97,5 \cdot \left[ \frac{(4,5 - 0,22)}{2} \cdot \frac{(1,2 - 0,22)}{2} \right]$	102,236
$P_{A'}$	$P_{A'} = P_A$	102,236


# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

## SƠ ĐỒ CHẤT TẢI : TÍNH TẢI KHUNG TRỤC 5

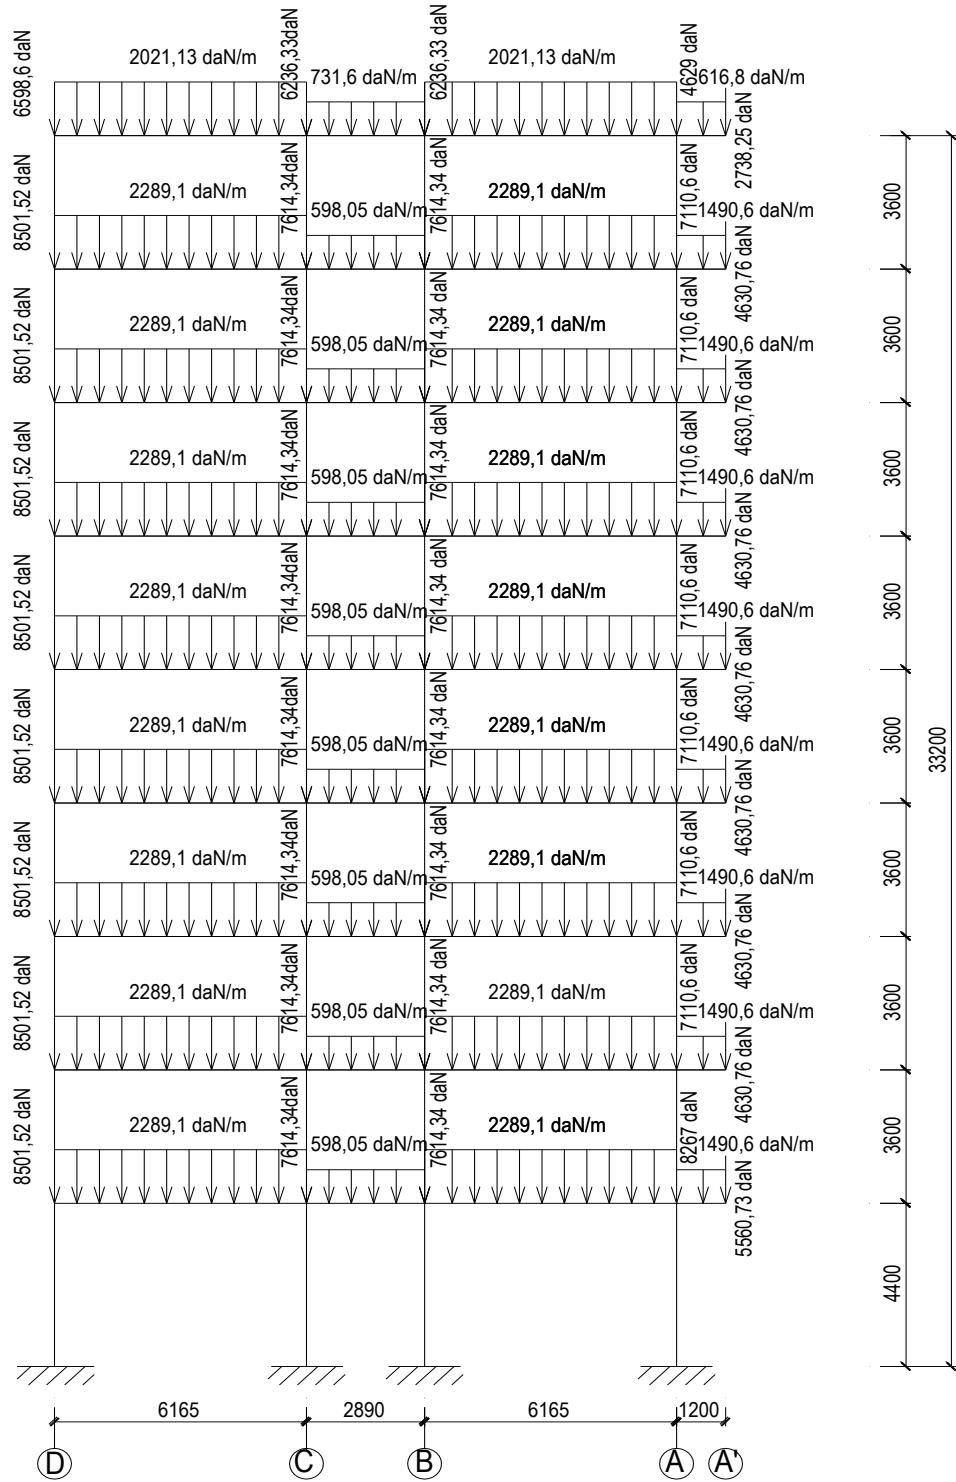


# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

## SƠ ĐỒ CHẤT TẢI : HOẠT TẢI 1 KHUNG TRỤC 5

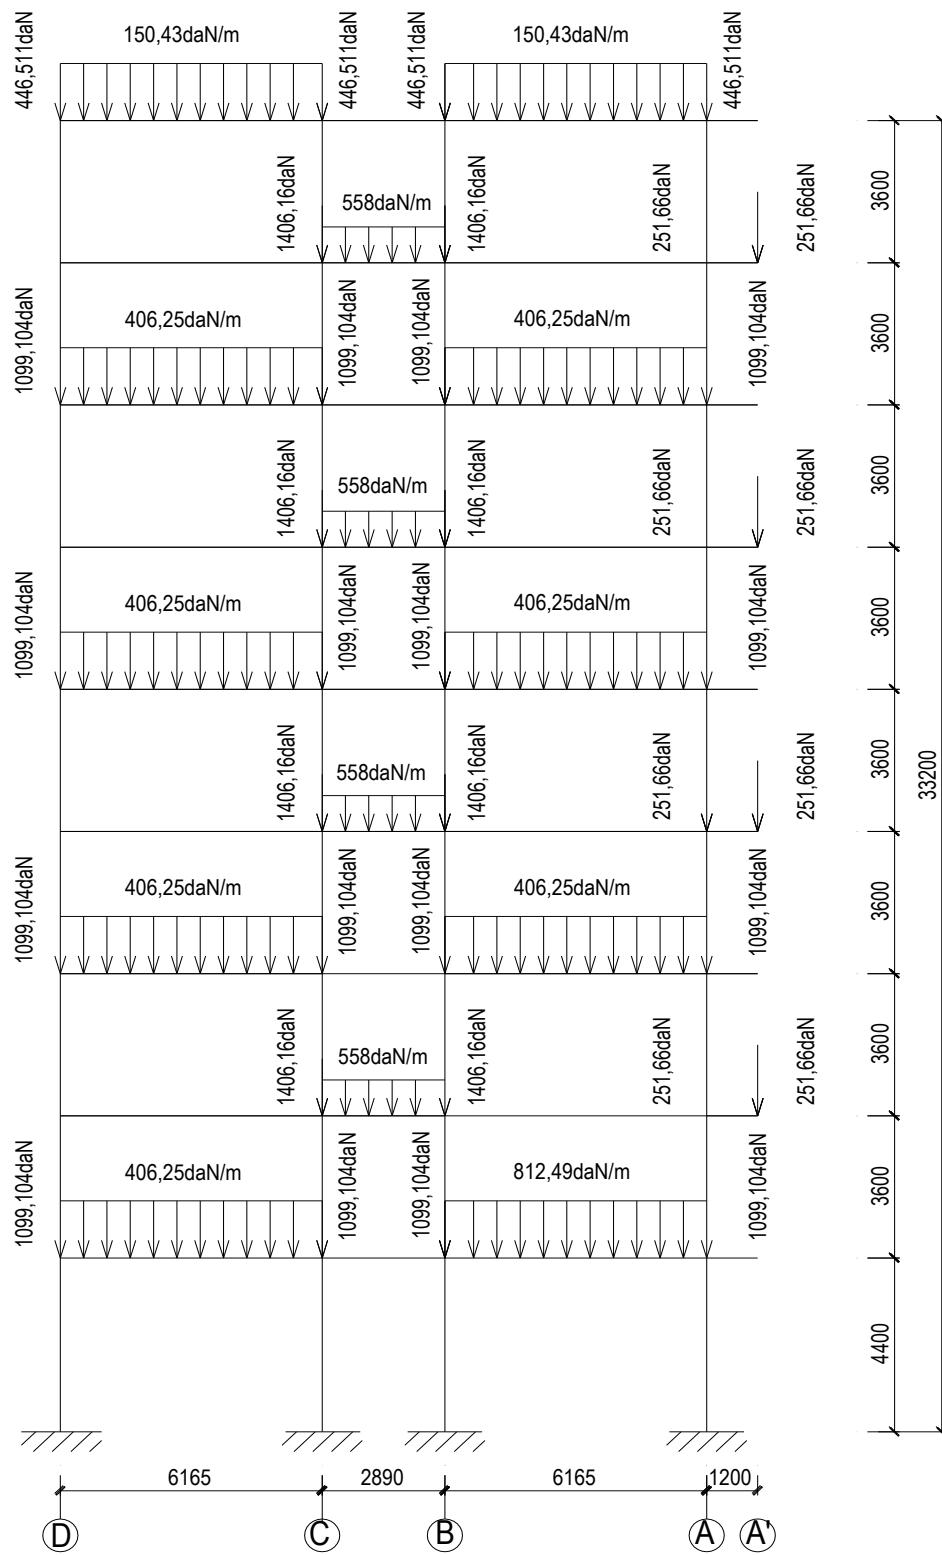

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

## SƠ ĐỒ CHẤT TẢI : HOẠT TẢI 2 KHUNG TRỤC 5

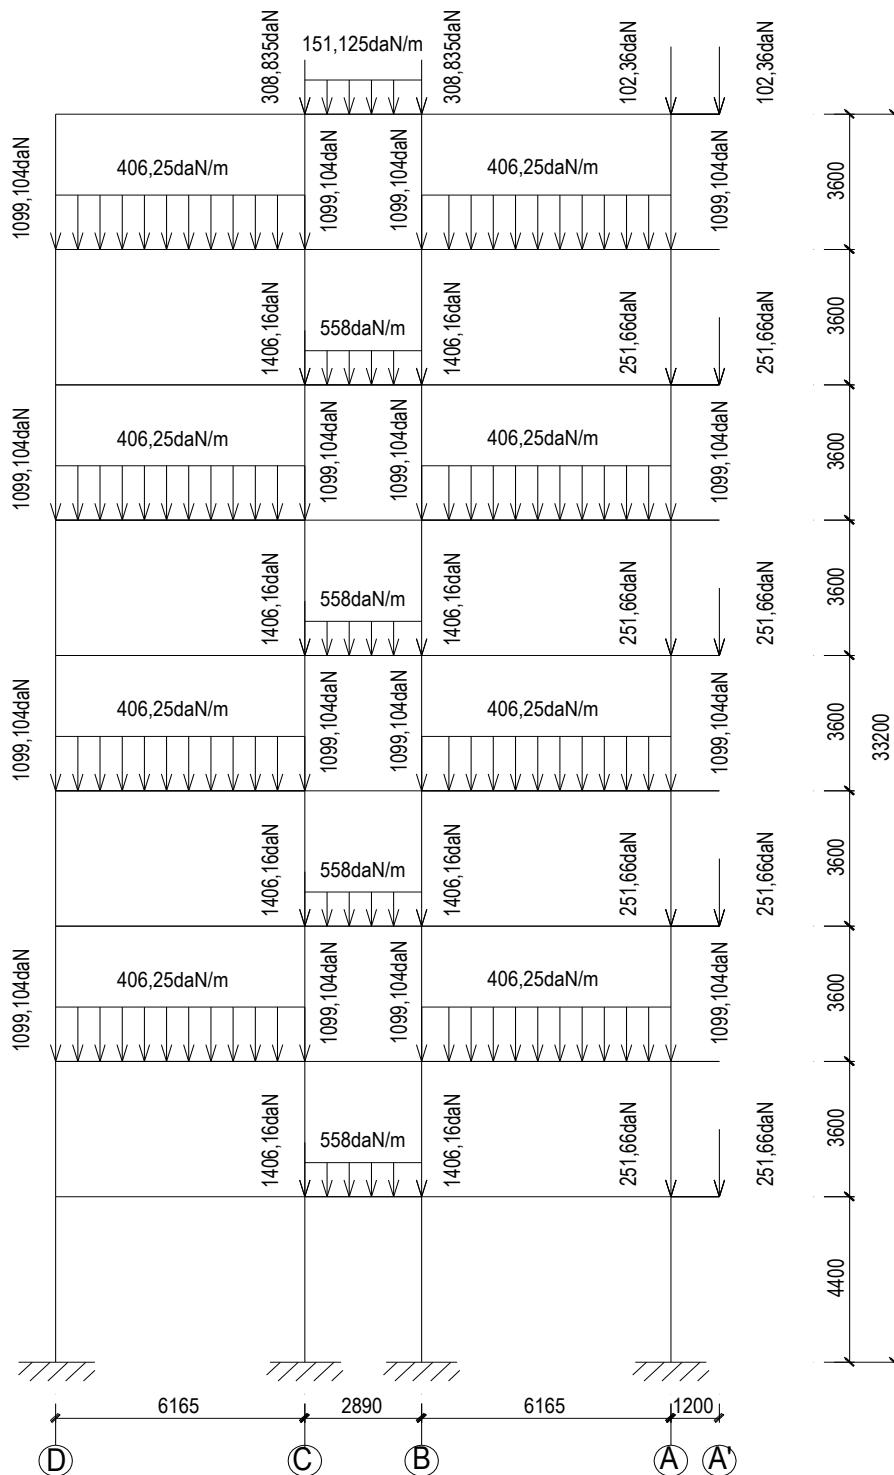

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

## 4. Xác định tải trọng ngang tác dụng vào khung trục 5.

(tải trọng gió)

### 4.1. Đặc điểm:

- Công trình đ- ợc thiết kế với các cấu kiện chịu lực chính là khung bê tông cốt thép. Sàn có chiều dày  $\delta = 10$  cm.

- Để đơn giản cho tính toán và thi công ta coi tải trọng ngang chỉ có khung chịu lực, các khung chịu tải trọng ngang theo diện tích tải.

-Tải trọng gió gồm 2 thành phần : tĩnh và động.

+Theo TCVN 2737 - 1995 thành phần động của tải trọng gió phải đ- ợc kể đến khi tính toán công trình tháp tru, các nhà nhiều tầng cao hơn 40 m. Công trình “Trụ sở làm việc Công Ty Nông nghiệp Hải D- ơng” có chiều cao công trình  $H = 35,1$  m  $< 40(m)$

Vậy theo TCVN 2737-1995 ta không phải tính đến thành phần động của tải trọng gió.

+Chỉ tính đến thành phần gió tĩnh:

- Công trình xây dựng tại thành phố Hải D- ơng thuộc vùng gió III-B có áp lực gió đơn vị :  $W_0 = 125$  daN/m<sup>2</sup>, địa hình C.

-Gió đẩy :  $q_d = W_0 \cdot n \cdot k_i \cdot C_d \cdot B$ .

-Gió hút:  $q_h = W_0 \cdot n \cdot k_i \cdot C_h \cdot B$ .

Trong đó:

+ $k_i$  : hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình (theo bảng 5-TCVN 2737-1995)

+ $C_d, C_h$  : hệ số khí động xác định theo bảng 6 - TCVN 2737-1995.

+ $B$  : b- ớc cột (m).

-Gió từ trái sang và gió từ phải sang có cùng trị số nh- ng ng- ợc chiều nhau.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

---

## 4.2. Xác định tải trọng gió trái tác dụng vào khung trục 5 :

Bảng tính k (có sử dụng phép nội suy từ bảng 5-TCVN 2737-1995):

Tầng	Chiều cao tầng (m)	Z(m)	K
1	4,25	4,25	0,5138
2	3,6	7,85	0,6084
3	3,6	11,45	0,6832
4	3,6	15,05	0,7406
5	3,6	18,65	0,7383
6	3,6	22,25	0,82025
7	3,6	25,85	0,85265
8	3,6	29,45	0,885
9	3,6	33,05	0,9144

Bảng tính toán tải trọng gió:

K	n	C <sub>d</sub>	C <sub>h</sub>	q <sub>d</sub> (KN/m)	q <sub>h</sub> (KN/m)
0,5138	1,2	0,8	0,6	2,775	2,08
0,6084	1,2	0,8	0,6	3,285	2,464
0,6832	1,2	0,8	0,6	3,689	2,767
0,7406	1,2	0,8	0,6	3,999	2,999
0,7838	1,2	0,8	0,6	4,232	3,174
0,8202	1,2	0,8	0,6	4,429	3,322
0,8526	1,2	0,8	0,6	4,604	3,453
0,885	1,2	0,8	0,6	4,779	3,584
0,9144	1,2	0,8	0,6	4,937	3,703

Tải trọng gió trên mái quy về lực tập trung đặt tại đầu cột S<sub>d</sub>, S<sub>h</sub>, với k= 0,9144, trị số tính theo công thức.

$$S = n \cdot K \cdot W_0 \cdot B \cdot C \cdot H_{tm}$$


$$H_{tm} = 1,2m$$

$$S_d = 1,2 \cdot 0,9144 \cdot 1,25 \cdot 4,5 \cdot 0,8 \cdot 1,2 = 5,925(\text{KN})$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

$$S_h = 1,2 \cdot 0,9144 \cdot 1,25 \cdot 4,5 \cdot 0,6 \cdot 1,2 = 4,444 \text{ (KN)}$$

SƠ ĐỒ GIÓ TRÁI TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

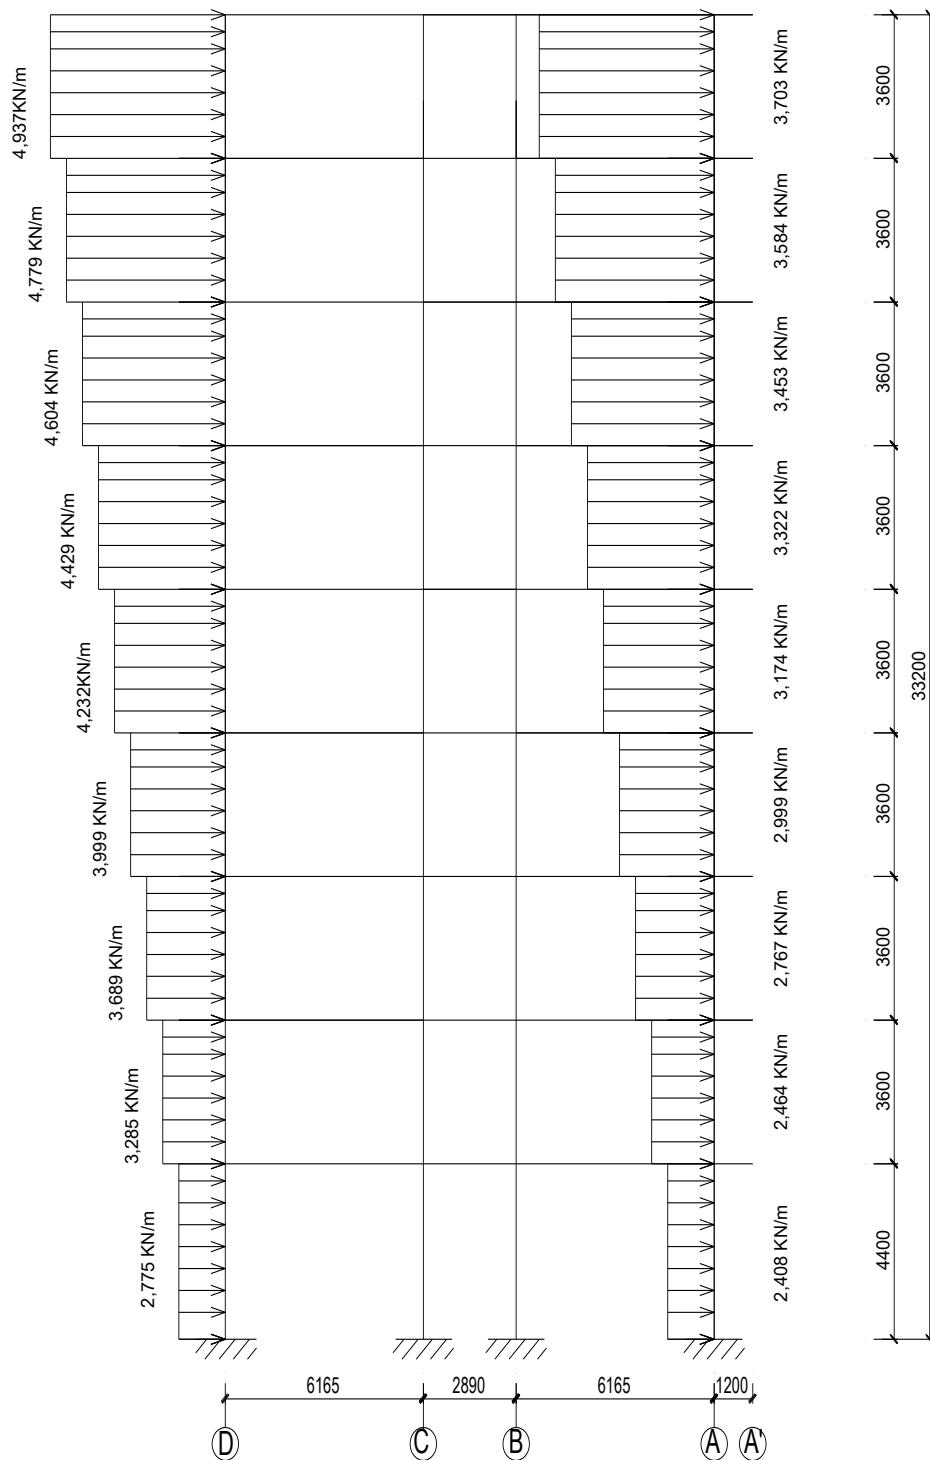

### III. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG KHUNG TRÚC 5.

Sử dụng phần mềm SAP.2000 để tính toán nội lực cho khung.

Kết quả tính đ- ợc thể hiện trong các bảng đính kèm

### IV. TỔ HỢP NỘI LỰC.

Các bảng tổ hợp nội lực cho dầm đ- ợc trình bày trong các bảng từ 2.1 đến 2.9 và bảng tổ hợp nội lực cho cột đ- ợc trình bày trong các bảng từ 3.1 đến 3.9.

### IV. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM.

#### 1.Tính toán cốt thép dọc

##### 1.1.Chọn vật liệu:

- Bê tông có cấp độ bê tông B15 có:  $R_b = 8,5 \text{ Mpa}$  ;
- Cốt thép AI ( $\phi < 10$ ):  $R_s = R_{sc} = 225 \text{ Mpa}$ ;  $R_{sw} = 175 \text{ Mpa}$ ;
- Cốt thép AII( $\phi \geq 10$ ) :  $R_s = R_{sc} = 280 \text{ Mpa}$  ;  $R_{sw} = 225 \text{ Mpa}$ ;
- $\zeta_R = 0,65$ ;  $\alpha_R = 0,439$ .

##### 1.2.Dầm nhịp CD.

(tầng 2, phần tử 37,Bxh=220x700 mm )

-Từ bảng tổ hợp nội lực chọn ra:

+Gối C:  $M_C = 251 \text{ KN.m}$ .

+Gối D:  $M_D = 220,13 \text{ KN.m}$ .

+Nhịp giữa :  $M_{CD} = 146,28 \text{ KN.m}$ .

\*Tính cốt thép cho gối C:

Giả thiết  $a = 4 \text{ cm}$ ,  $h_0 = 70 - 4 = 66 \text{ cm}$ .

$$\alpha_m = \frac{M_c}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{251}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 0,22 \cdot 0,66^2} = 0,3081 < \alpha_R = 0,439.$$

→Bài toán cốt đơn.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,8097.$$

$$A = \frac{M_c}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{251 \cdot 10^6}{280 \cdot 10^3 \cdot 0,8097 \cdot 0,66}$$

$$A = 1677,38 \text{ mm}^2$$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{1167,38}{220 \cdot 660} = 2,43\% > \mu_{min} = 0,05\%.$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

\*Tính cốt thép cho gối D:

Giả thiết a= 4 cm, h<sub>0</sub>= 70-4 =66 cm.

$$\alpha_m = \frac{M_D}{R_b b h_0^2} = \frac{220,13}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 0,22 \cdot 0,66^2} = 0,2702 < \alpha_R = 0,439.$$

→Bài toán cốt đơn.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,8389$$

$$A = \frac{M_C}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{220,13 \cdot 10^6}{280 \cdot 10^3 \cdot 0,8389 \cdot 0,66}$$

$$A = 1419,86 \text{ mm}^2.$$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{1419,86}{220,660} = 0,97\% > \mu_{min} = 0,05\%.$$

\*Tính thép cho nhịp CD (mô men d-ong).

Giả thiết a= 4 cm, h<sub>0</sub>= 70-4 =66 cm.

Tính theo tiết diện chữ T có cánh trong vùng nén, h'<sub>f</sub>= 10 cm.

-Độ v-ơn S<sub>c</sub> của sải cánh là min của:

+Một nửa khoảng cách thông thuỷ giữa các s-ờn dọc:

$$b_t = 0,5 \cdot (4,5 - 0,22) = 2,14 \text{ m}$$

$$+1/6 nhịp cầu kiện: \frac{6,165}{6} = 1,028 \text{ m}$$

$$S_c = 1,028 \text{ m}$$

$$b'_f = b + 2 \cdot S_c = 0,22 + 2 \cdot 1,028 = 2,276 \text{ m}$$

$$M_f = R_b \cdot b'_f \cdot h'_f (h_0 - 2 \cdot h'_f)$$

$$= 8,5 \cdot 10^3 \cdot 2,276 \cdot 0,1 \cdot (0,66 - 0,5 \cdot 0,1) = 1179,59 \text{ KN.m}$$

$$M_{max} = 146,68 \text{ KN.m} < M_f = 1179,59 \text{ KN.m}$$

→Trục trung hoà qua cánh.

$$\alpha_m = \frac{M_{CD}}{R_b b'_f h_0^2} = \frac{146,68}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 2,276 \cdot 0,66^2} = 0,1714 < \alpha_R = 0,439.$$

→Bài toán cốt đơn.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,9912$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$A = \frac{M_{CD}}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{146,68 \cdot 10^6}{280 \cdot 10^3 \cdot 0,9912 \cdot 0,66}$$

$$A = 800,756 \text{ mm}^2.$$

$$\mu_t = \frac{A}{bh_0} = \frac{800,756}{220 \cdot 660} = 1,16\% > \mu_{\min} = 0,05\%.$$

## 1.3. Dâm nhip BC.

(tầng 2, phần tử 38, Bxh=220x300 mm )

- Từ bảng tổ hợp nội lực chọn ra:

+ Gối C:  $M_C = 38,14 \text{ KN.m.}$

+ Gối B:  $M_B = 41,8 \text{ KN.m.}$

+ Nhịp giữa :  $M_{CD} = 39,54 \text{ KN.m.}$

Tính toán t-ơng tự cho kết quả :

+ Gối B:  $A = 725,9 \text{ mm}^2; \mu_t = 0,41\%$

+ Gối C:  $A = 642,92 \text{ mm}^2; \mu_t = 0,36\%$

+ Nhịp giữa :  $A = 559,91 \text{ mm}^2; \mu_t = 0,32\%$

## 1.4. Dâm nhip AB.

(tầng 2, phần tử 39, Bxh=220x700 mm )

- Từ bảng tổ hợp nội lực chọn ra:

+ Gối A:  $M_A = 285,36 \text{ KN.m.}$

+ Gối B:  $M_B = 239,73 \text{ KN.m.}$

+ Nhịp giữa :  $M_{AB} = 165,04 \text{ KN.m.}$

Tính toán t-ơng tự cho kết quả :

+ Gối A:  $A = 1996,14 \text{ mm}^2; \mu_t = 2,89\%$

+ Gối B:  $A = 1580,64 \text{ mm}^2; \mu_t = 2,29\%$

+ Nhịp giữa :  $A = 901,99 \text{ mm}^2; \mu_t = 1,3\%$

## 1.5. Dâm công xôn.

(tầng 2, phần tử 40, Bxh=220x700 mm )

Mô men âm lớn nhất ở đâu ngàm  $M = 72,02 \text{ KN}$

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{72,02}{8,5 \cdot 10^3 \cdot 0,22 \cdot 0,66^2} = 0,0885 < \alpha_R = 0,439.$$

→ Bài toán cốt đơn.

$$\zeta = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_m}}{2} = 0,9536$$


# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

---

$$A = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{72,02 \cdot 10^6}{280 \cdot 10^3 \cdot 0,9536 \cdot 0,66}$$

$$A = 409,8 \text{ mm}^2.$$

## 1.4.Chọn thép cho đầm tầng

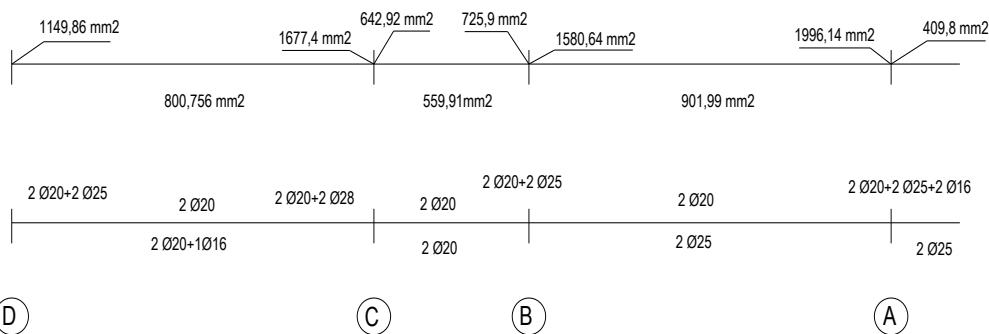

## 2. Tính toán cốt đai.

\* Nhịp CD.

Chọn nội lực nguy hiểm nhất từ bảng tổ hợp nội lực.

$$Q = 146,168 \text{ KN} = 1461,68 \text{ daN}$$

Thép AI R<sub>sw</sub> = 175 MPa, E<sub>s</sub> = 2,1.10<sup>5</sup> MPa

B15 :

$$R_b = 8,5 \text{ MPa}$$

$$R_{bt} = 0,75 \text{ MPa}$$

$$E_b = 2,3 \cdot 10^4 \text{ MPa}$$

Đầm chịu tải trọng phân bố đều với:

$$g = g_1 + g_{01}$$

$$g_1 = 2318,7 \text{ daN/m.}$$

$$g_{01} = 2500 \cdot 0,22 \cdot 0,7 \cdot 1,1 = 423,5 \text{ daN/m.}$$

$$g = 2742,2 \text{ daN/m.}$$

$$p = 406,25 \text{ daN/m.}$$

$$q_1 = g + 0,5p = 2742,2 + 0,5 \cdot 406,25 = 2945,3 \text{ daN/m.} = 29,453 \text{ daN/cm.}$$

Chọn a=4cm, h<sub>0</sub>= 70-4=66 cm.

Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính.

$$Q \leq 0,3 \cdot \varphi_w \cdot \varphi_b \cdot R_b \cdot b \cdot h_0$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Giả thiết  $\varphi_w, \varphi_b = 1$

Ta có  $0,3 \cdot R_b \cdot b \cdot h_o = 0,3 \cdot 85 \cdot 22 \cdot 70 = 39270 \text{ daN} > Q$

→ Dầm dư kn dhục ú nén chính

\* Kiểm tra sự cần thiết đặt cốt đai

- Bỏ qua ảnh hưởng của lúp dọc trực  $\varphi_n = 0$

$$Q_{b \min} = \varphi_{b3} (1 + \varphi_n) R_{bt} \cdot b \cdot h_c$$

$$= 0,6 \cdot (1 + 0) 7,5 \cdot 22 \cdot 66$$

$$= 6534 \text{ (daN)}$$

$$Q = 14616,8 > Q_{b \ min}$$

→ Phải đặt cột đai chịu cắt

$$M_b = \varphi_{b2} (1 + \varphi_f + \varphi_n) R_{bt} \cdot b \cdot h_o^2$$

$$= 2 (1 + 0 + 0) 7,5 \cdot 22 \cdot 66^2$$

$$= 1437480 \text{ (daNm)}$$

- Dầm có phần nằm trong vùng kéo  $\varphi_f = 0$

$$Q_{b1} = 2\sqrt{N_b \cdot q_l}$$

$$= 2\sqrt{143748029,453}$$

$$= 13031,546 \text{ daN}$$

$$C_0^* = \frac{M_b}{Q - Q_{b1}} = \frac{1437480}{14616,8 - 13031,546}$$

$$C_0^* = 896,60 \text{ cm}$$

$$\frac{3}{4} \sqrt{\frac{M_b}{q_l}} = \frac{3}{4} \sqrt{\frac{1437480}{29,453}} = 165,69 < C_0^*$$

$$\rightarrow C = C_0 = \frac{2M_b}{Q} = \frac{2 \cdot 1437480}{14616,8}$$

$$= 196,688 \text{ (cm)}$$

$$q_{sw} = \frac{Q - M_{b/c} - q_l C}{C_0}$$
$$= \frac{14616,8 - \frac{1437480}{196,68} - 29,453 \cdot 196,68}{196,688}$$

$$q_{sw} = 7,705 \text{ daN/cm}$$

$$+ \frac{Q_{b \ min}}{2h_0} = \frac{6534}{2,66} = 49,5 \text{ (daN/cm)}$$

$$+ \frac{Q - Q_{b1}}{2h_0} = \frac{14616,8 - 13031,546}{2,66} = 12,146 \text{ (daN/cm)}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$q_{sw} \geq \left( \frac{Q - Q_{bi}}{2h_0}; \frac{Q_{b\min}}{2h_0} \right)$$

Chọn  $q_{sw} = 49,5$  cm

- Dùng dai  $\phi 6$ , 2 nhánh  $n = 2$

Khoảng cách tính:

$$+ S_H = \frac{R_{sw} \cdot n \cdot a_{sw}}{q_{sw}} = \frac{1750 \cdot 2 \cdot 0,283}{49,5} = 20,1$$

$h = 70\text{cm} > 45\text{cm}$

+  $S_{ct} = ,0\text{m}$  ( $h/3 ; 50\text{cm}$ ) =  $23,3\text{cm}$

$$+ S_{\max} = \frac{\varphi_4(1+\varphi_n)R_H \cdot b \cdot h_0^2}{Q} = \frac{1,5(1+0)7,5 \cdot 226}{146168} = 73,75\text{cm}$$

Khoảng cách đai:

$$S = \min(S_{ct}, S_{tt}, S_{\max}) = 20\text{cm}$$

Bố trí  $\phi 6$  a 200 cho đầm

- Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính

$$Q < 0,3 \varphi_{w1} \cdot \varphi_{b1} \cdot R_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot h_0$$

$$\varphi_{w1} = 1 + 5 \alpha, u_w \leq 1,3$$

$$u_w = \frac{n \cdot a_{sw}}{b \cdot s} = \frac{2.9283}{22.200} = 0,00129$$

$$\alpha = \frac{E_s}{E_b} = \frac{2,1 \cdot 10^5}{2,3 \cdot 10^4} = 9,13$$

$$- \varphi_{w1} = 1 + 5 \alpha \quad u_w = 1,059 < 1,3$$

$$- \varphi_{b1} = 1 - 0,01 \cdot 8,5 = 0,915$$

$$\varphi_{w1} \cdot \varphi_{b1} = 1,059 \cdot 0,915 = 0,969 \approx 1$$

$$\text{Ta có: } Q = 14616,8 < 0,3 \cdot 0,969 \cdot 85 \cdot 22 \cdot 66 = 35878,19$$

→ Dầm đủ điều kiện trên tiết diện ứng suất nền chính.

3. Tính toán thép cột

\*. Vật liệu

B15:  $\phi 16 = 8.5\text{MPa}$

AII:  $R_s = R_{cc} = 280\text{MPa}$

$\alpha_R = 0,439, 3R = 0,65$

\*. Cột A<sub>5</sub> tầng 1 cách 4,4 m

$b = 2,7,41 = 3,08\text{ m}$

Giả sử  $a = a' = 4\text{ cm} \rightarrow h_0 = h - a = 60 - 4 = 56$

$z_a = h_0 - a = 36 - 4 = 32$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\lambda_n = \frac{l}{h} = \frac{3,08}{0,6} = 5,13 < 8$$

→ bỏ qua uốn dọc,  $\gamma = 1$

Độ lệch tâm ngẫu nhiên

$$e_a = \max\left(\frac{1}{600}H; \frac{1}{30}h_c\right)$$
$$= \max\left(\frac{1}{600}.440; \frac{1}{30}.60\right) = 2$$

Cặp nội lực tính

$$+ \begin{cases} M_{max} = 210,9 KNm \\ N_{tu} = 2362 KN \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} M_{tu} = 195 KNm \\ N_{max} = 2572 KN \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} M(e \text{ max}) = 194,9 KNm \\ N = 1766 KN \end{cases}$$

\* Tính cho cặp 1

$$\begin{cases} M = 210,9 KNm \\ N = 2362 KN \end{cases}$$

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{210,9}{2362} = 8,928(cm)$$

$$e = ne_0 + \frac{h}{2} - a = 1 . 8,928 + \frac{60}{2} - 4$$

$$e = 34,928 (cm)$$

$$\begin{cases} B15 \\ AII \end{cases} \rightarrow SR = 0,65$$

$$x_1 = \frac{N}{R_b.b} = \frac{26362}{8,5.10^9.0,22} = 0,794m$$

$$SRh_0 = 0,65 . 56 = 36,4 (cm)$$

$$x_1 > SRh_0 \rightarrow \text{TH lệch tâm bé}$$

Xác định lại x theo phương pháp gần đúng

$$n = \frac{N}{R_b.b.h_0} = \frac{26362}{8,5.10^3.0,35.0,6.100} = 1,42$$

$$\varepsilon = \frac{e}{h_0} = \frac{34,228}{56} = 0,62$$

$$\gamma = \frac{z_a}{h_i} = \frac{54}{56} = 0,93$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\tau = \frac{E(1-SR)\gamma_a \cdot n + 2SR(n\varepsilon - 0,48)h_0}{(1-SR)\gamma_a + 2(n\varepsilon - 0,48)}$$

$$r = 48,73 \text{ cm}$$

$$A'_s = 2516,02 \text{ mm}^2$$

$$A_s = A'_s = 2516,02 \text{ mm}^2$$

$$\mu = \frac{A \cdot 100\%}{bhv} = \frac{2516,02}{350,560} \cdot 100\% = 1,28\% > \mu_{\min} = 0,1\%$$

$$(\mu_{\min} \text{ xó theo TCXD VN 356 - 2005 theo độ mảnh } \lambda = \frac{h}{\tau})$$

$$\lambda < 17 \rightarrow \mu_{\min} = 0,05\%$$

$$\lambda = 17 \div 35 \rightarrow \mu_{\min} = 0,1\%$$

$$\lambda = 35 \div 83 \rightarrow \mu_{\min} = 0,2\%$$

$$\lambda = 83 \rightarrow \mu_{\min} = 0,25\%$$

$$\text{Ở đây } \lambda = \frac{b}{\tau} = \frac{3,08}{0,288 \cdot 0,35} = 30,34$$

$$\rightarrow \mu_{\min} = 0,1\%$$

\* Tính cho cặp 2

$$\begin{cases} M = 195KNm \\ N = 2372KN \end{cases}$$

$$l_0 = \frac{M}{N} = 7,538(cm)$$

$$e = \mu l_0 + \frac{h}{2} - a = 33,582(cm)$$

$$x_1 = \frac{N}{P_b \cdot b} = 86,4(cm)$$

$$x_1 > \varepsilon_R \cdot h_0 = 31,4 \rightarrow \text{TH lệch tâm bé}$$

Tính lại x

$$\left. \begin{array}{l} n = 1,54 \\ \varepsilon = 0,6 \\ \gamma = 0,93 \end{array} \right\} \Rightarrow x = 49,77(cm)$$

$$A'_s = 2767,4 \text{ mm}^2$$

$$A_s = A'_s = 2767,4 \text{ mm}^2$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\mu_1 = \frac{A_s \cdot 100\%}{b \cdot h_0} = 1,4119\% > \mu_{\min} = 0,1\%$$

\* Tính cho cặp 3:  $\begin{cases} M = 194,9 KNm \\ N = 1766 KN \end{cases}$

Tương tự có:  $l_0 = 11,04\text{cm}$

$e = 37,035 (\text{cm})$

$x_1 = 59,4 \text{ cm} > SR \cdot h_0 = 36,4 (\text{cm})$

→ BT lệch tâm bé

→ Tính lại x

$$\left. \begin{array}{l} n = 1,06 \\ \varepsilon = 0,66 \\ \gamma = 0,93 \end{array} \right\} \Rightarrow x = 46,13(\text{cm})$$

$$A_s = A'_s = 1387,52 \text{ mm}^2$$

$$\mu = \frac{A_s \cdot 100\%}{b \cdot h_0} = 0,707\% > \mu_{\min} = 0,1\%$$

Chọn thép tích ở cặp 2

$$A_s = A'_s = 2767,4 \text{ mm}^2 \rightarrow A = 2A = 5534,8$$

Chọn 2x4 φ30:  $A = 2 \cdot 2827,4 \text{ mm}^2$

$$= 5654,8 (\text{mm}^2)$$

Kết quả tính thép dầm và thép cột được thể hiện chi tiết trong các bảng từ 4.1 đến 4.9 và 5.1 đến 5.9.

**CH- ƠNG V.**

**TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ TRỰC 3-4**

**I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO KIẾN TRÚC VÀ KẾT CẤU CỦA CẦU THANG:**

**1. Đặc điểm kiến trúc:**

-Đây là cầu thang bộ chính dùng để l-u thông giữa các tầng nhà, Cầu thang thuộc loại cầu thang 2 vế có cốt, đổ bê tông cốt thép tại chỗ

-Bậc thang đ-ợc xây bằng gạch đặc, trên các bậc thang và chiếu nghỉ, chiếu tối đều đ-ợc ốp bằng đá granit. Lan can cầu thang đ-ợc làm bằng thép inox , tay vịn bằng gỗ.

-Cầu thang bắt đầu từ tầng 1 và giống nhau đến hết tầng 9.

-Cầu thang có 24 bậc .Mỗi bậc cao 150 mm dài 250 mm.

**2. Đặc điểm kết cấu:**

-Cầu thang là 1 kết cấu l-u thông theo ph-ơng thẳng đứng của toà nhà và chịu tải trọng do con ng-ời gây ra. Khi thiết kế ngoài yêu cầu tạo kiến trúc phải chọn kích th-ớc các dầm và các bản sao cho khống chế đ-ợc độ vông của kết cấu. Tạo cảm giác an toàn cho ng-ời sử dụng.

-Chọn bê tông dày cho tất cả các bản thang là :100 mm

-Kích th-ớc dầm chiếu nghỉ, chiếu tối :  $b \times h = 220 \times 300$ (mm).

-Kích th-ớc cốt :  $b \times h = 120 \times 300$ (mm).

-Các bản thang xung quanh đ-ợc kê lên t-ờng gạch, dầm chiếu tối, chiếu nghỉ và cốt thang.

-Tất cả các bộ phận kết cấu đều dùng:

Bê tông mác B15 có:  $R_b = 8,5 \text{ Mpa} = 85 \text{ Kg/cm}^2$ .


Bản thang dùng nhóm AI có:  $R_s = R_{sc} = 225 \text{ Mpa} = 2250 \text{ Kg/cm}^2$ .

$R_{sw} = 175 \text{ Mpa} = 1750 \text{ Kg/cm}^2$

Thép cốt thang,dầm chiếu nghỉ và chiếu tối dùng nhóm AII có

$R_s = R_{sc} = 280 \text{ Mpa} = 2800 \text{ Kg/cm}^2$ .

$R_{sw} = 225 \text{ Mpa} = 2250 \text{ Kg/cm}^2$

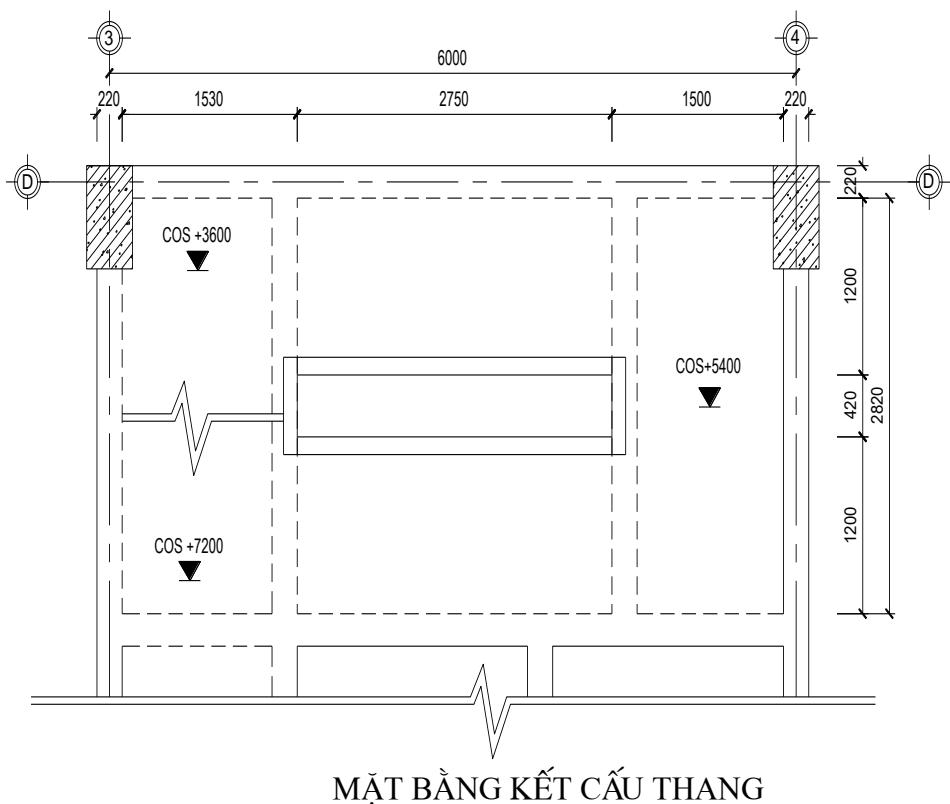

## II. TÍNH TOÁN BẢN THANG.

### 1. Sơ đồ tính toán :

Chiều dài của bản thang theo phong mặt phẳng nghiêng (theo hồ sơ kiến trúc) là:

$$l_2 = \sqrt{2,75^2 + 1,65^2} = 3,2 \text{ m}$$

$$\text{Xét tỷ số } \frac{l_2}{l_1} = \frac{3,2}{1,31} = 2,44 > 2$$

Bỏ qua sự làm việc theo cạnh dài ta tính toán bản thang theo phong cạnh ngắn.

Sơ đồ tính là dầm đơn giản 2 đầu (khớp) kê lên cốt thang:

Xác định kích thước sơ bộ:

Chiều dày bản xác định sơ bộ theo công thức:

$$h_b = \frac{D}{m} L$$

$D = 0,8 \div 1,4$  là hệ số phụ thuộc tải trọng. Chọn  $D = 1,2$

$L = l_1 = 131 \text{ cm} ; m = 30 \div 35$ . Chọn  $m = 30$ .

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$h_b = \frac{1,31.120}{30} = 5,24\text{cm}. Chọn h_b = 10\text{ cm}.$$

Nhịp tính toán:

$$l_o = l_1 - \frac{b_{ct} + b_t}{2} + 0,5h_b$$

$b_{ct}$  : chiều rộng của cốn thang, giả thiết  $b_{ct} = 12\text{ cm}$ .

$b_t$  : chiều rộng của t-ờng bt = 22 cm.

$$l_o = 131 - \frac{12 + 22}{2} + 0,5.10 = 109\text{ cm}$$

## 2. Xác định tải trọng:

### 2.1. Tính tải

Các lớp sàn	g daN/m <sup>3</sup>	Dày (mm)	g <sub>lc</sub> daN/m <sup>2</sup>	n	g <sub>tt</sub> daN/m <sup>2</sup>
Gạch xây và lát bậc	180 0	15 0	270	1.1	297
Bảng sàn BTCT	250 0	70	175	1.2	210
Vữa xây gạch trát trên	200 0	50	100	1.3	130
Cộng tĩnh tải			620		637

### 2.2. Hoạt tải:

Theo TCVN 2737 - 95 có hoạt tải tác dụng lên bản thang là:

$$P_{tc} = 400\text{ Kg/cm}^2; n = 1,2;$$

$$P_{tt} = 1,2 \times 400 = 480\text{ Kg/cm}^2$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Tải trọng toàn phần tác dụng lên bản thang là:

$$q = g + p = 637 + 480 = 1117 \text{ Kg/cm}^2$$

Thành phần tác dụng vuông góc với bản gây ra mô men uốn & lực cắt (M & Q).

$$q_1 = q \cdot \cos\alpha = 1117 \cdot \frac{2,75}{3,2} = 960 \text{ Kg/cm}^2$$


Thành phần tác dụng dọc trực bản thang, gây nén cho bản:

$$q_1 = q \cdot \sin\alpha = 1117 \cdot \frac{1,8}{3,2} = 628,3 \text{ Kg/cm}^2$$

Do bê tông là vật liệu chịu nén tốt nên có thể bỏ qua thành phần  $q_2$ .

Tính toán cho một đơn vị diện tích với diện tích chữ nhật chiều cao  $h_b = 10\text{cm}$ ; chiều rộng  $b = 100\text{cm}$

Sơ đồ tính toán:

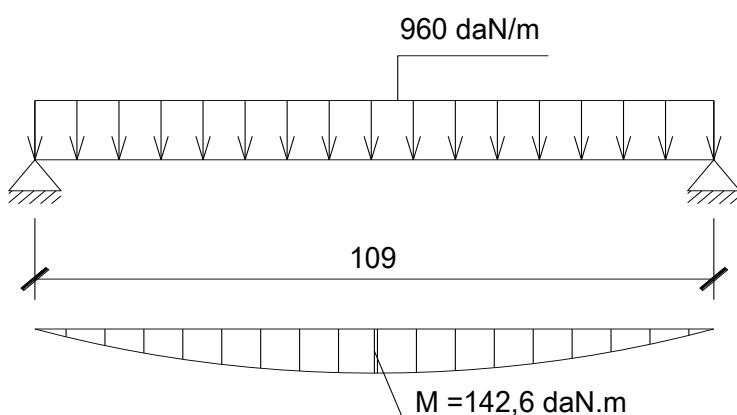

### 3. Tính toán nội lực và cốt thép :

Theo sơ đồ tính toán, cắt 1 dải bản rộng 1m song song với cạnh ngắn để tính toán. Mômen lớn nhất ở giữa nhịp:

$$M_{\max} = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{960 \cdot 1,09^2}{8} = 142,6 \text{ daN.m} = 14260 \text{ Kg.cm}$$

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ:  $a_0 = 1,5$

$$\rightarrow h_0 = h - a_0 = 10 - 1,5 = 8,5 \text{ cm.}$$

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{14260}{85 \cdot 100 \cdot 8,5^2} = 0,232$$

$$\zeta = 0,5 \cdot (1 + \sqrt{1 - 2 \cdot \alpha_m}) = 0,988$$

$$A = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{14260}{2250 \cdot 0,988 \cdot 8,5} = 0,75 \text{ cm}^2$$

Chọn  $\phi 6$  s200 có  $A_s = 1,41 \text{ cm}^2$  ( $\mu = 0,27\%$ ).


$$\mu_t = \frac{A}{b \cdot h_0} = \frac{1,41}{100 \cdot 8,5} = 0,16 \%$$

Cốt thép âm và cốt thép dọc tại gối đặt theo cấu tạo  $\phi 6$  s200;

### III. TÍNH TOÁN CỐN THANG.

#### 1. Sơ đồ tính toán.

Ta xem cốn thang là dầm đơn giản liên kết hai đầu khớp.

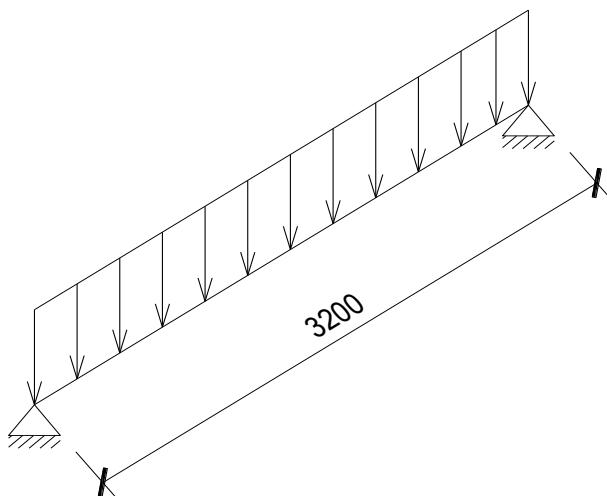

#### 2. Tải trọng tác dụng:

- Tải trọng lớp vữa vừa trát:

$$g_v = 1,3 \cdot 0,015 \cdot 1800 (0,12 + 0,25 \cdot 2) = 21,76 \text{ kG/m}$$

- Tải trọng do lan can, tay vịn:

$$q' = 1,1 \cdot 50 = 55 \text{ kG/m}$$

- Trọng lượng bản thân:

$$g_{bt} = n \cdot b \cdot h \cdot \gamma = 1,2 \cdot 0,12 \cdot 0,3 \cdot 2500 = 108 \text{ kg/m}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

- Tải trọng do bản thang truyền xuống:

$$p=1,09.0,5.1117 = 608,76 \text{ kg/m}$$

- Tổng tải trọng tác dụng lên cốt thang:

$$q= 21,76+55+108+608,76 = 793,5 \text{ kg/m}$$

- Phần tải trọng tác dụng vuông góc với cốt thang:

$$q_1 = q \cdot \cos\alpha = 793,5 \cdot \frac{2,75}{3,2} = 682 \text{ kg/m}$$

- Thành phần  $q_2$  song song với cốt thang gây nén cho cốt thang nh- ng do bê tông là vật liệu chịu nén tốt nên có thể bỏ qua  $q_2$ .

## 3. Xác định nội lực.

Mômen tại giữa nhịp :

$$M = \frac{q_1 l^2}{8} = \frac{682,3,2^2}{8} = 872,96 \text{ kg.m}$$

Lực cắt lớn nhất (tại gối):

$$Q_{\max} = \frac{q_1 l^2}{8} = \frac{682,3,2}{2} = 1091,7 \text{ kg}$$

## 4.Tính toán cốt thép :

### 4.1.Tính toán cốt thép doc:

+ Sử dụng bêtông B15, cốt thép nhóm AI ta có:

$$R_b = 14,5 \text{ Mpa} = 145 \text{ Kg/cm}^2$$

$$R_s = R_{sc} = 225 \text{ Mpa} = 2250 \text{ Kg/cm}^2$$

+ Chọn chiều dày lớp bêtông bảo vệ là  $a_0 = 2(\text{cm})$

$$\Rightarrow h_0 = h - a_0 = 30 - 2 = 28(\text{cm})..$$

Cốt thép giữa nhịp :

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{87296}{85.12.28^2} = 0,1091 < 0,439$$

$$\zeta = 0,5.(1 + \sqrt{1 - 2 \cdot \alpha_m}) = 0,942$$

$$A = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{87296}{2250 \cdot 0,942 \cdot 28} = 1,47 \text{ cm}^2$$

Chọn 1φ14 có  $A_s = 1,539 (\text{cm}^2)$

$$\mu_t = \frac{A}{b \cdot h_0} = \frac{1,539}{12.28} = 0,45\%$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Chọn cốt thép âm đặt theo cấu tạo 1φ12:

## 4.2.Tính toán cốt đai:

Kiểm tra điều kiện khống chế để bêton không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng:

$$Q \leq 0,3 \cdot \varphi_{w1} \cdot \varphi_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot h_o$$

Trong đó :

$\varphi_{w1}$ : Hệ số xét đến ảnh hưởng của cốt đai đặt vuông góc với trục cầu kiện

$$\varphi_{w1} = 1 + 5 \cdot \alpha \cdot \mu_w$$

$$\alpha = \frac{E_s}{E_b} = \frac{210000}{30000} = 7$$

$$\mu_w = \frac{A_{sw}}{b \cdot s} = \frac{56,6}{200.150} = 0,0019$$

Giả thiết cốt đai  $\phi 6a150 \Rightarrow A_{sw} = 2.28,3 = 56,6 \text{ mm}^2$

$$\rightarrow \varphi_{n1} = 1 + 5 \cdot 7 \cdot 0,0019 = 1,0665 < 1,3$$

Mặt khác  $\varphi_{b1} = 1 - \beta \cdot R_b = 1 - 0,01 \cdot 14,5 = 0,855$  (với bê tông nặng  $\beta = 0,01$ )

Ta có:

$$Q = 1091,7 < 0,3 \cdot 1,0665 \cdot 0,855 \cdot 85 \cdot 12 \cdot 28 = 7812,8 \text{ kg}$$

→ Bêton không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng.

Kiểm tra xem có phải tính toán cốt đai hay không:

Ta có :  $R_b = 8,5 \text{ Mpa}$  ;  $R_{sw} = 225 \text{ Mpa}$  ;  $\phi_{b2} = 2$  ;

$$\phi_{b3} = 0,6 ; \phi_{b4} = 1,5 ; \phi_n = 0 ; \beta = 0,01 ;$$

+ Điều kiện tính toán :

$$Q = 1091,7 < Q_{bo} = \frac{\Phi_{b4}(1 + \Phi_n)R_{bt}bh_0^2}{C} = \frac{1,5 \cdot 85 \cdot 12 \cdot 28^2}{145} = 9522 \text{ kg}$$

→ Không cần phải tính toán cốt đai, đặt cốt đai theo cấu tạo

Khoảng cách cốt đai đặt theo cấu tạo:

+ở gối :

$$\leq \begin{cases} \frac{h}{2} = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ (cm)} \\ 15 \text{ (cm)} \end{cases} \Rightarrow \text{Tại gối đặt đai } \phi 6s 120$$


+ ở giữa nhịp :

$$U_{ct} \leq \begin{cases} \frac{3h}{4} = \frac{3.25}{4} = 18,75 \text{ (cm)} \\ 50 \text{ (cm)} \end{cases} \Rightarrow \text{Tại giữa nhịp đặt đai } \phi 6a150$$

## 5. Tính toán sàn chiếu nghỉ

### 5.1. Sơ đồ tính toán.

Sơ đồ kết cấu và kích thước của sàn chiếu nghỉ được thể hiện ở hình vẽ sau:

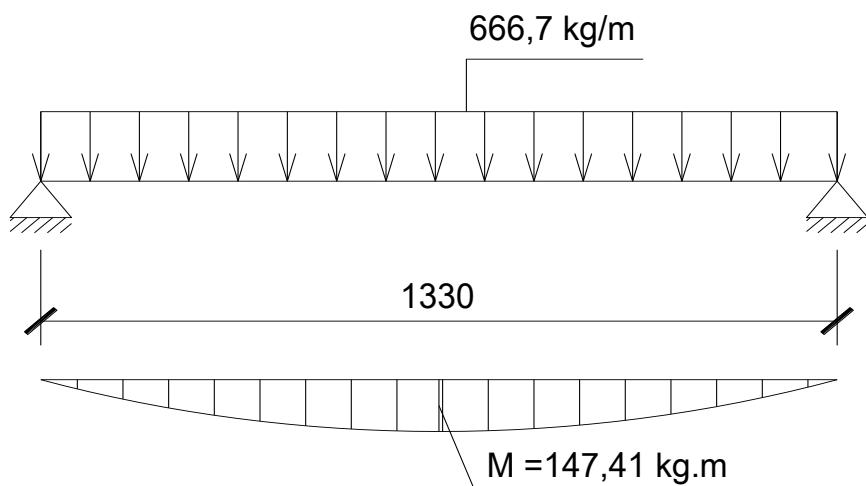

Tỷ số giữa cạnh dài và cạnh ngắn:  $\frac{l_2}{l_1} = \frac{3,04}{1,5} = 2,026 > 2$

→ Tính toán theo bản loại dầm.

### 5.2. Tải trọng tác dụng

- Tính tải:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

---

Vật liệu	$\delta$ (m)	$\gamma$ (kg/m <sup>3</sup> )	$g^{tc}$ (kg/m <sup>2</sup> )	n	$g^{tt}$ (kg/m <sup>2</sup> )
Đá lát	0,02	2000	40	1,1	44
Vữa lót	0,015	1800	27	1,3	35,1
Bản BTCT	0,07	2500	175	1,1	192,5
Vữa trát	0,015	1800	27	1,3	35,5
Tổng					306,7

-Hoạt tải

Theo TCVN 2737 - 95 có hoạt tải tác dụng lên bản chiếu nghỉ là:

$$P_{tc} = 300 \text{ kG/m}^2; n = 1,2;$$

$$P_{tt} = 1,2 \times 300 = 360 \text{ kG/m}^2$$

Tải trọng toàn phần tác dụng lên bản chiếu nghỉ là:

$$q = g + p = 306,7 + 360 = 666,7 \text{ kg/m}^2$$

Tính toán cho một đơn vị diện tích với diện tích chữ nhật chiều cao  $h_b = 10 \text{ cm}$ ; chiều rộng  $b = 100 \text{ cm}$

Nhịp tính toán:

$$\begin{aligned} l_0 &= l_l - (b_{thg} + b_{dcn})/2 + d_{s/2} \\ &= 1,5 - (0,22 + 0,22)/2 + 0,1/2 = 1,33 \text{ (m)} \end{aligned}$$

### 5.3.Tính toán nội lực và cốt thép :

Theo sơ đồ tính toán, cắt 1 dải bản rộng 1m song song với cạnh ngắn để tính toán. Mômen lớn nhất ở giữa nhịp:

$$M_{max} = \frac{q.l^2}{8} = \frac{666,7 \cdot 1,33^2}{8} = 147,41 \text{ kg.m} = 14741 \text{ kg.cm}$$

Chọn chiều dày lớp bêton bảo vệ:  $a_0 = 1,5$

$$\rightarrow h_0 = h - a_0 = 10 - 1,5 = 8,5 \text{ cm.}$$

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{14741}{85 \cdot 100 \cdot 8,5^2} = 0,024 < 0,439$$

$$\zeta = 0,5 \cdot (1 + \sqrt{1 - 2 \cdot \alpha_m}) = 0,988$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$A = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{14741}{2250 \cdot 0,988 \cdot 8,5} = 0,78 \text{ cm}^2$$

Chọn  $\phi 6$  s 200 có  $A_s = 1,41 \text{ (cm}^2\text{)}$


$$\mu_t = \frac{A}{b \cdot h_0} = \frac{1,41}{100 \cdot 8,5} = 0,165\%$$

Cốt thép âm và cốt thép dọc tại gối đặt theo cấu tạo  $\phi 6$  s200.

## 6.Tính toán dầm chiểu nghỉ:

### 6.1.Sơ đồ tính toán:

Sơ đồ tính toán là dầm đơn giản liên kết 2 đầu khớp .Dầm chịu lực phân bố do trọng l-ợng bản thân của dầm, tĩnh tải và hoạt tải của bản chiểu nghỉ truyền vào, chịu lực tập trung tại điểm giữa nhịp do cốn thang 2 bên truyền vào.

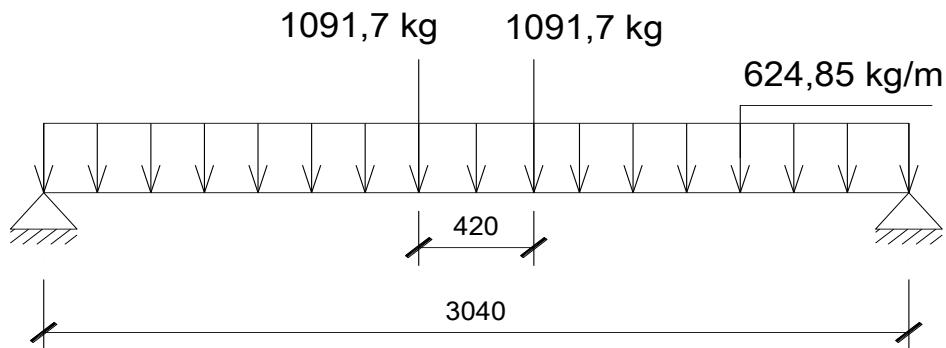

Nhịp tính toán của dầm:  $l_{tt} = 3,04 - 0,22 = 2,82 \text{ m}$ .

### 6.2.Tính toán tải trọng:

- Trọng l-ợng bản thân dầm (chọn tiết diện 220x300cm ):

$$g_{tt} = 1,1 \cdot 0,22 \cdot 0,3 \cdot 2500 = 181,5 \text{ (kG/m)}$$

-Tải trọng bản chiểu nghỉ truyền vào theo tải trọng phân bố đều ( $l_2/l_1 > 2$ ) với trị số :

$$q_1 = \frac{q \cdot l}{2} = \frac{666,7 \cdot 1,33}{2} = 443,35 \text{ kg/m}$$

- Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên dầm:

$$q = 181,5 + 443,35 = 624,85 \text{ kg/m}$$

- Tải trọng tập trung do cốn thang 2 bên truyền vào:

$$P_1 = Q_{max} = 1091,7 \text{ kG}$$

### 6.3.Xác định nội lực:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

- Mômen d- ơng lớn nhất (giữa nhịp) theo nguyên lý cộng tác dụng:

$$M = \frac{ql^2}{8} + P_1 \cdot a = \frac{624,85 \cdot 3,04^2}{8} + 1091,7 \cdot (\frac{3,04 - 0,42}{2}) = 3582 \text{ kg.m}$$

-Lực cắt tại gối:

$$Q = \frac{ql}{2} + P_1 = \frac{624,85 \cdot 3,04}{2} + 1091,7 = 2041,5 \text{ kg}$$

## 6.4. Tính toán cốt thép:

-Tính toán cốt dọc:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ là  $a_0 = 2\text{cm} \Rightarrow h_o = 28\text{ cm}$ .

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{358200}{85.22.28^2} = 0,2443 < 0,439$$

$$\zeta = 0,5 \cdot (1 + \sqrt{1 - 2 \cdot \alpha_m}) = 0,8575$$

$$A = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{358200}{2250 \cdot 0,8575 \cdot 28} = 6,63 \text{ cm}^2$$

Chọn 2φ22 có  $A_s = 7,6 \text{ cm}^2$

$$\mu_t = \frac{A}{b \cdot h_0} = \frac{7,6}{22,28} = 1,2\%$$

Cốt thép chịu mô men d- ơng: chọn 2φ22

Cốt thép chịu mô men âm đặt theo cấu tạo 2φ12

-Tính toán cốt đai:

Kiểm tra điều kiện phá hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:

$$Q \leq 0,3 \cdot \varphi_{w1} \cdot \varphi_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot h_o$$

Trong đó :

$\varphi_{w1}$ : Hệ số xét đến ảnh h- ống của cốt đai đặt vuông góc với trực cốt kiêm

$$\varphi_{w1} = 1 + 5 \cdot \alpha \cdot \mu_w$$

$$\alpha = \frac{E_s}{E_b} = \frac{210000}{30000} = 7$$

$$\mu_w = \frac{A_{sw}}{b \cdot s} = \frac{56,6}{200 \cdot 150} = 0,0019$$

Giả thiết cốt đai φ6a150  $\Rightarrow A_{sw} = 2.28,3 = 56,6 \text{ mm}^2$

$$\rightarrow \varphi_{n1} = 1 + 5 \cdot 7 \cdot 0,0019 = 1,0665 < 1,3$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\varphi_{b1} = 1 - \beta \cdot R_b = 1 - 0,01 \cdot 8,5 = 0,915$$

Mặt khác (với bê tông nặng  $\beta = 0,01$ )

Ta có:

$$Q = 2041,5 < 0,3 \cdot 1,06665 \cdot 0,915 \cdot 85 \cdot 22,28 = 153307 \text{ kg}$$

→ Bêtông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng.

Kiểm tra xem có phải tính toán cốt đai hay không:

Ta có :  $R_b = 8,5 \text{ Mpa}$  ;  $R_{bt} = 8,5 \text{ Mpa}$  ;  $R_{sw} = 225 \text{ Mpa}$  ;  $\phi_{b2} = 2$  ;

$\phi_{b3} = 0,6$  ;  $\phi_{b4} = 1,5$  ;  $\phi_n = 0$  ;  $\beta = 0,01$  ;

+ Điều kiện tính toán :

$$Q = 2041,5 < Q_{bo} = \frac{\Phi_{b4}(1 + \Phi_n) \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0^2}{C} = \frac{1,5 \cdot 85 \cdot 22,28^2}{130} = 169163 \text{ kg}$$

Không cần phải tính toán cốt đai, đặt cốt đai theo cấu tạo

Khoảng cách cốt đai đặt theo cấu tạo:

+ Ở gốc :

$$U_{ct} \leq \begin{cases} \frac{h}{2} = \frac{30}{2} = 15 \text{ (cm)} \\ \leq 15 \text{ (cm)} \end{cases} \Rightarrow$$

Tại gốc đặt đai  $\phi 6 s150$

+ Ở giữa nhịp :

$$U_{ct} \leq \begin{cases} \frac{3h}{4} = \frac{3 \cdot 30}{4} = 22,5 \text{ (cm)} \\ \leq 50 \text{ (cm)} \end{cases} \Rightarrow$$

Tại giữa nhịp đặt đai  $\phi 6 s200$

CH- ỐNG 6  
THIẾT KẾ MÓNG.

I. ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.

**1.Khảo sát địa chất.**

Dựa vào kết quả khảo sát địa chất kết hợp xuyên tinh (CPT) và xuyên tiêu chuẩn (SPT).

Đất nền khu vực xây dựng gồm 4 lớp có chiều dày hâu nh- không đổi:

-Lớp đất 1 :  $h_1 = 3,2$  m.

-Lớp đất 2 :  $h_2 = 6,9$  m.

-Lớp đất 3 :  $h_3 = 6,6$  m.

-Lớp đất 4 :  $h_4$  rất dày.

-Không gặp n- ớc ngầm trong phạm vi hố khoan.

**2.Các chỉ tiêu cơ lý của đất.**

2.1. Lớp 1.

Chiều dày  $h_1 = 3,2$  m.

$\gamma_{tn} = 1,86 \text{ T/m}^3$ ;  $\varphi = 10^0$ ;  $c = 0,09 \text{ kg/cm}^2$ ;  $q_c = 2 \text{ MPa}$ ;  $N = 8$ ;  $W = 27,9\%$ ;  $W_{nh} = 30,4\%$ ;  $W_d = 24,5\%$ ;  $\Delta = 2,68$ .

Hệ số rỗng tự nhiên :

$$e_0 = \frac{\Delta \gamma_n \cdot (1 + W)}{\gamma} - 1 = \frac{2,86 \cdot 1 \cdot (1 + 0,279)}{1,86} - 1 = 0,8428$$

Chỉ số dẻo :

$$A = W_{nh} - W_d = 30,4 - 24,5 = 5,9\% \Rightarrow \text{Lớp cát pha.}$$

Độ sét :

$$B = \frac{W - W_d}{A} = \frac{27,9 - 24,5}{5,9}$$

= 0,576  $\Rightarrow$  Trạng thái dẻo mềm.

Mô đun biến dạng :

$$E_0 = \alpha \cdot q_c$$

$q_c$  là sức xuyên kháng

$q_c = 2 \text{ MPa}$ ;  $\alpha = 4$  (cát pha dẻo mềm)

$$\Rightarrow E_0 = 2 \cdot 4 = 8 \text{ MPa} = 8000 \text{ KN/m}^2$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

## 2.2.Lớp 2

Chiều dày  $h_2 = 6.9\text{m}$ .

$\gamma_{tn} = 1,73\text{T/ m}^3$ ;  $q_c = 0,21 \text{ MPa}$ ;  $\varphi = 45^\circ$ ;  $c = 0,1 \text{ kg/cm}^2$ ;  $N = 1$ ;  $W = 36,5\%$ ;  $W_{nh} = 32,8\%$ ;  $W_d = 18,1\%$ ;  $\Delta = 2,69$ .

Hệ số rỗng tự nhiên :

$$e_0 = \frac{\Delta \gamma_n \cdot (1 + W)}{\gamma} - 1 = \frac{2,89 \cdot 1 \cdot (1 + 0,365)}{1,73} - 1 = 1,12$$

Chỉ số dẻo :

$$A = W_{nh} - W_d = 32,8 - 18,1 = 14,7\% \Rightarrow \text{Lớp sét pha.}$$

Độ sệt :

$$B = \frac{W - W_d}{A} = \frac{36,5 - 18,1}{14,7} = 1,254 \Rightarrow \text{Trạng thái nhão.}$$

Mô đun biến dạng :

$$E_0 = \alpha \cdot q_c$$

$q_c$  là sức xuyên kháng

$$q_c = 0,21 \text{ MPa}; \alpha = 5 \text{ (sét nhão)}$$

$$\Rightarrow E_0 = 0,21 \cdot 5 = 1,05 \text{ MPa} = 1050 \text{ KN/m}^2$$

## 2.3.Lớp 3.

Chiều dày  $h_3 = 6,6 \text{ m}$ .

Tỉ lệ % của các loại đường kính hạt(mm)							
1	0,5	0,25	0,1	0,05	0,01	0,002	<0,002
÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	
2	1	0,5	0,25	0,1	0,05	0,01	
5	10,5	30,5	30	12	10	2	0

Cỡ hạt  $d \geq 0,5 \text{ mm}$  chiếm 15.5%.

Cỡ hạt  $d \geq 0,25 \text{ mm}$  chiếm 46%.

Cỡ hạt  $d \geq 0,1 \text{ mm}$  chiếm 76%.

Cỡ hạt  $d > 0,15 \text{ mm}$  chiếm 75% → Lớp 3 là lớp cát nhỏ lẫn nhiều hạt thô.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Dung trọng tự nhiên :

$$\gamma = \frac{\Delta \gamma_n (1 + W)}{e_0 + 1} = \frac{2,64 \cdot 1 \cdot (1 + 0,168)}{0,65 + 1} = 1,868 \text{ T/m}^3$$

$\gamma_{tn} = 1,868 \text{ T/m}^3$ ;  $q_c = 8 \text{ MPa}$ ;  $\varphi = 33^\circ$ ;  $N = 1$ ;  $W = 16.8\%$ ;  $\Delta = 2,64$ ;  $e_0 = 0,65$ .

Mô đun biến dạng :

$$E_0 = \alpha \cdot q_c$$

$q_c$  là sức xuyên kháng

$q_c = 8 \text{ MPa}$ ;  $\alpha = 2$  (cát nhỏ pha hạt thô)

$$\Rightarrow E_0 = 8 \cdot 2 = 16 \text{ MPa} = 16000 \text{ KN/m}^2$$

## 2.4. Lớp 4.

Ch- a hết ở phạm vi lỗ khoan.

Tỉ lệ % của các loại đ- ờng kính hạt (mm)						
>10 ÷10	5	2÷5	1÷2	0,5÷1	0,25÷ 0,5	<0,25
2	8	28	35	17,5	6,5	3

Cỡ hạt  $d \geq 10 \text{ mm}$  chiếm 2%.

Cỡ hạt  $d \geq 2 \text{ mm}$  chiếm 38%.

Cỡ hạt  $d > 2 \text{ mm}$  chiếm 25%  $\Rightarrow$  Lớp 4 là lớp cát sỏi.

Mô đun biến dạng :

$$E_0 = \alpha \cdot q_c$$


$q_c$  là sức xuyên kháng

$q_c = 12 \text{ MPa}$ ;  $\alpha = 2$  (cát nhỏ pha hạt thô)

$$\Rightarrow E_0 = 12 \cdot 2 = 24 \text{ MPa} = 24000 \text{ KN/m}^2$$

Kết quả trục địa chất nh- sau:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

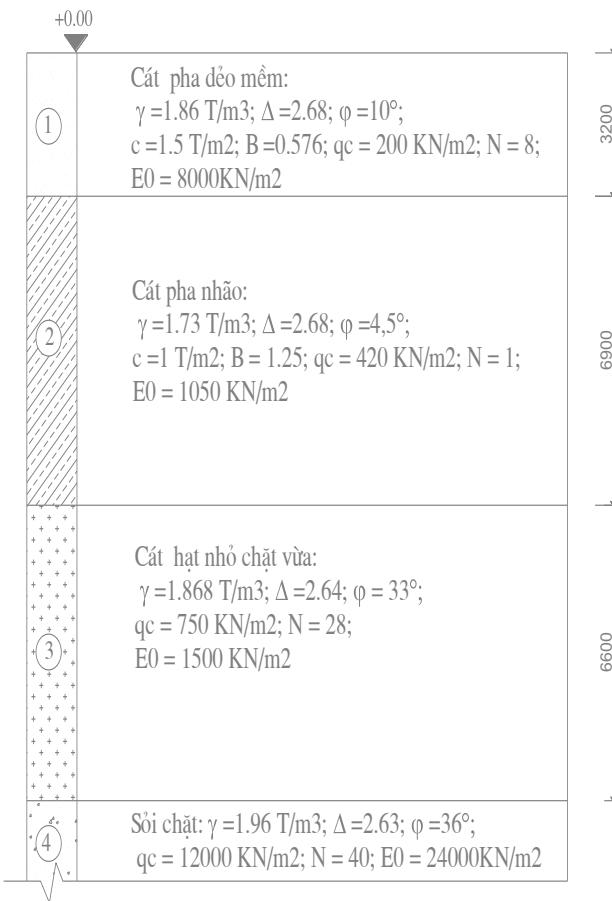

### 3.Đề suất ph- ơng án

- Công trình có tải trọng t- ơng đối lớn.
- Khu vực xây dựng trong thành phố ,bằng phẳng.
- Đất nền gồm 4 lớp.
- +Lớp 1: cát pha dẻo mềm bê dày là 3,2 m.
- +Lớp 2: sét pha nhão bê dày là 6,9 m.
- +Lớp 3: cát hạt nhỏ chật vừa bê dày là 6,6 m.
- +Lớp 4: sỏi chật , ch- a kết thúc trong phạm vi lỗ khoan.

N- ớc ngầm không suất hiện trong phạm vi khảo sát.

→Chọn giải pháp móng cọc đài thấp.

Căn cứ vào tải trọng ở chân cột và tình hình địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, đặc điểm khu vực xây dựng ta sử dụng ph- ơng án móng cọc ép bằng bê tông cốt thép để truyền tải trọng xuống lớp đất thứ t- .

### II.THIẾT KẾ MÓNG TRỰC 5

#### 1.Vật liệu sử dụng và ph- ơng pháp thi công.

##### 1.1.Cọc.

Cọc đúc sẵn hạ bằng ph- ơng pháp ép thuỷ lực.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Vật liệu làm cọc:

+Sử dụng cọc bê tông cốt thép tiết diện vuông  $30 \times 30$  cm.

+Bê tông làm cọc cấp độ bênh B20  $\Rightarrow R_b = 11,5$  MPa .

+Cốt thép dọc gồm  $4\phi 16$  AII  $\Rightarrow R_s = 280$  MPa.

+Chiều sâu hạ cọc dự kiến hạ vào lớp đất thứ t- là 0,5m.

+Chiều dài cọc:

$$L_c = 3,2 + 6,9 + 6,6 + 0,5 - 1,2 = 16 \text{ m}$$

Dùng 2 đoạn cọc 8 m nối với nhau bằng cách hàn các bản thép ở đầu cọc đảm bảo yêu cầu chịu lực nh- thiết kế.

+Phần cọc đ- ợc ngầm vào đài một đoạn 45 cm trong đó đập vỡ 35 cm cho trơ cốt thép dọc ra, còn lại 10 cm cọc để nguyên trong đài

## 1.2 Đài cọc.

+Sử dụng đài bê tông cốt thép với bê tông cấp độ bênh B25:  $R_b = 14,5$  MPa;  $R_{bt} = 1,05$  MPa;

+Cốt thép đài AII:  $R_s = 280$  MPa;

+Lớp lót đài: bê tông cấp độ bênh B12,5 dày 10 cm.

+Đài liên kết ngầm vào cột và cọc. Thép cọc liên kết vào đài  $\geq 20d$  (ở đây chọn 35cm).

## **2. Chiều sâu đáy đài $h_d$ .**

### 2.1.Nội lực tính toán.

Nội lực tính toán đ- ợc lựa chọn từ bảng tổ hợp nội lực với các cặp nguy hiểm nh- sau:

- Cho cột biên: A5

$$M = 210,87 \text{ KN.m}$$

$$N = 2361,2 \text{ KN}$$

$$Q = 75,77 \text{ KN}$$

- Cho cột giữa: B5

$$M = 172,92 \text{ KN.m}$$

$$N = 1738,49 \text{ KN}$$

$$Q = 67,31 \text{ KN}$$

- Cho cột biên: D5

$$M = 139,33 \text{ KN.m}$$

$$N = 1819,17 \text{ KN}$$

$$Q = 58,96 \text{ KN}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

## 2.2.Chọn sơ bộ kích th- ớc đài.

Sơ bộ chọn chiều cao đài  $H = 1,2$  m, kích th- ớc đài:

$$1 \times b = 2,1 \text{ m} \times 2,7 \text{ m.}$$

Chiều sâu đài phải đảm bảo điều kiện:

$$h_d \geq 0,7 \operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\varphi}{2}) \sqrt{\frac{\Sigma Q}{\gamma \cdot b}}$$

Trong đó:

$\varphi$  - góc nội ma sát của lớp đất chôn đài. Dự kiến đài chôn ở lớp đất thứ nhất

$$\varphi = 10^\circ$$

$\gamma$  - dung trọng tự nhiên của đất đặt đáy đài  $\gamma = 1,86 \text{ T/m}^3 = 18,6 \text{ KN/m}^3$ .

b- bề rộng đài chọn sơ bộ bằng 2,1m

$\Sigma Q$ - Tổng các lực ngang

$\Sigma Q = 75,77 \text{ KN}$  đối với cột biên 5A :

$$h_d \geq 0,7 \operatorname{tg}(45^\circ - \frac{10^\circ}{2}) \sqrt{\frac{75,77}{18,6 \cdot 2,1}} = 0,82 \text{ m}$$

$\Sigma Q = 67,31 \text{ KN}$  đối với cột giữa 5B :

$$h_d \geq 0,7 \operatorname{tg}(45^\circ - \frac{10^\circ}{2}) \sqrt{\frac{67,31}{18,6 \cdot 1,6}} = 0,88 \text{ m}$$

$\Sigma Q = 55,24 \text{ KN}$  đối với cột giữa 5D :

$$h_d \geq 0,7 \operatorname{tg}(45^\circ - \frac{10^\circ}{2}) \sqrt{\frac{55,24}{18,6 \cdot 1,6}} = 0,826 \text{ m}$$

Chọn cốt đáy đài ở độ sâu 1,2 m,  $h_d = 0,9 \text{ m}$  lớn hơn  $h_{\min} = 0,82 \text{ m}$  ở móng biên 5A;  $h_{\min} = 0,88 \text{ m}$  ở móng giữa 5B và  $h_{\min} = 0,826 \text{ m}$  ở móng biên 5D.

## **3.Xác định sức chịu tải của cọc.**

### 3.1. Xác định sức chịu tải của cọc theo c- ờng độ vật liệu làm cọc.

$$P_{VL} = m \cdot \varphi \cdot (A_b \cdot R_b + A_s \cdot R_s)$$

Trong đó:

m: hệ số điề kiện làm việc phụ thuộc loại cọc và số l- ợng cọc. Chọn  $m=1$

$\varphi$  : hệ số uốn dọc .Chọn  $\varphi = 1$

$A_s$ : diện tích cốt thép  $4\phi 16$

$$A_s = 2 \cdot 4,02 = 8,04 \text{ cm}^2$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$A_b$ : diện tích phân bê tông

$$A_b = A_c - A_s = 0,3 \cdot 0,3 - 8,04 \cdot 10^{-4} = 891 \cdot 10^{-4} m^2.$$

$$P_{VL} = 1.1.( 11,5 \cdot 10^3 \cdot 891 \cdot 10^{-4} + 280 \cdot 10^3 \cdot 8,04 \cdot 10^{-4} ) \\ = 1249,77 KN$$

## 3.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo tính chất cơ lý của đất nền.

Xác định sức chịu tải của cọc theo phong pháp thống kê

Sức chịu tải của cọc theo đất nền xác định theo công thức

$$P_d = m ( \alpha_1 \cdot u \sum_{i=1}^n \bar{\tau}_i \cdot l_i + \alpha_2 \cdot F \cdot \bar{R}_i )$$

m: hệ số điều kiện làm việc .Đối với cọc ép m = 1

$\alpha_1$ ;  $\alpha_2$ : hệ số điều kiện làm việc của cọc vuông hạ bằng ép.

Tra bảng 3-20 TCN 21-86 :

Lớp 1:  $\alpha_1 = 0,9$ ;  $\alpha_2 = 0,9$ .

Lớp 1:  $\alpha_1 = 0,9$ ;  $\alpha_2 = 0,7$ .

Lớp 1:  $\alpha_1 = 1$ ;  $\alpha_2 = 1,1$ .

u : chu vi tiết diện ngang cọc  $u = (0,3+0,3) \cdot 2 = 1,2 m$

F : diện tích tiết diện ngang cọc  $F = 0,3 \cdot 0,3 = 0,09 m^2$


R : sức kháng ở mũi cọc. Với  $H = 17,2 m$ , mũi cọc ở lớp sỏi chật vừa.

Tra bảng 1-20 TCN 21-86 có:  $R = 12096 KPa = 12096 KN/m^2$

Chia đất dưới để đài thành các lớp đất phân tố đồng nhất nhì hình vẽ (chiều dày mỗi lớp  $\leq 2m$ ).

Cường độ tính toán của ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất xung quanh  $\bar{\tau}_i$  tra theo bảng phụ lục 6.3 h-ống dẫn ĐA Nền và Móng, theo nội suy ta có:

Lớp đất	Loại đất	Z <sub>i</sub> (m)	L <sub>i</sub> (m)	$\tau_i(KN/m^2)$
1	Cát pha dẻo, B=0,576	2,2	2	13,648
2	Sét nhão, B=1,25	Bỏ qua		
3	Cát nhỏ lân nhiều hạt to, trạng thái chặt vừa	11,1	2	66,54
		13,1	2	69,34
		15,1	2	72,14
		16,4	0,6	73,96
		16,95	0,6	74,73

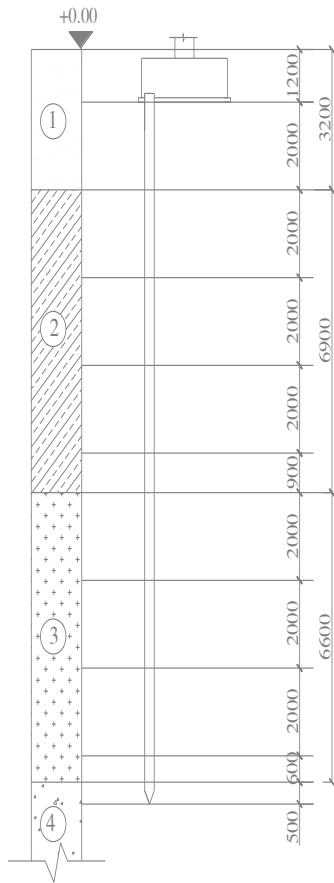

$$\begin{aligned}
 P_{dn} &= 0,9 \cdot 1,2 \cdot 13,648,2 + 0,9 \cdot 0,09 \cdot 12096 \\
 &+ 1,1 \cdot 2,66 \cdot 54,2 + 1,1 \cdot 0,09 \cdot 12096 \\
 &+ 1,1 \cdot 2,69 \cdot 34,2 + 1,1 \cdot 0,09 \cdot 12096 \\
 &+ 1,1 \cdot 2,72 \cdot 14,2 + 1,1 \cdot 0,09 \cdot 12096 \\
 &+ 1,1 \cdot 2,73 \cdot 96,2 + 1,1 \cdot 0,09 \cdot 12096 \\
 &+ 1,1 \cdot 2,74 \cdot 73,2 + 1,1 \cdot 0,09 \cdot 12096 \\
 P_{dn} &= 7767,207 \text{ KN}
 \end{aligned}$$

### 3.3. Xác định sức chịu tải của cọc theo thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT).

$$P_{dn} = \frac{P_{gh}}{F_s} = \frac{Q_c}{2 \div 3} + \frac{Q_s}{1,5 \div 2} = \frac{Q_c}{2 \div 3} + \frac{Q_s}{2} \quad (\text{Theo 20 TCN 112-89})$$

Trong đó:

$Q_c$ : khả năng chịu tải của mũi cọc (Sức cản phá hoại của đất ở mũi cọc).

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$Q_c = k_c \cdot F_c \cdot q_c$$

$K_c$ : hệ số phụ thuộc nền đất, loại cọc  $K_c = 0,5$  ( bảng 4-20 TCN 21-86).

$$Q_c = 0,5 \cdot 0,3^2 \cdot 12000 = 540 \text{ KN}$$

$Q_s$ : Sức kháng ma sát của đất ở mặt bên cọc.

$$Q_s = u \cdot \sum_{i=1}^4 \frac{q_{ci}}{\alpha_i} \cdot h_i$$

$u$  : chu vi cọc.

$q_{ci}$  :sức cản mũi xuyên ở lớp đất thứ i.

$\alpha_i$  :hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc

Lớp 1: cát pha dẻo  $\rightarrow \alpha_1 = 40$

$$q_c = 2000 \text{ KN/m}^2; h_1 = 2 \text{ m};$$

Lớp 2: bùn qua.

Lớp 3: cát nhỏ lân hạt to  $\rightarrow \alpha_3 = 100$

$$q_c = 2000 \text{ KN/m}^2; h_1 = 2 \text{ m};$$

$$Q_s = 1,2 \cdot \left( \frac{2000 \cdot 2}{40} + \frac{8000 \cdot 6,6}{100} \right) = 753,6 \text{ KN}$$

$$P_d = \frac{540}{2,5} + \frac{753,6}{2} = 592,8 \text{ KN}$$

## 3.4.Xác định sức chịu tải của cọc theo thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

$$P_{dn}' = \frac{Q_c + Q_s}{4}$$

$Q_c = k_2 N_{tb}^P \cdot F_c$ : sức kháng phá hoại của đất ở mũi cọc.

$N_{tb}^P$ : số SPT trung bình trong đoạn 4d trên mũi cọc và 1d dưới mũi cọc.

$$N_{tb}^P = 40; k_2 = 400$$

$$Q_c = 400 \cdot 40 \cdot 0,09 = 1440 \text{ KN}$$

$Q_s$ : Sức kháng ma sát của đất ở mặt bên cọc.

$$Q_s = k_1 \cdot \sum_{i=1}^n u \cdot N_i \cdot l_i$$

$$K_1 = 2; u = 1.2 \text{ m};$$

$$Q_s = 2 \cdot 1,2 \cdot (8,3,2 + 22,6,6 + 40,0,5) = 457,92 \text{ KN}$$

$$P_{dn}' = \frac{1446 + 457,92}{4} = 474,48 \text{ KN}$$

Vậy sức chịu tải của cọc là:

$$\begin{aligned} [P_c] &= \min \{ P_{dn}, P_d', P_d, P_{VL} \} \\ &= P_d' = 474,48 \text{ KN} \end{aligned}$$

#### **4. Xác định số l-ợng cọc và bố trí cọc trong đài.**

##### 4.1. Xác định số l-ợng cọc.

Ta xác định áp lực tính toán tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra:

$$P_{tt} = \frac{P_d}{(3d)^2} = \frac{474,48}{(3.0.3)^2} = 585,77 \text{ KN/m}^2$$

Diện tích sơ bộ của đáy đài A-5:

$$F_d = \frac{N_0^{tt}}{P_{tt} - \gamma_{tb} h_d n} = \frac{2361,2}{585,77 - 20.1,2.1,1} = 4,24 \text{ m}^2$$

Diện tích sơ bộ của đáy đài 5B:

$$F_d = \frac{N_0^{tt}}{P_{tt} - \gamma_{tb} h_d n} = \frac{1738,49}{585,77 - 20.1,2.1,1} = 3,12 \text{ m}^2$$

Diện tích sơ bộ của đáy đài 5D:

$$F_d = \frac{N_0^{tt}}{P_{tt} - \gamma_{tb} h_d n} = \frac{1819,17}{585,77 - 20.1,2.1,1} = 3,25 \text{ m}^2$$

Số l-ợng cọc xác định bằng:

$$n = \beta \cdot \frac{N^{tt}}{[P_c]} \text{ với } \beta = 1,2$$

Trọng l-ợng của đài và đất đắp trên đài A-5:

$$N_{tt,d}^{tt} = n \cdot F_d \cdot h \cdot \gamma_{tb} = 1,1 \cdot 4,24 \cdot 1,2 \cdot 20 = 111,936 \text{ KN}$$

Trọng l-ợng của đài và đất đắp trên đài 5B:

$$N_{tt,d}^{tt} = n \cdot F_d \cdot h \cdot \gamma_{tb} = 1,1 \cdot 3,12 \cdot 1,2 \cdot 20 = 82,368 \text{ KN}$$

Trọng l-ợng của đài và đất đắp trên đài D-5:

$$N_{tt,d}^{tt} = n \cdot F_d \cdot h \cdot \gamma_{tb} = 1,1 \cdot 3,25 \cdot 1,2 \cdot 20 = 85,8 \text{ KN}$$

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài A-5:

$$N^{tt} = N_0^{tt} + N_{tt,d}^{tt} = 2361,2 + 111,936 = 2473,136 \text{ KN}$$

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài 5B:

$$N^{tt} = N_0^{tt} + N_{tt,d}^{tt} = 1738,49 + 82,368 = 1821,32 \text{ KN}$$

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài D-5:

$$N^{tt} = N_0^{tt} + N_{tt,d}^{tt} = 1819,17 + 85,8 = 1904,97 \text{ KN}$$

Số l-ợng cọc sơ bộ cho móng A-5 cột trực biên:

$$n_c = \beta \cdot \frac{N^{tt}}{[P_c]} = 1,2 \cdot \frac{2473,136}{474,48} = 6,25 \text{ cọc} \rightarrow \text{Lấy số l-ợng cọc } n_c = 8 \text{ cọc}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Số 1- ợng cọc sơ bộ cho móng B-5 cột trục giữa:

$$n_c = \beta \cdot \frac{N^t}{[P_c]} = 1,2 \cdot \frac{1821,32}{474,48} = 4,67 \text{ cọc} \rightarrow \text{Lấy số 1- ợng cọc } n_c = 6 \text{ cọc.}$$


Số 1- ợng cọc sơ bộ cho móng D-5 cột trục giữa:

$$n_c = \beta \cdot \frac{N^t}{[P_c]} = 1,2 \cdot \frac{1904,97}{474,48} = 4,82 \text{ cọc} \Rightarrow \text{Lấy số 1- ợng cọc } n_c = 6 \text{ cọc.}$$


## 4.2.Bố trí coc trên mặt bằng.

Cọc đ- ợc bố trí nh- hình vẽ:

+Mặt bằng bố trí coc móng A-5.

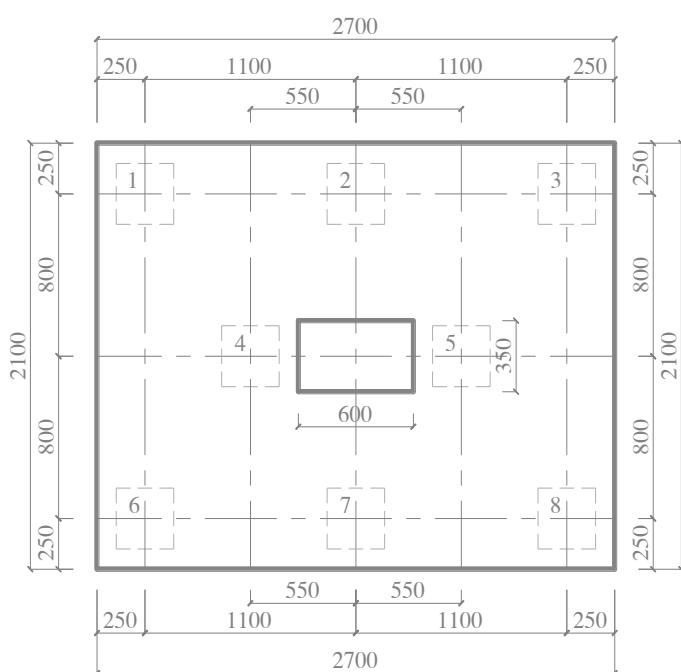

+Mặt bằng bố trí coc móng B-5 và D-5.

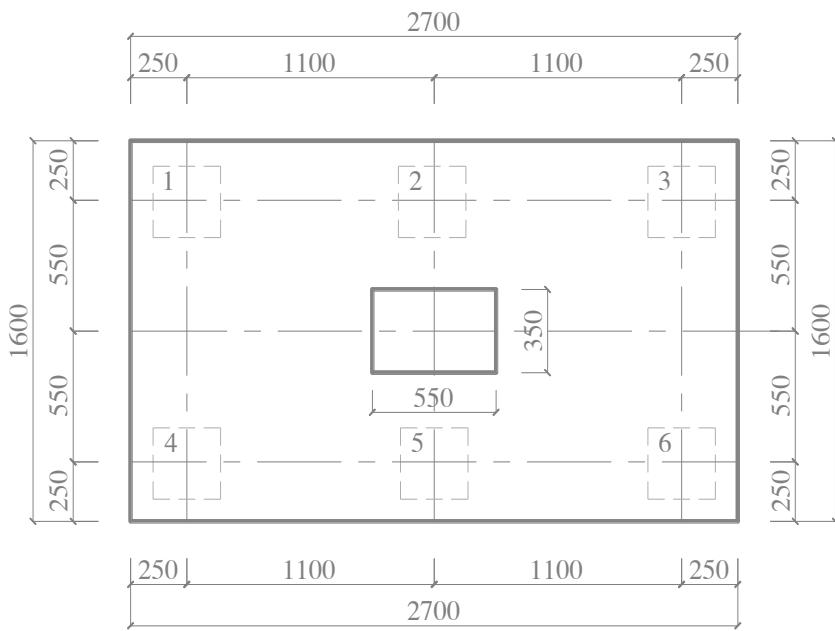

## 5. Tải trọng phân phối lên cọc.

### 5.1. Đài A-5.

Chọn diện tích đài A5 là:  $b \times l = 2,1 \times 2,7 = 5,67 \text{ m}^2$

Trọng lượng của đài và đất đắp trên đài:

$$N_{\text{đ}}^{\text{t}} = n \cdot F_{\text{đ}} \cdot h \cdot \gamma_{\text{tb}} = 1,1 \cdot 5,67 \cdot 1,2 \cdot 20 = 149,688 \text{ KN}$$

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài:

$$N^{\text{t}} = N_0^{\text{t}} + N_{\text{đ}}^{\text{t}} = 2361,2 + 149,688 = 2510,88 \text{ KN}$$

Mô men tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại đế đài:

$$M^{\text{t}} = M_0^{\text{t}} + Q^{\text{t}} \cdot h$$

$$M^{\text{t}} = 210,87 + 75,77 \cdot 1,2 = 301,794 \text{ KN.m}$$

Lực cắt tính toán:

$$Q^{\text{t}} = 75,77 \text{ KN}$$

Trị tiêu chuẩn của các tải trọng này:

$$M^{\text{tc}} = \frac{M^{\text{t}}}{1,2} = \frac{301,794}{1,2} = 251,495 \text{ KN.m}$$

$$N^{\text{tc}} = \frac{N^{\text{t}}}{1,2} = \frac{2510,88}{1,2} = 2092,4 \text{ KN}$$

$$Q^{\text{tc}} = \frac{Q^{\text{t}}}{1,2} = \frac{75,77}{1,2} = 63,14 \text{ KN}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

---

Lực truyền xuống các cọc :

$$P_i^t = \frac{N^t}{n_c} \pm \frac{M_y^t \cdot X_i}{\sum X_i^2}$$

Cọc	$x_i(m)$	$y_i(m)$	$x_i^2$	$y_i^2$	$P_i(KN)$
1	-1,1	0,8	1,21	0,64	255.044
2	0	0,8	0	0,64	316.013
3	1,1	0,8	1,21	0,64	376.981
4	-0,55	0	0,303	0	285.528
5	0,55	0	0,303	0	346.496
6	-1,1	-0,8	0	0,64	255.044
7	0	-0,8	1,21	0,64	316.013
8	1,1	-0,8	1,21	0,64	376.981

$$P_{\max}^t = 376,981 \text{ KN}$$

$$P_{\min}^t = 255.044 \text{ KN}$$

$P_{\max}^t < [P] = 474.48 \text{ KN}$  thoả mãn điều kiện lực max truyền xuống cọc dãy  
cọc biên.

$P_{\min}^t > 0$  nên không phải kiểm tra theo điều kiện chống nhổ.

## 5.2.Đài B-5.

Chọn diện tích đài B5 là:  $b \times l = 1,6 \times 2,7 = 4.32 \text{ m}^2$

Trọng l- ợng của đài và đất đắp trên đài:

$$N_d^t = n \cdot F_d \cdot h \cdot \gamma_{tb} = 1,1 \cdot 4,32 \cdot 1,2 \cdot 20 = 114,048 \text{ KN}$$

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài:

$$N^t = N_0^t + N_d^t = 1738,49 + 114,048 = 1852,538 \text{ KN}$$

Mô men tính toán xác định t- ợng ứng với trọng tâm diện tích tiếp diện các cọc tại đế đài:

$$M^t = M_0^t + Q^t \cdot h$$

$$M^t = 172,98 + 67,31 \cdot 1,2 = 253,752 \text{ KN.m}$$

Lực cắt tính toán:

$$Q^t = 67,31 \text{ KN}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

---

Trị tiêu chuẩn của các tải trọng này:

$$M^{tc} = \frac{M^{tt}}{1,2} = \frac{253,752}{1,2} = 211,46 \text{ KN.m}$$

$$N^{tc} = \frac{N^{tt}}{1,2} = \frac{1852,538}{1,2} = 1543,78 \text{ KN}$$

$$Q^{tc} = \frac{Q^{tt}}{1,2} = \frac{67,31}{1,2} = 56,09 \text{ KN}$$

Lực truyền xuống các cọc :

$$P_i^{tt} = \frac{N^{tt}}{n_c} \pm \frac{M_y^{tt} \cdot X_i}{\sum X_i^2}$$

Cọc	$x_i(\text{m})$	$y_i(\text{m})$	$x_i^2$	$y_i^2$	$P_i(\text{KN})$
1	-1.1	1.1	1.21	1.21	173.89
2	0	1.1	0	1.21	231.56
3	1.1	1.1	1.21	1.21	289.24
4	-1.1	-1.1	1.21	1.21	173.89
5	0	-1.1	0	1.21	231.56
6	1.1	-1.1	1.21	1.21	289.24

$$P_{\max}^{tt} = 289,24 \text{ KN}$$

$$P_{\min}^{tt} = 173,89 \text{ KN}$$

$P_{\max}^{tt} < [P] = 474.48 \text{ KN}$  thoả mãn điều kiện lực max truyền xuống cọc dãy  
cọc biên.

$P_{\min}^{tt} > 0$  nên không phải kiểm tra theo điều kiện chống nhổ.

## 5.2.Đài D-5.

Chọn diện tích đài 5D là:  $b \times l = 1,6 \times 2,7 = 4.32 \text{ m}^2$

Trọng l- ợng của đài và đất đắp trên đài:

$$N_d^{tt} = n \cdot F_d \cdot h \cdot \gamma_{tb} = 1,1 \cdot 4,32 \cdot 1,2 \cdot 20 = 114,048 \text{ KN}$$

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài:

$$N_t = N_0^{tt} + N_d^{tt} = 1819,17 + 114,048 = 1933,22 \text{ KN}$$

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Mô men tính toán xác định t-ống ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại đế dài:

$$M^{tt} = M_0^{tt} + Q^{tt} \cdot h$$

$$M^{tt} = 139,33 + 58,96 \cdot 1,2 = 210,08 \text{ KN.m}$$

Lực cắt tính toán:

$$Q^{tt} = 58,96 \text{ KN}$$

Trị tiêu chuẩn của các tải trọng này:

$$M^{tc} = \frac{M^{tt}}{1,2} = \frac{210,08}{1,2} = 175,07 \text{ KN.m}$$

$$N^{tc} = \frac{N^{tt}}{1,2} = \frac{1933,22}{1,2} = 1611,01 \text{ KN}$$

$$Q^{tc} = \frac{Q^{tt}}{1,2} = \frac{58,96}{1,2} = 49,13 \text{ KN}$$

Lực truyền xuống các cọc :

$$P_i^{tt} = \frac{N^{tt}}{n_c} \pm \frac{M_y^{tt} \cdot X_i}{\sum X_i^2}$$

Coc	x <sub>i</sub> (m)	y <sub>i</sub> (m)	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	y <sub>i</sub> <sup>2</sup>	P <sub>i</sub> (KN)
1	-1,1	1,1	1.21	1.21	274,458
2	0	1,1	0	1.21	322,20
3	1,1	1,1	1.21	1.21	369,95
4	-1,1	-1,1	1.21	1.21	274,458
5	0	-1,1	0	1.21	322,20
6	1,1	-1,1	1.21	1.21	369,95

$$P_{max}^{tt} = 369,95 \text{ KN}$$

$$P_{min}^{tt} = 274,458 \text{ KN}$$

P<sub>max</sub><sup>tt</sup> < [P] = 474,48 KN thoả mãn điều kiện lực max truyền xuống cọc dãy

cọc biên.

P<sub>min</sub><sup>tt</sup> > 0 nên không phải kiểm tra theo điều kiện chống nhổ

### 6. Kiểm tra sự làm việc của công trình, móng cọc và nền.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

(Tính đại diện móng A5)

## 6.1.Kiểm tra c- ờng độ của nền đất.

-Điều kiện kiểm tra

$$\sigma_{tb}^{tc} \leq R_m$$

$$\sigma_{max}^{tc} \leq 1,2.R_m$$

-Kích th- ớc móng khối quy - ớc:

+Chiều cao móng khối quy - ớc tính từ mặt đất xuống mũi cọc  $H_{qc} = 17,2$  m

+Góc mở:

Với:

$$\varphi_{tb} = \frac{\varphi_1.h_1 + \varphi_2.h_2 + \varphi_3.h_3 + \varphi_4.h_4}{h_1 + h_2 + h_3 + h_4} = \frac{10^0.3,2 + 4,5^0.6,9 + 33^0.6,6 + 36^0.0,5}{17,2} = 17,4^0$$

+Chiều dài của đáy khối quy - ớc:

$$L_{qc} = 2,7 - (2.0,1) + 2. 16 \operatorname{tg}(\varphi_{tb} / 4)$$

$$L_{qc} = 2,5 + 2. 16. \operatorname{tg}(17,4^0 / 4)$$

$$L_{qc} = 4,934 \text{ m}$$

+Chiều rộng của đáy khối quy - ớc

$$B_{qc} = 2,1 - (2.0,1) + 2. 16 \operatorname{tg}(\varphi_{tb} / 4)$$

$$B_{qc} = 1,9 + 2. 16. \operatorname{tg}(17,4^0 / 4)$$

$$B_{qc} = 4,334 \text{ m}$$

-Trọng l- ợng móng khối quy - ớc:

+Trong phạm vi từ đế dài trở lên có thể xác định theo công thức:

$$N_1^{tc} = L \times B \cdot h \cdot \gamma_{tb} = 2,7.2.1,1.2.20 = 136,08 \text{ KN}$$

+Trọng l- ợng đất trong phạm vi từ đáy dài đến hết lớp 1 (trừ đi thể tích cọc chiếm chỗ)

$$N_2^{tc} = (4,934.4,334 - 0,09.8).2.18.6 = 768,699 \text{ KN}$$

+Trọng l- ợng đất trong phạm vi đầu lớp 2 đến hết lớp 2 (trừ đi thể tích cọc chiếm chỗ)

$$N_3^{tc} = (4,934.4,334 - 0,09.8).6,9.17,3 = 2466,656 \text{ KN}$$

+Trọng l- ợng đất trong phạm vi từ đầu lớp 3 đến hết lớp 3 (trừ đi thể tích cọc chiếm chỗ)

$$N_4^{tc} = (4,934.4,334 - 0,09.8).6,6.18,68 = 2547,62 \text{ KN}$$

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+Trọng l- ợng đất trong phạm vi lớp 4 một đoạn 0,5m (trừ đi thể tích cọc chiếm chỗ)

$$N_5^{tc} = (4,934.4,334 - 0,09.8).0,5.19,6 = 202,5 \text{ KN}$$

+Trọng l- ợng cọc trong móng khối quy - óc

$$N_6^{tc} = 8.0.09.16.25 = 288 \text{ KN}$$

+Trọng l- ợng móng khối qui - óc;

$$N_{q-}^{tc} = 151,729 + 768,699 + 2466,656 + 2547,62 + 202,5 + 288 = 6409,56 \text{ KN}$$

Trị tiêu chuẩn của lực dọc ở đáy móng khối quy - óc:

$$N^{tc} = N_0^{tc} + N_{q-}^{tc} = 2106,75 + 6409,56 = 8516,31 \text{ KN}$$

Mô men tiêu chuẩn t- ợng ứng trọng tâm đáy khối quy - óc:

$$M^{tc} = M_0^{tc} + Q^{tc}.17,2 = 251,495 + 63,14 .17,2 = 1337,5 \text{ KN.m}$$

$$\text{Độ lệch tâm: } e = \frac{M^{tc}}{N^{tc}} = \frac{1337,5}{8516,31} = 0,1567 \text{ m}$$

-áp lực tiêu chuẩn ở đáy móng khối quy - óc:

$$\sigma_{\max}^{tc} = \frac{N^{tc}}{L_{qu} \cdot B_{qu}} (1 \pm \frac{6e}{L_{qu}}) = \frac{8531,96}{4,934.4,334} (1 \pm \frac{6.0,1567}{4,934})$$

$$\sigma_{\max}^{tc} = 475,018 \text{ KN/m}^2$$

$$\sigma_{\min}^{tc} = 322,959 \text{ KN/m}^2$$

$$\sigma_{tb}^{tb} = 398,988 \text{ KN/m}^2$$

-C- ờng độ đất nền ở đáy móng khối quy - óc:

$$R_m = \frac{m_1 m_2}{k_{tc}} (AB_{qu} \gamma_{II} + BH_m \gamma'_{II} + D.C_{II})$$

$k_{tc} = 1$  vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy bằng thí nghiệm trực tiếp đối với đất

Lớp 4 có  $\phi = 36^0$  tra bảng 2.1 sách Nền và Móng-Gs.Ts Nguyễn Văn Quảng, Nhà xuất bản Xây dựng có các hệ số:

$$A = 1,81 ; B = 8,25 ; D = 9,98;$$

Tra bảng 2.2 sách Nền và Móng-Gs.Ts Nguyễn Văn Quảng, Nhà xuất bản Xây dựng có các hệ số:  $m_1=1,2$ ;  $m_2=1,2$ ;

$$\gamma_{II} = \frac{2.18,6 + 6,9.17,3 + 6,6.18,68 + 0,5.19,6}{2 + 6,9 + 6,6 + 0,5} = 18,1 \text{ KN/m}^3$$

$$R_m = \frac{1,2.1,2}{1} (1,81.4,334.18,1 + 8,25.17,2.18,6 + 9,98.0)$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$R_m = 4005,1 \text{ KN/m}^2$$

$$\text{Điều kiện: } \sigma_{tb}^{tc} = 322,959 \text{ KN/m}^2 < 4005,1 \text{ KN/m}^2 = R_m$$

$$\sigma_{max}^{tc} = 475,018 \text{ KN/m}^2 < 1,2 R_m = 4806,13 \text{ KN/m}^2$$

Vậy nền đất đảm bảo điều kiện c-ờng độ.

## 6.2.Kiểm tra độ lún của móng cọc:

$$\text{Điều kiện: } S_{qc} \leq S_{gh} = 8 \text{ cm}$$

Tính toán độ nún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. Tr-ờng hợp này nền đất từ chân cọc trở xuống có chiều dày lớn, đáy của móng khối quy - ớc có diện tích nhỏ nên ta dùng mô hình nền là nửa không gian biến dạng tuyến tính để tính toán:

Ứng suất bản thân tại đáy đài:

$$\sigma_{z=1.2}^{bt} = 1,2 \cdot 18,6 = 22,32 \text{ KN/m}^2$$

Tại đáy lớp 1:

$$\sigma_{z=3.2}^{bt} = 3,2 \cdot 18,6 = 59,52 \text{ KN/m}^2$$

Tại đáy lớp 2:

$$\sigma_{z=3.2+6.9}^{bt} = 59,52 + 6,9 \cdot 17,3 = 178,89 \text{ KN/m}^2$$

Tại đáy lớp 3:

$$\sigma_{z=3.2+6.9+6.6}^{bt} = 178,89 + 6,6 \cdot 18,68 = 302,178 \text{ KN/m}^2$$

Tại đoạn 0,5m trong lớp 4 (đáy móng khối quy - ớc):

$$\sigma_{z=3.2+6.9+6.6+0.5}^{bt} = 302,178 + 0,5 \cdot 19,6 = 311,978 \text{ KN/m}^2$$

Ứng suất gây nún ở đáy móng khối quy - ớc

$$\begin{aligned} \sigma_{z=17.2}^{gl} &= \sigma_{tb}^{tc} - \sigma_{z=17.2}^{bt} \\ &= 398,988 - 311,978 = 87,01 \text{ KN/m}^2 \end{aligned}$$

Chia đất nền d-ới móng khối quy - ớc thành các lớp bằng nhau, bằng

$$\frac{B_{qu}}{5} = \frac{4,334}{5} = 0,867 \text{ m}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

Điểm	z(m)	$\frac{2z}{B_{qu}}$	K <sub>0</sub>	$\sigma_{zi}^{gl} = \sigma_{z=0}^{gl} K_0$ (Kpa)	$\sigma^{bt}$ (Kpa)
0	0	0	1,0000	87,01	311.978
1	0,867	0,4000	0,9655	84,008	
2	1,734	0,8000	0,8207	71,409	
3	2,601	1,2002	0,6377	55,486	
4	3,468	1,6004	0,4814	41,886	379,95
5	4,335	2,0004	0,3656	31,81	396,94
6	5,202	2,4006	0,2825	24,58	413,93
7	6,07	2,8006	0,2223	19,342	430,93

Giới hạn nền lấy đến điểm 6 có  $Z_a = 5,202$  m ( kể từ đáy móng quy - óc)

$$S = \sum_{i=1}^6 \frac{0,8}{E_i} \sigma_{zi}^{gl} \cdot h_i = \frac{0,8 \cdot 0,867}{11000} [4,008 + 71,409 + 55,486 + 41,886 + 31,81 + 24,58]$$

$$S = 0,019 \text{ m} = 1,9 \text{ cm} < 8 \text{ cm}$$

Vậy móng thoả mãn điều kiện biến dạng.

## 7.Tính toán và kiểm tra độ bền của móng cọc.

### 7.1 Độ bền của cọc khi vận chuyển và cẩu hạ cọc.

-Khi vận chuyển cọc tải trọng phân bố:

$$q = \gamma \cdot F \cdot n$$

Trong đó: n: hệ số kể đến tác dụng động của tải trọng, n = 1,5

$$q = 25,0,3,0,3,1,5 = 3,375 \text{ KN/m}$$


$$\text{Chọn } a = 0,207 \cdot L = 0,207 \cdot 8 = 1,656 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } M_{\max} \approx M_{\min} &= \frac{qa^2}{2} = \frac{3,375 \cdot 1,656^2}{2} \\ &= 4,6276 \text{ KN.m} \end{aligned}$$


-Sơ đồ tính khi vận chuyển:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

---

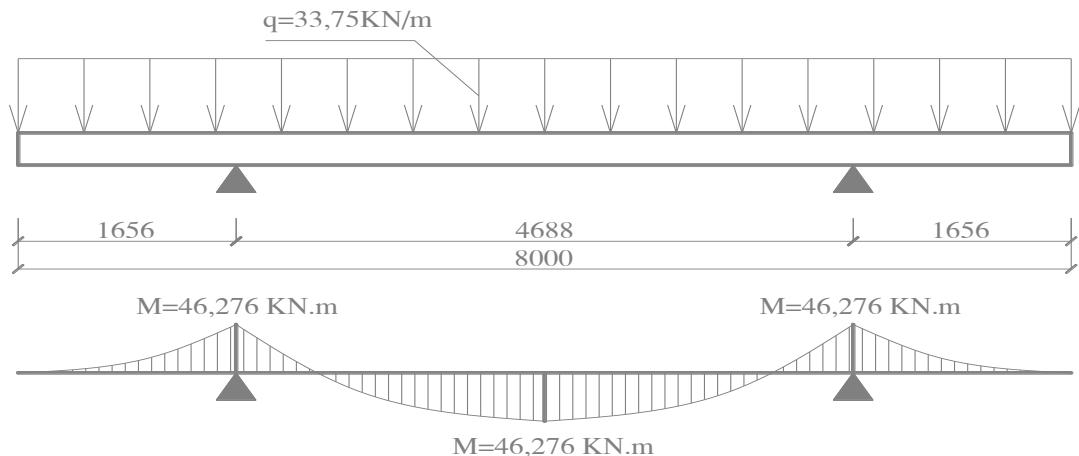

-Sơ đồ tính khi cầu hạ:

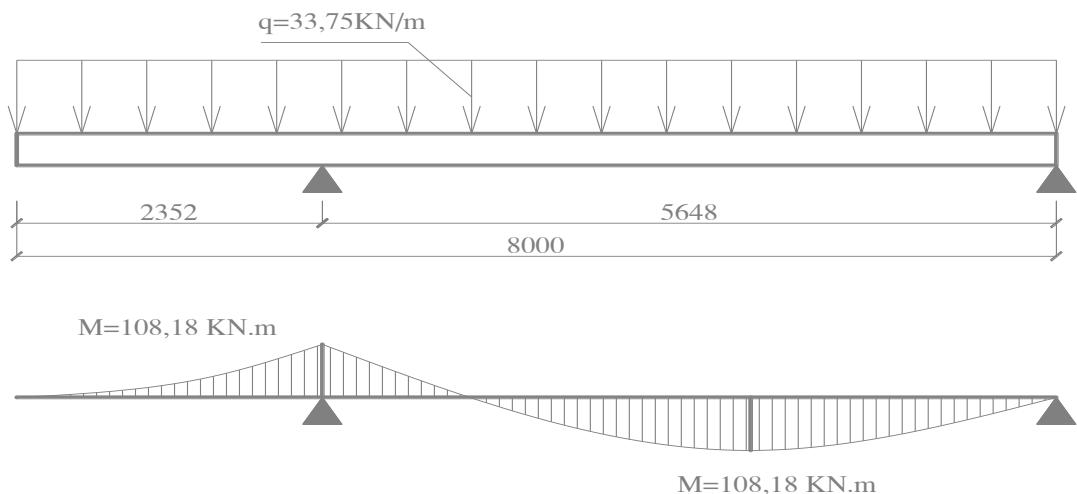

$$\text{Chọn } b = 0,294 \cdot L = 0,294 \cdot 8 = 2,352 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } M_{\max} &\approx M_{\min} = \frac{qb^2}{2} = \frac{3,375 \cdot 2,532^2}{2} \\ &= 10,818 \text{ KN.m} \end{aligned}$$

$$\text{Chọn lớp bảo vệ } 2 \text{ cm} \rightarrow h_0 = 30 - 2 - 1,6 / 2 = 27,2 \text{ cm}$$

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b h_0^2} = \frac{10,818}{11,5 \cdot 10^3 \cdot 0,3 \cdot 0,272^2} = 0,04238 < \alpha_R = 0,429$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG


$$\xi = 0,5 \cdot (1 + \sqrt{1 - 2 \cdot 0,4238}) = 0,695$$

$$A_s = \frac{M}{R_s \xi h_0} = \frac{10,818}{280 \cdot 10^3 \cdot 0,695 \cdot 0,272} = 2,043 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 204,3 \text{ mm}^2$$

Cốt thép chịu lực của cọc là 4φ16 có  $A_s = 804,2 \text{ mm}^2 > 204,3 \text{ mm}^2 \rightarrow$  cọc đủ khả năng chịu lực khi vận chuyển cầu lắp với cách bố trí móng cầu cách đầu mút một đoạn 2,352 m.

## 7.2. Tính toán độ bền của đài móng cọc A-5.

7.2.1.Kiểm tra chiều cao đài theo cột đâm thủng dạng hình tháp.

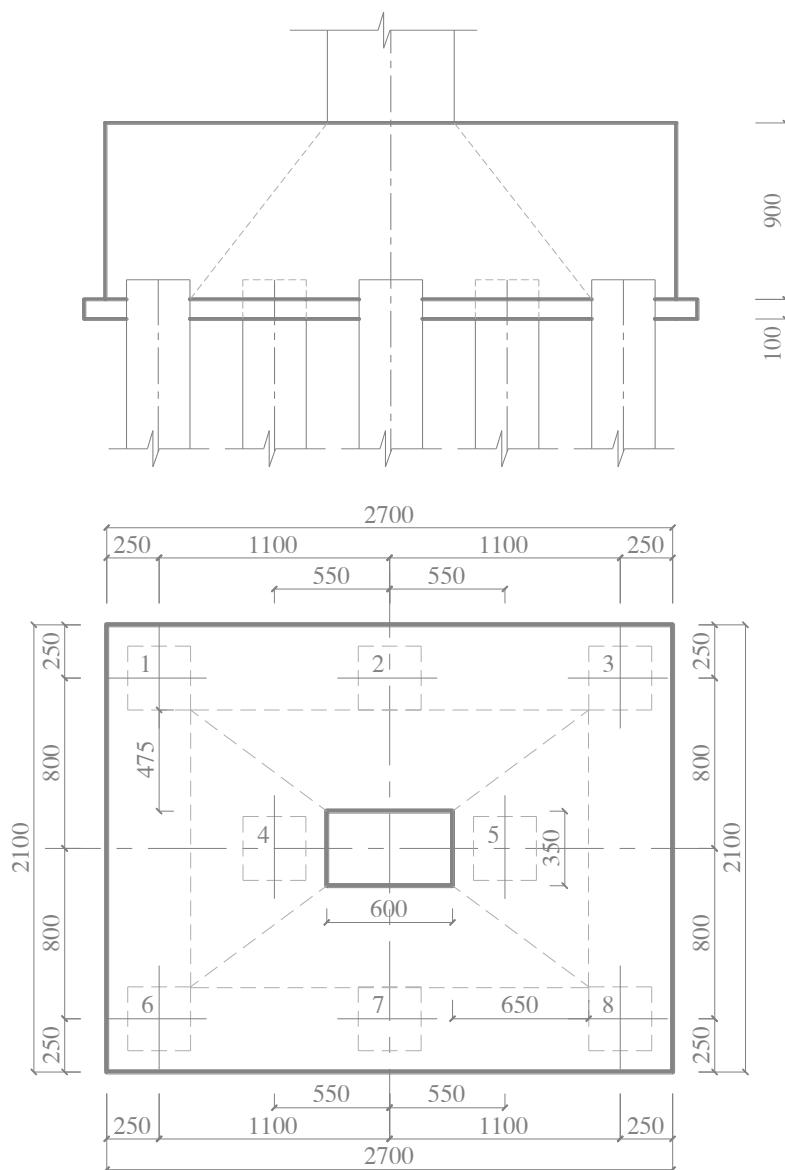

-Điều kiện kiểm tra:  $P_{dt} \leq P_{cdt}$

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$P_{dt}$  là lực đâm thủng bằng tổng phản lực của các cọc nằm ngoài phạm vi đáy tháp đâm thủng về phía phản lực max.

$$P_{dt} = P_3 + P_8$$

$$P_{dt} = 376,981 + 376,981 = 753,962 \text{ KN}$$

$P_{cdt}$  là khả năng chống đâm thủng của đài.

$$P_{cdt} = [\alpha_1(b_c + C_2) + \alpha_2(h_c + C_1)]R_k h_0$$

$R_k$  c- ờng độ chịu kéo tính toán của bê tông.

$b_c$ ;  $h_c$ : Kích th- óc tiết diện cột.

$$b_c = 0,35 \text{ m}; h_c = 0,6 \text{ m}$$

$h_0$  : Chiều cao hữu ích của đài.

$$h_0 = h_d - 0,1 = 0,9 - 0,1 = 0,8 \text{ m}$$

$C_1, C_2$  : Khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng.  $C_1 = 0,65 \text{ m} < h_0 = 0,8 \text{ m}$  lấy  $C_1 = 0,65 \text{ m}$

$$C_2 = 0,475 \text{ m} > 0,5h_0 = 0,4 \text{ m} \text{ lấy } C_2 = 0,475 \text{ m}$$

$\alpha_1$ ;  $\alpha_2$  : Các hệ số đ- ợc tính nh- sau:

$$\alpha_1 = 1,5 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{h_0}{C_1}\right)^2} = 1,5 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{0,8}{0,65}\right)^2} = 2,37$$

$$\alpha_2 = 1,5 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{h_0}{C_2}\right)^2} = 1,5 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{0,8}{0,475}\right)^2} = 2,94$$

$$\begin{aligned} P_{cdt} &= [\alpha_1(b_c + C_2) + \alpha_2(h_c + C_1)]R_k h_0 \\ &= [2,37(0,35 + 0,475) + 2,94(0,6 + 0,65)] \cdot 1,05 \cdot 10^3 \cdot 0,8 \\ &= 4729,41 \text{ KN} > 753,962 = P_{dt} \end{aligned}$$

7.2.2.Xác định  $h_0$  theo điều kiện chọc thủng cột.

$$\text{Điều kiện kiểm tra: } h_0 \geq \frac{P_{dt}}{0,75R_k b_{tb}}$$


$$0,8 \text{ m} = h_0 \geq \frac{P_{dt}}{0,75R_k b_{tb}} = \frac{753,962}{0,75 \cdot 1,05 \cdot 10^3 \cdot 0,5(0,35 + 2,15)} = 0,766 \text{ m}$$

Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chọc thủng cột.

Kết luận: Chọn chiều cao đài  $h = 90 \text{ cm}$

### 7.3. Tính toán độ bền của đài móng cọc B-5.

7.3.1 Kiểm tra chiều cao đài theo cột đâm thủng dạng hình tháp.

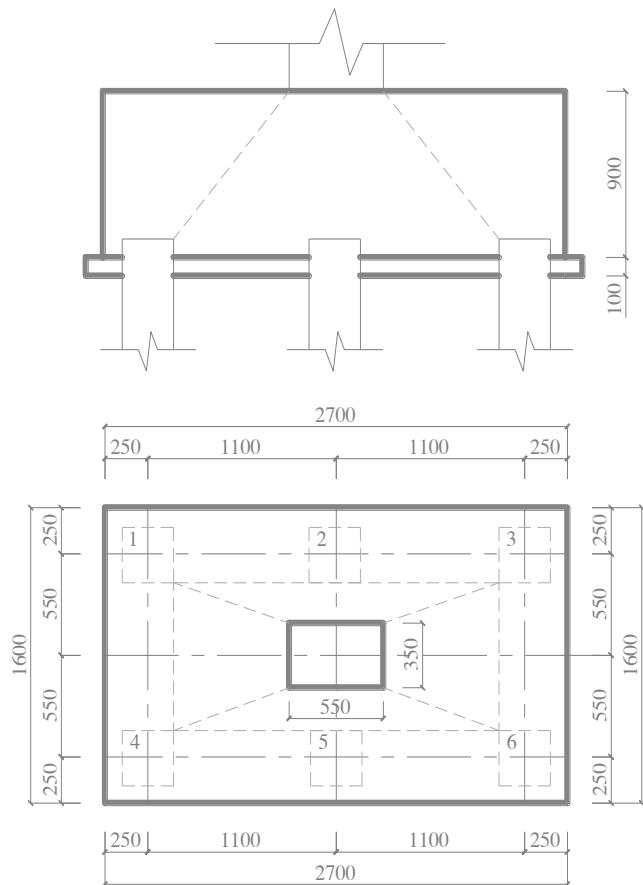

-Điều kiện kiểm tra:  $P_{dt} \leq P_{cdt}$

$P_{dt}$  là lực đâm thủng bằng tổng phản lực của các cọc nằm ngoài phạm vi đáy tháp đâm thủng về phía phản lực max.

$$P_{dt} = P_3 + P_8$$

$$P_{dt} = 289,24 + 289,24 = 578,48 \text{ KN}$$

$P_{cdt}$  là khả năng chống đâm thủng của đài.

$$P_{cdt} = [\alpha_1(b_c + C_2) + \alpha_2(h_c + C_1)]R_k h_0$$

$R_k$  - Ờng độ chịu kéo tính toán của bê tông.

$b_c$ ;  $h_c$ : Kích th- óc tiết diện cột.

$$b_c = 0,35 \text{ m}; h_c = 0,55 \text{ m}$$

$h_0$  : Chiều cao hữu ích của đài.

$$h_0 = h_d - 0,1 = 0,9 - 0,1 = 0,8 \text{ m}$$

$C_1, C_2$  : Khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng.  $C_1 = 0,675 \text{ m} < h_0 = 0,8 \text{ m}$  lấy  $C_1 = 0,675 \text{ m}$

$$C_2 = 0,225 \text{ m} < 0,5h_0 = 0,4 \text{ m} \text{ lấy } C_2 = 0,5h_0 = 0,4 \text{ m}$$

$\alpha_1$ ;  $\alpha_2$  : Các hệ số đ- ợc tính nh- sau:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\alpha_1 = 1,5 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{h_0}{C_1}\right)^2} = 1,5 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{0,8}{0,675}\right)^2} = 2,326$$

$$\alpha_2 = 1,5 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{h_0}{C_2}\right)^2} = 1,5 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{0,8}{0,4}\right)^2} = 3,354$$

$$\begin{aligned} P_{\text{cdt}} &= [\alpha_1(b_c + C_2) + \alpha_2(h_c + C_1)] R_k h_0 \\ &= [2,326 \cdot (0,35 + 0,4) + 3,354 \cdot (0,55 + 0,675)] \cdot 1,05 \cdot 10^3 \cdot 0,8 \\ &= 4916,64 \text{ KN} > 578,48 = P_{\text{dt}} \end{aligned}$$

7.2.2. Xác định  $h_0$  theo điều kiện chọc thủng cột.

Điều kiện kiểm tra:  $h_0 \geq \frac{P_{\text{dt}}}{0,75 R_k b_{tb}}$

$$0,8 \text{ m} = h_0 \geq \frac{P_{\text{dt}}}{0,75 R_k b_{tb}} = \frac{578,48}{0,75 \cdot 1,05 \cdot 10^3 \cdot (0,35 + 0,8)} = 0,638 \text{ m}$$

Chiều cao dài thỏa mãn điều kiện chọc thủng cột.

Kết luận: Chọn chiều cao dài  $h = 90 \text{ cm}$ .

## 8. Tính toán cốt thép dài móng A-5.

### 8.1. Nội lực tính toán.

Momen uốn tại ngầm xác định theo công thức:

$$M = \sum_{i=1}^n r_i \cdot P_i$$

Trong đó:

$n$ : số l-ợng cọc trong phạm vi conxon.

$r_i$ : khoảng cách từ mặt ngầm đến trục cọc thứ  $i$ .

$P_i$ : phản lực của đầu cọc thứ  $i$ .

+ Momen uốn ở tiết diện I - I:

$$\begin{aligned} M_I &= 2 \cdot P_3 \cdot 0,8 + P_5 \cdot 0,25 \\ &= 2 \cdot 376,981 \cdot 0,8 + 346,496 \cdot 0,25 = 689.794 \text{ KN.m} \end{aligned}$$

+ Momen uốn ở tiết diện II-II:

$$\begin{aligned} M_{II} &= (P_1 + P_2 + P_3) \cdot 0,6 \\ &= (255,044 + 316,013 + 376,981) \cdot 0,6 = 568,82 \text{ KN.m} \end{aligned}$$

### 8.2. Tính toán cốt thép.

Cốt thép đặt theo ph-ơng cạnh dài của đài chịu momen uốn  $M_I$ :

$$\alpha_m = \frac{M_I}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{689,794}{14,5 \cdot 10^3 \cdot 2,1 \cdot 0,8^2} = 0,0354$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\xi = 0,5.(1 + \sqrt{1 - 2.0,0354}) = 0,982$$

$$A_I = \frac{M_I}{R_s \cdot \xi \cdot h_0} = \frac{689,794}{280.10^3 \cdot 0,982 \cdot 0,8} = 3,136 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 = 3136 \text{ mm}^2$$

→ Chọn 10φ20 s180 có  $A_s = 3142 \text{ mm}^2$ .

Cốt thép đặt theo ph- ơng cạnh ngắn của đài chịu momen uốn  $M_{II}$ :

$$\alpha_m = \frac{M_{II}}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{568,82}{14,5 \cdot 10^3 \cdot 2,1 \cdot 0,79^2} = 0,0299$$

$$\xi = 0,5.(1 + \sqrt{1 - 2.0,0299}) = 0,9848$$

$$A_{II} = \frac{M_{II}}{R_s \cdot \xi \cdot h_0'} = \frac{568,82}{280.10^3 \cdot 0,9848 \cdot 0,79} = 2,6112 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 = 2611,2 \text{ mm}^2$$

→ Chọn 14φ16 s180 có  $A_s = 2815,4 \text{ mm}^2$

## 9.Tính toán cốt thép đài móng B-5.

### 9.1.Nội lực tính toán.

Momen uốn tại ngầm xác định theo công thức:

$$M = \sum_{i=1}^n r_i \cdot P_i$$

Trong đó:

n: số l- ợng cọc trong phạm vi conxon.

$r_i$ : khoảng cách từ mặt ngầm đến trục cọc thứ i.

$P_i$ : phản lực của đầu cọc thứ i.

+Momen uốn ở tiết diện I - I:

$$\begin{aligned} M_I &= (P_3 + P_6) \cdot 0,825 \\ &= 2.289,24 \cdot 0,825 = 477,24 \text{ KN.m} \end{aligned}$$

+Momen uốn ở tiết diện II-II:

$$\begin{aligned} M_{II} &= (P_1 + P_2 + P_3) \cdot 0,375 \\ &= (173,89 + 231,56 + 289,24) \cdot 0,375 = 260,51 \text{ KN.m} \end{aligned}$$

### 9.2.Tính toán cốt thép.

Cốt thép đặt theo ph- ơng cạnh dài của đài chịu momen uốn  $M_I$ :

$$\alpha_m = \frac{M_I}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{477,24}{14,5 \cdot 10^3 \cdot 1,6 \cdot 0,8^2} = 0,0321$$

$$\xi = 0,5.(1 + \sqrt{1 - 2.0,0321}) = 0,9836$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$A_I = \frac{M_I}{R_s \cdot \xi \cdot h_0} = \frac{477,24}{280 \cdot 10^3 \cdot 0,9836 \cdot 0,8} = 2,1658 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 = 2165,8 \text{ mm}^2$$

→ Chọn 9φ18 s150 có  $A_s = 2290,2 \text{ mm}^2$ .

Cốt thép đặt theo ph-ơng cạnh ngắn của đài chịu momen uốn  $M_{II}$ :

$$\alpha_m = \frac{M_{II}}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{260,51}{14,5 \cdot 10^3 \cdot 1,6 \cdot 0,791^2} = 0,01799$$

$$\xi = 0,5 \cdot (1 + \sqrt{1 - 2 \cdot 0,01799}) = 0,99$$

$$A_{II} = \frac{M_{II}}{R_s \cdot \xi \cdot h_0'} = \frac{260,51}{280 \cdot 10^3 \cdot 0,99 \cdot 0,791} = 1,1896 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 = 1189,6 \text{ mm}^2$$

→ Chọn 11φ12 s220 có  $A_s = 1244,1 \text{ mm}^2$

## 10.Tính toán cốt thép đài móng D-5.

### 10.1.Nội lực tính toán.

Momen uốn tại ngầm xác định theo công thức:

$$M = \sum_{i=1}^n r_i \cdot P_i$$

Trong đó:

n: số l-ợng cọc trong phạm vi conxon.

$r_i$ : khoảng cách từ mặt ngầm đến trục cọc thứ i.

$P_i$ : phản lực của đầu cọc thứ i.

+Momen uốn ở tiết diện I - I:

$$\begin{aligned} M_I &= (P_3 + P_6) \cdot 0,825 \\ &= 2.369,95 \cdot 0,825 = 610,418 \text{ KN.m} \end{aligned}$$

+Momen uốn ở tiết diện II-II:

$$\begin{aligned} M_{II} &= (P_1 + P_2 + P_3) \cdot 0,375 \\ &= (274,458 + 322,20369,95) \cdot 0,375 = 362,48 \text{ KN.m} \end{aligned}$$

### 10.2.Tính toán cốt thép.

Cốt thép đặt theo ph-ơng cạnh dài của đài chịu momen uốn  $M_I$ :

$$\alpha_m = \frac{M_I}{R_b \cdot b \cdot h_0^2} = \frac{610,418}{14,5 \cdot 10^3 \cdot 1,6 \cdot 0,8^2} = 0,0411$$

$$\xi = 0,5 \cdot (1 + \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0411}) = 0,979$$

$$A_I = \frac{M_I}{R_s \cdot \xi \cdot h_0} = \frac{610,418}{280 \cdot 10^3 \cdot 0,979 \cdot 0,8} = 2,7835 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 = 2783,5 \text{ mm}^2$$

→ Chọn 9φ20 s150 có  $A_s = 2827,4 \text{ mm}^2$ .

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

Cột thép đặt theo phong cách ngắn của đài chịu momen uốn  $M_{II}$ :

$$\alpha_m = \frac{M_{II}}{R_b b h_0^2} = \frac{362,48}{14,5 \cdot 10^3 \cdot 1,6 \cdot 0,79^2} = 0,0250$$

$$\xi = 0,5 \cdot (1 + \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0250}) = 0,9873$$

$$A_{II} = \frac{M_{II}}{R_s \xi \cdot h_0} = \frac{362,48}{280 \cdot 10^3 \cdot 0,9873 \cdot 0,79} = 1,6597 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 = 1659,7 \text{ mm}^2$$

→ Chọn 11φ14 s220 có  $A_s = 1692,9 \text{ mm}^2$

## **PHẦN III: THI CÔNG.**

### **(45%)**

**GIÁO VIÊN H- ỐNG DẪN: THS NGUYỄN HOÀI NAM**

#### **NHIỆM VỤ:**

- Tính toán khối lượng của toàn nhà.
- Lập biện pháp kĩ thuật và tổ chức thi công cho các dạng công tác.
- Lập tiến độ thi công theo một trong các phương pháp đã học.
- Tính toán nhu cầu về nhà cửa, kho hàng, lán trại,...để phục vụ thi công.
- Thiết kế tổng mặt bằng thi công ở giai đoạn đặc trưng nhất.
- Nêu một số biện pháp về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

#### **CÁC BẢN VẼ KÈM THEO:**

- 1.TC 01 : Thi công cọc.
- 2.TC 02 : Thi công đất + Thi công móng.
- 3.TC 03 : Thi công phần thân .
- 4.TC 04 : Tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực.
- 5.TC 05 : Tổng mặt bằng thi công.

**CH- ƠNG I**

**THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT.**

**I. THI CÔNG PHẦN NGÂM.**

**1. Công tác thi công cọc.**

**1.1. Xác định khối lượng cọc.**

Cọc theo thiết kế dài 16 m, tiết diện 30x30 cm gồm 1 đoạn 8m và 1 đoạn 8m có mũi nhọn.

Trọng l- ợng cọc :

$$+1 \text{ đoạn } 8\text{m} : 0,3 \cdot 0,3 \cdot 8 \cdot 2,5 = 1,8 \text{ T}$$

$$+1 \text{ cọc trong đài} : 2 \cdot 1,8 = 3,6 \text{ T}$$

$$+\text{Số l- ợng cọc tại móng trực } 5 : 26 \text{ chiếc}$$

$$+\text{Số l- ợng cọc cho toàn bộ móng công trình: } 26,4 + 28,2 = 160 \text{ chiếc.}$$

$$+\text{Chiều dài cọc toàn bộ móng công trình: } 18 \cdot 160 = 2880 \text{ m.}$$

Theo định mức tính cho 100 m cọc đối với đất cấp I, chiều dài đoạn cọc  $\geq 4$  m cần 18 công và 3,6 ca máy. Vậy công tác ép cọc cần 518,4 công và 103,68 ca máy.

**1.2. Lựa chọn ph- ơng án thi công cọc.**

**1.2.1. Ph- ơng án đóng cọc.**

+Ưu điểm : thời gian thi công nhanh, đạt chiều sâu lớn, chi phí thấp, chủng loại máy đóng đa dạng, có thể hạ đ- ợc cọc dài, tiết diện lớn, số mối nối cọc ít, độ tin cậy cọc cao.

+Nh- ợc điểm : gây ôn ào chấn động mạnh có thể làm các công trình xung quanh bị nứt gãy, thậm chí sụp đổ do vậy việc đóng cọc tuy có những - u điểm nổi bật nh- trên nh- ng chỉ đ- ợc áp dụng tại các công trình có mặt bằng rộng và xa các công trình hiện có. Đặc biệt việc đóng cọc hiện nay đã bị cấm thi công trong những thành phố lớn.

**1.2.2. Ph- ơng án ép cọc.**

+Ưu điểm : lực ép tĩnh lên đầu cọc không gây chấn động cho các công trình xung quanh, không gây phá hoại đầu cọc hoặc gãy cọc. Dễ kiểm tra chất l- ợng cọc. Giá ép cọc đơn giản thuận tiện cho việc thi công.

+Nh- ợc điểm : thời gian thi công chậm, không ép đ- ợc đoạn cọc dài ( tối đa chỉ đ- ợc 9m ). Hạn chế về tiết diện và chiều sâu hạ cọc. Hệ thống đối trọng lớn cồng kềnh dễ gây mất an toàn. Mất thời gian di chuyển máy ép và đổi trọng từ đài này

## **TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

sang dài khác trong quá trình thi công. Không ép đ- ợc những cọc ở biên nếu có các công trình khác bên cạnh.

Th- ờng đ- ợc áp dụng cho các công trình xây chen giữa các công trình khác có tr- ớc hoặc sửa chữa gia cố các công trình bị lún mạnh.

\* ép tr- ớc: là biện pháp ép cọc tr- ớc khi xây dựng công trình. Sau khi ép cọc xong mới tiến hành thi công dài cọc và các kết cấu khác của công trình. Trong ép tr- ớc th- ờng sử dụng các ph- ơng pháp sau:

- ép âm: là tr- ờng hợp ép cọc khi ch- a tiến hành đào đất đến độ sâu đáy dài cọc. Muốn ép theo ph- ơng pháp này cần thêm 1 đoạn cọc dẫn có chiều dài bằng chiều dài đáy dài cọc.

Ưu điểm ép âm:

- Dễ dàng ép đ- ợc các cọc ở góc công trình do không bị cản trở.
- Công tác vận chuyển máy móc t- ơng đối thuận lợi.
- Có thể ép cọc ở những nơi có mực n- ớc ngầm cao.

Nh- ợc điểm ép âm:

- Phải ép thêm 1 đoạn cọc
- Công tác đào đất gập nhiều khó khăn, phải đào thủ công nhiều lần.
- Khó xác định đ- ợc chính xác tim cọc.
- ép d- ơng: theo ph- ơng pháp này cọc đ- ợc ép sau khi đã đào đất đến đáy dài cọc.

Ưu điểm ép d- ơng:

- Không phải ép âm
- Công tác đào đất dễ dàng
- Xác định tim cọc dễ dàng chính xác

Nh- ợc điểm ép d- ơng:

- Việc ép cọc ở góc công trình gập nhiều khó khăn
- Công tác di chuyển máy móc đối trọng khó khăn.
- Không thể tiến hành ép cọc ở nh- ng nơi có mực n- ớc ngầm cao
- Chỉ ép đ- ợc những nơi mà công trình có hố móng phải đào thành ao lớn

\* ép sau:

Theo ph- ơng pháp này công việc đ- ợc tiến hành sau khi đã làm xong phần dài móng và một số tầng nhất định ở phần thân dài để dùng làm đối trọng. Để ép cọc ta phải chừa lỗ ở dài cọc rồi ép cọc qua lỗ, sau đó hàn thép chờ và đổ bê tông bít kín lỗ.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Ưu điểm:

- Không phải dùng đồi trọng bằng bê tông mà sử dụng luôn công trình làm đồi trọng.

Nhược điểm:

- Chiều dài các đoạn cọc phụ thuộc bởi không gian ép cọc.
  - Do cọc bị chia ngắn để ép nên khả năng chịu lực giảm
  - Không sử dụng đợt cho các cọc có sức chịu tải lớn
  - Mức độ cơ giới hóa thấp
- \* Kết luận và chọn phương pháp hạ cọc.

Căn cứ vào các ưu nhược điểm trên và dựa vào đặc điểm công trình như :

- Xây dựng công trình trong khu trung tâm đô thị.
- Sức chịu tải của cọc thường đồi lớn.
- Cọc làm việc theo sơ đồ ma sát, chiều dài cọc là: 16m
- Chiều rộng móng không lớn.

Vậy ta chọn phương án hạ cọc là phương pháp ép trục, sử dụng phương pháp ép âm. Dùng đồi trọng là các khối bê tông đúc sẵn chở từ nhà máy đến.

## 1.2.3. Lựa chọn phương án.

Căn cứ vào ưu nhược điểm của từng phương án và mặt bằng địa điểm xây dựng công trình ta quyết định chọn phương án ép trục, sử dụng phương pháp ép âm. Dùng đồi trọng là các khối bê tông đúc sẵn chở từ nhà máy đến.

## 1.3. Công tác chuẩn bị ép cọc.

+ Chuẩn bị mặt bằng thi công

+ Định vị cọc

+ Chọn loại máy ép

### 1.3.1. Chuẩn bị mặt bằng thi công và cọc.

Việc bố trí mặt bằng thi công ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công nhanh hay chậm của công trình. Việc bố trí mặt bằng thi công hợp lý để các công việc không bị chồng chéo,干涉, cản trở lẫn nhau có tác dụng giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian thi công công trình.

+ Trục khi thi công mặt bằng cần đợt dọn sạch, phát quang, phá vỡ các chướng ngại vật, san phẳng...

+ Cọc phải đợt bố trí trên mặt bằng sao cho thuận lợi cho việc thi công mà vẫn không cản trở máy móc thi công.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+Vị trí các cọc phải đ- ợc đánh dấu sẵn trên mặt bằng bằng các cột mốc chắc chắn, dễ nhìn.

+Cọc phải đ- ợc vạch sẵn các đ- ờng tâm để sử dụng máy ngắm kinh vĩ.

## 1.3.2 Yêu cầu đối với cọc.

Các đoạn cọc cần phải thỏa mãn các yêu cầu sau :

+Các đoạn cọc phải thẳng, chế tạo theo đúng hình dạng và kích th- ớc thiết kế

+Mặt đầu cọc phải phẳng, vuông góc với trục cọc

+Cốt thép dọc phải đ- ợc hàn vào bích nối cọc theo cả 2 mặt và trên suốt chiều cao bích.

+Bích nối cọc phải có độ cong vênh không quá 1%

+Trục cọc phải thẳng và đi qua mũi cọc.

## 1.3.3 .Xác định vị trí cọc.

Việc định vị các cọc là việc làm rất quan trọng đ- ợc tiến hành chính xác theo các b- ớc sau :

+ Từ mặt cốt 0.00 có sẵn ta dẫn tới cao trình đáy hố móng

Dụng cụ : Máy kinh vĩ; dây thép nhỏ để căng; th- ớc dây và quả dọi; ống bọt n- ớc dẫn cao độ

+ Từ hệ trục chính của nhà đã đ- ợc đánh dấu ta dẫn về tim của từng móng :

Tr- ớc tiên ta xác định trục của 2 hàng móng theo 2 ph- ơng vuông góc bằng máy kinh vĩ và quả dọi sau đó căng dây thép tìm giao của 2 trục đã xác định thả quả dọi định vị xuống đất ta xác định đ- ợc tim móng. Đánh dấu tim bằng cột mốc có sơn đỏ.

+ Từ tim móng xác định tim cọc bằng th- ớc và quả dọi kiểm tra ph- ơng. Đánh dấu vị trí cọc bằng các cọc gỗ thẳng đứng.

## 1.4. Chọn máy ép cọc.

### 1.4.1.Chọn máy ép cọc.

Để đ- a cọc xuống độ sâu thiết kế thì máy ép cần phải có lực:

$$P_{\text{épmin}} \leq P_{\text{ép}} \leq P_{\text{épmax}}$$

Trong đó:

$p_{\text{ép}}$ : Lực ép lớn nhất cần thiết để đ- a cọc đến độ sâu thiết kế.

$P_{\text{ép min}}$ : Lực ép tối thiểu  $P_{\text{ép min}} = (1,5 \div 2) P_{\text{đất nền}}$  (tải trọng thiết kế )

$P_{\text{ép max}}$ : Lực ép tối đa  $P_{\text{ép max}} = (0,8 \div 0,9) P_{\text{vật liệu}}$

+ Theo kết quả tính toán nền móng có:

$$P_{\text{épmin}} = 1,5. P_c = 1,5. 47,448 = 71,232 \text{ T}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$P_{\text{epmax}} = 0,8 \cdot P_d = 1,8 \cdot 124,97 = 103,97 \text{ T}$$

+Yêu cầu kỹ thuật với thiết bị ép cọc:

- Lực nén (danh định) lớn nhất thiết bị  $\geq 1,4$  lực nén lớn nhất  $P_{\text{ep}}$  yêu cầu theo quy định của thiết kế.
- Lực nén của kích thuỷ lực phải đảm bảo tác dụng dọc trực cọc khi ép (ép ôm) không gây lực ngang khi ép.
- Chuyển động của pít tông phải đều và khống chế đ- ợc tốc độ ép cọc
- Đồng hồ đo áp lực phải t- ơng xứng với lực
- Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện thao tác vận hành theo đúng quy định về an toàn lao động.

⇒Chọn loại máy ép ETC\_03\_94 do phòng nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình tr- ờng ĐHXD thiết kế.

Các thông số của máy.

Máy ép tr- ớc cọc bê tông cốt thép bằng đồi trọng ngoài, máy ép đ- ợc các loại cọc có tiết diện  $15x15 \text{ cm}^2$  đến  $30x30 \text{ cm}^2$

Chiều dài tối đa của cọc:  $L_{\text{max}} = 9\text{m}$  - đoạn mũi

$L_{\text{max}} = 8\text{m}$  -đoạn nối

Lực nén dọc trực theo ph- ơng thẳng đứng đặt ở đầu cọc do 2 xi lanh có đ- ờng kính  $D = 200 \text{ mm}$  thực hiện.

+ Diện tích hiệu dụng  $F = 628,3 \text{ cm}^2$

+ Hành trình  $h = 130\text{cm}$

+ Trạm bơm áp lực hai cấp :

Cấp áp lực 1:  $P_{\text{max}} = 160 \text{ Kg/cm}^2$ ;  $V = 1051/\text{phút}$

Cấp áp lực 2:  $P_{\text{max}} = 250 \text{ Kg/cm}^2$ ;  $V = 401/\text{phút}$

+ Việc chuyển cấp áp lực đ- ợc thực hiện tự động bằng áp lực trong.

+ Đồng hồ đo áp lực đ- ợc sử dụng 1 trong ba thang đo:100, 160, 250  $\text{Kg/cm}^2$

Nh- vậy :

+ Với cấp áp lực 1 giá trị lực ép lớn nhất mà máy đạt đ- ợc là:

$$P_{\text{max}} = F \cdot 0,5 \cdot P'_{\text{max}} = 628,3 \cdot 0,5 \cdot 160 = 50,26 \text{ T}$$

+ Với cấp áp lực 2 giá trị lực ép lớn nhất mà máy đạt đ- ợc là:

$$P_{\text{max}} = F \cdot 0,5 \cdot P'_{\text{max}} = 628,3 \cdot 0,5 \cdot 250 = 78,5 \text{ T}$$

1.4.2.Chọn và bố trí đồi trọng :

+Tổng trọng l- ợng đồi trọng xác định theo yêu cầu :

+Tổng trọng l- ợng đồi trọng  $\sum G_i +$  trọng l- ợng giá ép  $\geq 1,1 P_{\text{epmax}}$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+ Kích thước đối trọng  $2 \times 1 \times 1\text{m}$  (5 tấn)

+ Tổng trọng lượng đối trọng  $\sum Gi \geq 1,1.78,5 = 86,35\text{T.}$

+ Số đối trọng  $\frac{86,35}{5} = 17,27$ . Chọn 18 khối, như vậy mỗi bên giá máy xếp 9 khối đối trọng loại  $1 \times 1 \times 2\text{m}$ .

## 1.1.4.3. Chọn cầu lắp cọc:

Ta sử dụng cần trục ô tô tự hành có các thông số kỹ thuật sau:

- Loại cần trục: K140
- Độ vơ: 13m
- Sức nâng có chống phụ: 10000kg
- Chiều cao nâng  $H_{max}$ : 16,4m
- Chiều cao nâng  $H_{min}$ : 10m
- Cầu lấy hàng:  $3,5 \div 12,5$  m/phút
- Di chuyển móc: 5,50 đến 8,5 m/phút
- Quay cần:  $0,5 \div 1,5$  vòng/phút
- Di chuyển cần trục: 35km/h
- Động cơ  $A_3$  -206 công suất 165(KW)

## 1.5. Công tác ép cọc.

Kiểm tra sự cân bằng ổn định của thiết bị ép cọc theo các tiêu chuẩn sau:

- + Mặt phẳng công tác của sàn máy ép phải phẳng song song hoặc tiếp xúc với mặt bằng thi công.
- + Phóng nén của thiết bị ép phải vuông góc với mặt bằng thi công. Độ nghiêng nếu có thì không quá 0,5%.
- + Chạy thử máy để kiểm tra độ ổn định và an toàn máy (chạy có tải và không tải).

Tiến hành ép đoạn cọc đầu tiên  $C_1$ :

- + Đoạn cọc đầu tiên  $C_1$  phải được dựng lấp cẩn thận, cần phải căn chỉnh để trực cọc trùng với phóng nén của thiết bị ép và qua điểm định vị cọc.
- + Độ sai lệch tâm không quá 1 cm
- + Tại thời điểm gia tải đầu tiên áp lực phải tăng từ từ để đoạn cọc cắm sâu dần vào đất một cách nhẹ nhàng.
- + Vận tốc xuyên của đoạn cọc  $C_1 \leq 1$  cm/s
- + Nếu phát hiện cọc bị nghiêng phải dừng ép và tiến hành căn chỉnh lại

Tiến hành ép các đoạn cọc tiếp theo  $C_1, C_2$ :

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

- + Kiểm tra bề mặt 2 đầu đoạn C<sub>2</sub> cho thật phẳng
- + Kiểm tra chi tiết mối nối 2 đầu cọc và chuẩn bị máy hàn.
- + Lắp đặt đoạn C<sub>2</sub> vào vị trí ép. Căn chỉnh để đ-ờng trục của C<sub>2</sub> trùng với đ-ờng trục của đoạn C<sub>1</sub>. Độ nghiêng C<sub>2</sub> so với ph-ong nén không quá 1%
- + Gia tải lên cọc 1 áp lực khoảng 3 - 4 kg/cm<sup>2</sup> để tạo tiếp xúc giữa 2 bề mặt bê tông của 2 đoạn cọc. Nếu bề mặt tiếp xúc không khít thì phải chèn chặt bằng các bản thép đệm sau đó mới tiến hành hàn nối cọc theo qui định.
- + Kiểm tra chất l-ợng mối hàn

Tiến hành ép đoạn cọc C<sub>2</sub>. Tăng dần lực nén để máy ép cọc có đủ thời gian cần thiết để tạo lực ép thắng lực ma sát và lực kháng ở mũi cọc.

Thời gian đầu đoạn C<sub>2</sub> đi vào lòng đất không quá 1 cm/s. Khi C<sub>2</sub> chuyển động đều mới cho chuyển động với vận tốc 2 cm/s.

Kết thúc công việc ép xong 1 cọc :

Cọc đ-ợc công nhận là ép xong khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau đây

+ Điều kiện 1 : chiều dài cọc đ-ợc ép sâu vào lòng đất không nhỏ hơn chiều dài ngắn nhất do thiết kế qui định.

+ Điều kiện 2 : Lực ép tại thời điểm kết thúc cọc có giá trị không nhỏ hơn lực ép nhỏ nhất do thiết kế qui định. Và lực ép kết thúc đ-ợc duy trì trên suốt chiều dài xuyên sâu lớn hơn 3 lần đ-ờng kính hoặc cạnh cọc ; đồng thời trong khoảng đó vận tốc xuyên không quá 1 cm/s.

### 1.6. Công tác khóa đầu cọc.

Mục đích :

+ Huy động cọc vào làm việc ở thời điểm thích hợp trong quá trình tăng tải của công trình.

+ Đảm bảo cho công trình không chịu những độ lún lớn hoặc lún không đều

Việc khóa đầu cọc phải thực hiện đầy đủ các công việc sau :

+ Sửa đầu cọc cho đúng cao độ thiết kế

+ Kiểm tra kích th- ớc phễu lún bao quanh đầu cọc

+ Lắp đầu phễu lún bằng cát vàng hạt trung đầm chặt cho tới cao độ lớp bê tông lót.

Đổ bê tông khóa đầu cọc(bao gồm cả việc đặt l-ới thép phía trên đầu cọc )

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

## 1.7. Ghi chép lực ép theo chiều dài cọc.

Khi cọc cắm sâu vào đất từ 30 - 50cm thì bắt đầu ghi chỉ số lực nén đầu tiên. Theo dõi đồng hồ áp lực, khi nào thấy lực nén tăng (hoặc giảm) thì ghi ngay giá trị đó cùng với độ sâu ứng ứng.

ở giai đoạn cuối cùng khi lực ép có giá trị vào khoảng 0,8 lần lực ép giới hạn tối thiểu theo thiết kế thì ghi ngay độ sâu và lực ép ứng ứng. Bắt đầu từ đây ghi lực ép ứng với độ xuyên sâu 20cm cho đến hết.

## 1.8. Sơ đồ di chuyển máy ép cọc.

### 1.9. Một số sự cố xảy ra khi ép cọc và cách xử lý.

+Trong quá trình ép cọc có thể bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế.

-Nguyên nhân : cọc gặp những chướng ngại vật cứng hoặc do chế tạo cọc vát không đều

-Xử lý : Dừng việc ép cọc. Phá bỏ chướng ngại vật hoặc đào lỗ dẫn hổng cho cọc xuống đúng hổng. Căn chỉnh lại vị trí tim trực cọc (bằng máy kinh vĩ hoặc dọi)

+Cọc xuống khoảng 0,5 - 1 m đầu tiên thì bị cong, xuất hiện vết nứt và gãy ở vùng giữa cọc

-Nguyên nhân : cọc gặp những chướng ngại vật gây nên lực ép lớn.

-Xử lý : Dừng việc ép cọc, nhổ cọc hang.Tìm nguyên nhân (thăm dò dị vật) và phá bỏ. Thay cọc mới và ép tiếp

+Cọc ép xuống gần độ sâu thiết kế (cách 1- 2m) đã bị chối, bênh đồi trọng gây nghiêng lệch hoặc gãy cọc

-Xử lý : cắt bỏ đoạn cọc gãy sau đó cho ép chèn bổ xung cọc mới.

### 1.1.10 Tính thời gian ép cọc :

Theo định mức dự toán xây dựng cơ bản để ép đợt 100m cọc (gồm cả vận chuyển,dựng lắp, định vị) cần 3,2 ca máy

Số ca máy cần thiết để ép hết cọc :

$$N = 160.16. 3,2/100 = 81,92 \text{ ca}$$

Sử dụng 2 máy ép làm việc 2 ca 1 ngày. Số ngày công cần thiết :

$$T = \frac{N}{soca.somay} = \frac{81,92}{2.2} = 20.48 \text{ ngày}$$

Lấy T = 21 ngày

## 2. Công tác đất.

### 2.1 .Lựa chọn ph- ơng án.

+Ph- ơng án 1: Kết hợp cả hai ph- ơng án đào bằng máy và đào thủ công sau khi đã ép xong cọc.

- **Ưu điểm:** Khi thi công cọc, mặt bằng thi công thuận tiện, dễ dàng di chuyển máy ép, đẩy nhanh tiến độ thi công cọc. Hạn chế tối đa việc làm đ- ờng cho máy móc. Thoát n- ớc thuận tiện, ít gặp khó khăn khi có m- a.

- **Nh- ợc điểm:** Do ép cọc tr- ớc khi đào móng nên gặp khó khăn ở khâu đào đất. Không thể đào toàn bộ bằng máy đ- ợc nên năng suất đào giảm, kéo dài thời gian thi công đất, hạn chế việc cơ giới hóa.

+Ph- ơng án 2: đào hố móng bằng máy sau đó mới ép cọc.

- **Ưu điểm :** Vì đất đ- ợc đào tr- ớc khi thi công cọc nên việc cơ giới hóa đ- ợc thực hiện dễ dàng → tăng năng suất và còn giảm chi phí cho bảo hiểm an toàn.

- **Nh- ợc điểm :** việc thi công cọc sẽ gặp khó khăn, nhất là vấn đề di chuyển máy ép cọc, lúc này sẽ phải làm đ- ờng cho xe lên xuống, việc thi công sẽ bị ảnh h- ưởng rất nhiều trong điều kiện trời m- a và việc thoát n- ớc sẽ gặp khó khăn.

Qua phân tích - u khuyết điểm của hai ph- ơng án trên, ta quyết định chọn ph- ơng án thứ nhất : ép cọc xuống rồi mới đào hố móng bằng cơ giới kết hợp với thủ công.

### 2.2. Tính khối l- ợng đất đào

Do phần đất đào là lớp đất cát pha sỏi thuộc đất cấp I nhóm 2, độ dốc cho phép với  $h < 1,5m$  là:  $\gamma = 1: 0,75$ .

$$\rightarrow \operatorname{tg}\alpha = 1,33 \rightarrow \alpha = 53^0$$

$$\text{Chọn } \alpha = 45^0 \rightarrow \operatorname{tg}\alpha = 1.$$

Tiến hành đào đất thành ao bằng máy một lớp 70 cm đến độ sâu đáy dầm móng rồi dùng ph- ơng pháp đào thủ công đào tiếp một lớp dày 50 cm đến độ sâu thiết kế. Phải đào đất thành ao mà không đào thành hào vì nhịp của nhà là 4,5 m nhỏ hơn 2lần bê rông hố móng nếu đào hào sẽ giao cắt 2 thành hào nên đào thành ao hiệu quả sẽ cao hơn.(Bê rông hố móng đ- ợc tính nh- sau:

$$B_{hm} = B_m + 2x0,1 + 2x0,5xtg45^0 + 2x0,4 + 2x0,7xtg45^0$$

$$B_{hm} = 2,1 + 0,2 + 1 + 0,8 + 1,4 = 5,5 \text{ m}.$$

#### 2.2.1. Tính khối l- ợng đất đào bằng máy.

$$a = 25,8 + 2.0,5 = 26,8 \text{ m.}$$

$$b = 17,9 + 2.0,5 = 18,9 \text{ m.}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$c = 28,8 + 2.0,7.1 = 28,2\text{m}.$$

$$d = 18,9 + 2.0,7.1 = 20,3\text{m}.$$

$$\begin{aligned}V_m &= \frac{H}{6} [b + (a+c+d) \cdot c \cdot d] \\&= \frac{0,7}{6} [6,8 \cdot 18,9 + (6,8 + 28,2) \cdot (8,9 + 20,3) \cdot 28,2 \cdot 20,3] = 323,498 \text{ m}^3\end{aligned}$$

2.2.2. Tính khối lượng đất đào bằng tay.

+Đào đất bằng tay cho hố móng M<sub>1</sub>(6 chiếc).

$$a = 2,7 + 2.0,5 = 3,7 \text{ m}.$$

$$b = 2,1 + 2.0,5 = 3,1 \text{ m}.$$

$$c = 3,7 + 2.0,5.1 = 4,9\text{m}.$$

$$d = 3,1 + 2.0,5.1 = 4,3\text{m}.$$

$$\begin{aligned}V_1 &= \frac{H}{6} [b + (a+c+d) \cdot c \cdot d] \\&= \frac{0,5}{6} [1,7 \cdot 3,1 + (1,7 + 4,9) \cdot (1 + 4,3) \cdot 4,9 \cdot 4,3] = 9,122 \text{ m}^3.\end{aligned}$$

+Đào đất bằng tay cho hố móng M<sub>2</sub>. (6 chiếc).

$$a = 6,1 + 2.0,5 = 7,1 \text{ m}.$$

$$b = 1,6 + 2.0,5 = 2,6 \text{ m}.$$

$$c = 7,1 + 2.0,5.1 = 8,1 \text{ m}.$$

$$d = 2,6 + 2.0,5.1 = 3,6 \text{ m}.$$

$$\begin{aligned}V_2 &= \frac{H}{6} [b + (a+c+d) \cdot c \cdot d] \\&= \frac{0,5}{6} [1,1 \cdot 2,6 + (1 + 8,1) \cdot (6 + 3,6) \cdot 8,1 \cdot 3,6] = 14,186 \text{ m}^3\end{aligned}$$

+Đào đất bằng tay cho hố móng M<sub>3</sub>(4 chiếc).

$$a = 2,7 + 2.0,5 = 3,7 \text{ m}.$$

$$b = 1,6 + 2.0,5 = 2,6 \text{ m}.$$

$$c = 3,7 + 2.0,5.1 = 4,7 \text{ m}.$$

$$d = 2,6 + 2.0,5.1 = 3,6 \text{ m}.$$

$$\begin{aligned}V_3 &= \frac{H}{6} [b + (a+c+d) \cdot c \cdot d] \\&= \frac{0,5}{6} [1,7 \cdot 2,6 + (1 + 4,7) \cdot (6 + 3,6) \cdot 4,7 \cdot 3,6] = 7,862 \text{ m}^3\end{aligned}$$

+Đào đất bằng tay cho hố móng M<sub>4</sub>(2 chiếc).

$$a = 3,8 + 2.0,5 = 4,8 \text{ m}.$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$b = 1,6 + 2.0,5 = 2,6 \text{ m.}$$

$$c = 4,8 + 2.0,5.1 = 5,8 \text{ m.}$$

$$d = 2,6 + 2.0,5.1 = 3,6 \text{ m.}$$

$$\begin{aligned} V_4 &= \frac{H}{6} [b + (a+c+d) \cdot c \cdot d] \\ &= \frac{0,5}{6} [1,8 \cdot 2,6 + (4,8 + 5,8) \cdot 5,8 \cdot 3,6] = 9,908 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

+Đào đất bằng tay cho hố móng M<sub>5</sub>(2 chiếc).

$$a = 1,2 + 2.0,5 = 2,2 \text{ m.}$$

$$b = 1,2 + 2.0,5 = 2,2 \text{ m.}$$

$$c = 2,2 + 2.0,5.1 = 3,2 \text{ m.}$$

$$d = 2,2 + 2.0,5.1 = 3,2 \text{ m.}$$

$$\begin{aligned} V_5 &= \frac{H}{6} [b + (a+c+d) \cdot c \cdot d] \\ &= \frac{0,5}{6} [1,2 \cdot 1,2 + (1,2 + 3,2) \cdot 3,2 \cdot 3,2] = 4,424 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Tổng khối lượng đất đào bằng tay:

$$V_t = 6 \cdot V_1 + 6 \cdot V_2 + 4 \cdot V_3 + 2 \cdot V_4 + 2 \cdot V_5$$

$$V_t = 6 \cdot 9,122 + 6 \cdot 14,186 + 4 \cdot 7,862 + 2 \cdot 9,908 + 2 \cdot 4,424 = 199,96 \text{ m}^3.$$

Tổng khối lượng đất đào:

$$V = V_m + V_t = 323,498 + 199,96 = 523,458 \text{ m}^3$$

2.2.3. Tính số nhân công cho công tác đào đất thủ công.

Đất cấp I, theo định mức cần 0,71 công cho 1m<sup>3</sup> đất đào.

Số công cần thiết là:  $199,96 \cdot 0,71 = 141,97$  công.

Số ngày ấn định là 6 ngày nên số nhân công là:  $\frac{141,97}{6} = 23,66$  nhân công.

Chọn 24 nhân công.

## 2.3. Chon máy đào đất.

2.3.1. Nguyên tắc chọn máy :

Việc chọn máy đ- ợc tiến hành d- ới sự kết hợp hài hòa giữa đặc điểm sử dụng của máy với các yếu tố cơ bản của công trình nh- cấp đất đào, mực n- óc ngầm, điều kiện chuyên chở, ch- ống ngại vật trên công trình, khối l- ượng đất đào và thời hạn thi công.

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Công trình ở đây với loại đất cấp I, không có n- ớc ngầm, hố đào dạng hình chữ nhật nên thích hợp nhất là chọn máy đào gầu nghịch mã hiệu EO - 2621A để thi công.

Ưu điểm : có thể đào đ- ợc đất - ớt, không phải làm đ- ờng xuống hố đào, máy có tính cơ động cao.

### 2.3.2. Một số thông số kỹ thuật của máy :

- Dung tích gầu  $q = 0,25 \text{ m}^3$ .
- Bán kính làm việc lớn nhất  $R = 5\text{m}$
- Chiều cao nâng gầu lớn nhất  $h = 2,2\text{m}$
- Chiều sâu hố đào lớn nhất  $H = 3,3\text{m}$
- Thời gian của 1 chu kì  $T_{ck} = 20\text{s}$
- Chiều rộng máy  $b = 2,1\text{m}$

### 2.3.3 .Tính năng suất của máy :

$$N = q \cdot \frac{k_d}{k_t} \cdot N_{ck} \cdot k_{tg} \quad (\text{m}^3/\text{h}); \text{ Trong đó:}$$

$q$ : dung tích gầu  $q = 0,25 \text{ m}^3$ ;

$k_d$ : hệ số đầy gầu phụ thuộc vào loại gầu, cấp và độ ẩm của đất  $k_d=1$ ;

$k_t$ : hệ số tơi của đất  $k_t = 1,2$ ;

$N_{ck}$  : số chu kì trong 1 giờ:

$$N_{ck} = \frac{3600}{T_{ck}}$$

$$T_{ck} = t_{ck} \cdot k_{vt} \cdot k_{quay} \quad (\text{s})$$

$T_{ck}$  : thời gian của 1 chu kì.

$$t_{ck} = 20\text{s} \text{ khi góc quay } \varphi = 90^\circ.$$

$k_{vt}$  : hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy xúc.

Đổ đất lên thùng xe  $k_{vt} = 1,1$ .

$$k_{quay} = 1 \text{ khi } \varphi = 90^\circ.$$

$k_{tg}$  : hệ số sử dụng thời gian lấy bằng 0,7 .

$$N = 0,25 \cdot \frac{1,1}{1,2} \cdot \frac{3600}{20 \cdot 1,1} \cdot 0,7 = 26,25 \text{ m}^3/\text{h}.$$

### 2.3.4 Tính số nhân công và ca máy.

Theo định mức tính cho  $100 \text{ m}^3$  đất đào cấp I với  $q \leq 0,4 \text{ m}^3$  cần  $0,5$  công và  $0,482$  ca máy.Vậy cần:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+ Số công là:  $\frac{323,498}{100} \cdot 0,5 = 1,6$  công. Chọn 2 công.

+ Số ca máy là:  $\frac{323,498}{100} \cdot 0,482 = 1,559$  ca. Chọn 2 ca.

Số ngày ấn định là 2 ngày. Chọn 1 máy và 1 nhân công.

## 2.4. Thi công đài cọc và giằng móng.

### 2.4.1. Chuẩn bị:

+ Sửa lại hố móng cho bằng phẳng, tạo bậc để ngời thi công lên xuống

+ Đập bê tông đầu cọc để đoạn nhô lên khỏi đáy hố móng khoảng 20cm, cốt thép dọc trong cọc phải để hở một đoạn cỡ 35cm (nếu không đủ phải hàn nối thêm).

### 2.4.2. Đổ bê tông lót.

Bê tông lót là bê tông gạch vữa trong đó gạch vữa có kích thước 4 - 8cm đục sẵn vào móng còn vữa là vữa tam hợp cấp độ bền B11,5 đục trộn bằng tay và vận chuyển đến đổ vào đài. Bê tông đục đàm bằng đàm bàn 1 lần.

**Bảng 1 :** Khối lượng bê tông lót móng.

STT	Tên cấu kiện	Số l- ợng (m)	Kích th- ớc (m)	Kích thước lớp BT lót		Chiều cao BT lót (m)	Thể tích đài (m3)	Tổng thể tích (m3)
				Dài	Rộng			
1	M1	6	2.9x2.3	2.9	2.3	0.1	0.667	4.002
2	M2	6	6.3x1.8	6.3	1.8	0.1	1.134	6.804
3	M3	4	2.9x1.8	2.9	1.8	0.1	0.522	2.088
4	M4	2	4x1.8	4	1.8	0.1	0.72	1.44
5	M5	2	1.4x1.4	1.4	1.4	0.1	0.196	0.392
6	Giằng	1	0.7x0.5	98.07	0.5	0.1	4.9035	4.9035
<b>Tổng</b>								<b>19.6295</b>

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

**Bảng 2 :** Khối l-ợng bê tông đài móng và giằng móng.

ST T	Tên cấu kiện	Số l-ợng	Kích th- ớc móng (m)	Kích thước đài (m)		Chiều cao (m)	Thể tích đài (m3)	Tổng thể tích(m3)
				Dài	Rộng			
1	M1	6	2.7x2.1x0.9	2.7	2.1	0.9	5.103	30.618
2	M2	6	6.1x1.6x0.9	6.1	1.6	0.9	8.784	52.704
3	M3	4	2.7x1.6x0.9	2.7	1.6	0.9	3.888	15.552
4	M4	2	3.8x1.6x0.9	3.8	1.6	0.9	5.472	10.944
5	M5	2	1.2x1.2x0.5	1.2	1.2	0.9	1.296	2.592
6	Giằng	1	0.5x0.3	96.07	0.5	0.3	14.4105	14.4105
<b>Tổng</b>								<b>126.8205</b>

+Theo định mức tính cho 1 m<sup>3</sup> bê tông lót móng có bề rộng hố móng ≤ 250 cm  
đổ thủ công cần 1,42 công và 0,095 ca máy trộn 250l.Vậy cần:

-Số công là:  $19,6295 \cdot 1,42 = 27,87$  công

-Số ca máy là:  $19,6295 \cdot 0,095 = 1,864$  ca máy.

Số ngày ấn định là 1 ngày thì cần 2 máy trộn 250l và 28 nhân công.

+Với bê tông móng có bề rộng hố móng ≤ 250 cm, đổ bằng máy cần 0,89 công  
và 0,03 ca máy.Vậy cần:

-Số công là:  $126,8205 \cdot 0,89 = 112,87$  công.

-Số ca máy là:  $126,8205 \cdot 0,03 = 3,8$  ca máy.

Số ngày ấn định là 4 thì cần 29 nhân công và 1 máy.

## 2.5. Công tác ván khuôn.

2.5.1.Tính toán khối l-ợng ván khuôn.

**Bảng 3 :** Khối l-ợng ván khuôn móng.

STT	Tên cấu kiện	Số l-ợng	Chiều cao (m)	Kích thước ván khuôn (m)		Chu vi (m)	Khối l-ợng (m <sup>2</sup> )
				Dài	Rộng		
1	M1	6	0.9	2.7	2.1	9.6	51.84
2	M2	6	0.9	6.1	1.6	15.4	83.16
3	M3	4	0.9	2.7	1.6	8.6	30.96
4	M4	2	0.9	3.8	1.6	10.8	19.44
5	M5	2	0.9	1.2	1.2	4.8	8.64
6	Giằng	1	0.5	96.07	0.3	192.74	96.37
<b>Tổng</b>							<b>290.41</b>

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

---

+Tổ ván khuôn tiến hành ghép từng tấm ván khuôn tại vị trí từng đài xong mới chuyển sang đài khác ; xong phân đoạn này mới chuyển sang phân đoạn khác.

+Ván khuôn ghép xong phải đảm bảo độ chắc chắn, ổn định; đảm bảo độ chính xác về kích th- ớc; đảm bảo độ kín khít ván, chiều dày lớp bảo vệ; đảm bảo đúng vị trí tim trực của đài giằng.

+Ván khuôn móng sử dụng ván khuôn định hình bằng thép, gông ngang Nittetsu.

+Căn cứ vào kích th- ớc đài móng chọn và tổ hợp ván khuôn có đặc tính kỹ thuật nh- sau :

Rộng (mm)	Dài (mm)	Cao (mm)	Mômen quán tính (cm4)	Mômen kháng uốn (cm3)
300	1.800	55	28,46	6,55
300	1.500	55	28,46	6,55
250	1.200	55	22,58	4,57
200	1.200	55	20,02	4,42
150	900	55	17,63	4,3
150	750	55	17,63	4,3
100	600	55	15,68	4,08

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc

Kiểu	Rộng (mm)	Dài (mm)
Tấm khuôn góc trong	150 × 150	1.800
	150 × 150	1.500
	100 × 150	1.200
	100 × 150	900
	100 × 150	751
	100 × 150	600
Tấm khuôn góc ngoài	100 × 100	1.800
	100 × 100	1.500
	100 × 100	1.200
	100 × 100	900
	100 × 100	751
	100 × 100	600

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

2.5.2.Tính toán ván khuôn đài móng.

Chọn tính toán đài móng M<sub>2</sub> có kích th- ớc 6,1x1.6x0.9 (m).

+Các tải trọng tác dụng lên ván khuôn đài móng.

- áp lực ngang do vữa bêtông ch- a ninh kết.

$$p_1^{t/c} = \gamma \times H = 2,5 \times 0,9 = 2,25 (\text{T/m}^2) = 2250 (\text{kg/m}^2)$$

$$P_1^t = n \times p_1^{t/c} = 1,1 \times 2250 = 2475 (\text{kg/m}^2)$$

-Tải trọng do đổ bêtông : đổ bằng máy bơm.

$$p_{02} = p_2^{t/c} = 600 \text{ kg/m}^2$$

$$p_2^t = n \times p_2^{t/c} = 1,3 \times 600 = 780 (\text{kg/m}^2)$$

-Tải trọng do đầm bêtông.

$$p_3^{t/c} = 200 \text{ kg/m}^2$$

$$p_3^t = 1,3 \times 200 = 260 (\text{kg/m}^2)$$

→ Tổng áp lực ngang tác dụng lên ván khuôn:


$$q^{t/c} = 2250 + 600 + 200 = 3050 (\text{kg/m}^2).$$

$$q^t = 2475 + 780 + 260 = 3515 (\text{kg/m}^2).$$

+Ván khuôn đ- ợc tính toán nh- đầm liên tục tựa trên các gối là các gông ngang, một cách gần đúng ta coi áp lực bêtông phân bố đều và có giá trị max là 3515 kg/m<sup>2</sup>. Khoảng cách giữa các nẹp ngang đ- ợc xác định từ điều kiện c-ờng độ và biến dạng của ván khuôn. Dùng ván khuôn có kích th- ớc 900x150x55, tải trọng phân bố đều trên ván khuôn là:

$$q^{t/c} = 3050 \times 0,15 = 457,5 (\text{kg/m}); q^t = 3515 \times 0,15 = 527,25 (\text{kg/m}).$$

+Sơ đồ tính:

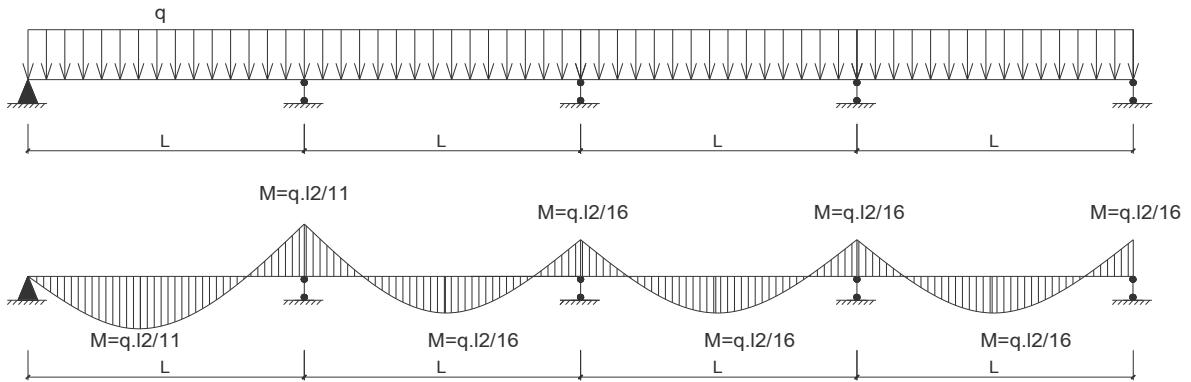

+Tính khoảng cách giữa các gông ngang của ván khuôn đài móng.

- Theo điều kiện bền:  $\sigma = \frac{M}{W} \leq [\sigma]$

M: mômen uốn lớn nhất trong dầm  $M = ql^2/11$

W: mômen chống uốn của ván khuôn  $W = 4,3 \text{ cm}^3$

J: mômen quán tính của ván khuôn  $J = 17,63 \text{ cm}^4$

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{q^t J^2}{11.W} \leq [\sigma] \rightarrow l \leq \sqrt{\frac{11.w.[\sigma]}{q^t}}$$

$$l \leq \sqrt{\frac{11.4,3.2100}{5,2725}} = 117,05 \text{ (cm)}$$

-Theo điều kiện biến dạng:

$$\text{Độ võng } f = \frac{q^{t/c} l^4}{128EJ} \leq [f] = \frac{1}{400}.$$

$$\rightarrow l \leq \sqrt[3]{\frac{128EJ}{400q^{t/c}}} = \sqrt[3]{\frac{128.2,1.10^6.17,63}{400 \times 13,65}} = 95,388 \text{ (cm)}$$

Vậy chọn khoảng cách giữa các gông ngang là 90 cm.

+Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng ván thành giằng móng.

Giằng móng có kích th- óc  $0,5 \times 0,3 \text{ m}$ . Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành giằng móng đ- ợc xác định t- ơng tự:

- áp lực do vữa bêtông:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$p_1^{tc} = \gamma \times h = 2500 \times 0,5 = 1250 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

$$p_1^t = n \times p_1^{tc} = 1,1 \times 1250 = 1375 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

-Tải trọng do đầm bêtông gây ra :

$$p_2^{tc} = 200 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

$$P_2^t = 1,3 \times 200 = 260 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

-Tải trọng do bơm bêtông gây ra

$$p_3^{tc} = 600 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

$$p_3^t = 1,3 \times 600 = 780 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

$$\rightarrow \sum p^{tc} = 1250 + 200 + 600 = 2050 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

$$\sum p^t = 1375 + 260 + 780 = 2415 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

Dùng ván khuôn có bề rộng b = 0,25m → tải trọng phân bố đều trên ván khuôn là:

$$q^{tc} = 2050 \cdot 0,25 = 512,5 \text{ (kg/m)}$$

$$q^t = 2415 \cdot 0,25 = 603,75 \text{ (kg/m)}$$

- Theo điều kiện bền  $\sigma = \frac{M}{W} \leq [\sigma]$

$$\rightarrow 1 \leq \sqrt{\frac{11 \cdot w \cdot [\sigma]}{q^t}} = \sqrt{\frac{11 \cdot 4,57 \cdot 2100}{6,0375}} = 112,76 \text{ (cm)}$$

- Theo điều kiện biến dạng:

$$f = \frac{q^{tc} l^4}{128EJ} \leq [f] = \frac{1}{400} \rightarrow 1 \leq \sqrt[3]{\frac{128EJ}{400q^{tc}}} = \sqrt[3]{\frac{128 \cdot 2,1 \cdot 10^6 \cdot 22,58}{400 \cdot 5,125}} = 143,59 \text{ (cm)}$$

Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 100 cm.

+Định mức cho công tác lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn kim loại là 31,76 công cho 100m<sup>2</sup> đài giàngh.Khối l- ợng ván khuôn là 290,41 m<sup>2</sup> nên cần số công là:

$$\frac{31,76 \cdot 290,41}{100} = 92,23 \text{ công.}$$

Số ngày ấn định là 4 ngày thì số công nhân công là:  $\frac{92,23}{4} = 21,05$  nhân công.

Chọn 22 nhân công.

## 2.6. Công tác cốt thép.

+Gia công cốt thép : Cốt thép cần đ- ợc gia công, cắt nối đúng hình dạng của thiết kế và phù hợp với qui phạm. Nơi gia công cốt thép cần phải bố trí sao cho các khâu gia công theo 1 dây chuyền thống nhất, linh hoạt :

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

-Kho chứa thép

-Bãi kéo thẳng cốt thép

-Nơi cắt cốt thép

-Nơi uốn cốt thép

-Lắp dựng cốt thép :

+Cốt thép vận chuyển đến vị trí từng thanh hoặc theo từng cấu kiện rồi mới buộc lại thành khung hoặc l- ống.

+Để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ cũng như- khoảng cách cốt thép ta cần có các biện pháp cố định cốt thép bằng các miếng kê hay buộc.Khi buộc cốt thép cần kiểm tra vị trí và khoảng cách cốt thép th-ờng xuyên.Thép chờ cột đ- ợc đặt sau khi đã đặt cốt thép giằng móng.Cốt thép cần đ- ợc cắt nối theo qui phạm và phù hợp với mặt bằng thực tế.

**Bảng 4 :** Khối l- ợng cốt thép móng.

STT	Tên cấu kiện	Số l- ợng	Khối l- ợng thép (kG)	Thể tích BT (m3)	Khối l- ợng 1 CK (kG)	Tổng khối l- ợng (kG)
1	M1	6	Lấy theo hàm l- ợng 0.2%.	5.10	80.12	480.70
2	M2	6	Lấy theo hàm l- ợng 0.2%.	8.78	137.91	827.45
3	M3	4	Lấy theo hàm l- ợng 0.2%.	3.89	61.04	244.17
4	M4	2	Lấy theo hàm l- ợng 0.2%.	5.47	85.91	171.82
5	M5	2	Lấy theo hàm l- ợng 0.2%.	1.30	20.35	40.69
6	Giằng	1	Lấy theo hàm l- ợng 0.2%.	14.41	226.24	226.24
<i>Tổng</i>						1991.08

Theo định mức tính cho 1 tấn cốt thép móng loại có đ- ờng kính  $\leq 18$  mm cần 8,34 công; 1,12 ca máy hàn 23 KW và 0,32 ca máy cắt uốn 5 KW.Vậy cần:

+Số công là:  $1,99108 \cdot 8,34 = 16,6$  công.

+Số ca máy hàn 23 KW:  $1,99108 \cdot 1,12 = 2,23$  ca.

+Số ca máy cắt uốn 5 KW:  $1,99108 \cdot 0,32 = 0,637$  ca.

Số ngày ấn định là 2 thì cần:

+Số nhân công là:  $16,6 / 2 = 8,3$ .Chọn 9 nhân công.

+Số máy hàn là:  $2,23 / 2 = 1,115$ .Chọn 2 máy.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+Số máy cát uốn:  $0,637/2=0,3365$ . Chọn 1 máy.

## 2.7. Công tác bê tông.

+Công tác đổ bê tông có thể dùng các biện pháp sau :

-Làm cầu công tác, vận chuyển bê tông đến nơi đổ bằng xe cút kít.

-Dùng cần trục tháp để đổ bê tông bằng các thùng chứa chuyên dụng.

-Dùng máy bơm bê tông bơm trực tiếp xuống hố móng.

-Phương pháp thứ nhất không tiện lợi vì mặt bằng công trình lớn, do đó việc làm cầu công tác sẽ rất tốn kém, đồng thời ảnh hưởng tới mặt bằng thi công các phân đoạn khác, thời gian thi công kéo dài.

-Phương pháp thứ hai áp dụng tốt, tuy nhiên không tận dụng được cần trục cho các công tác khác song song.

-Phương pháp thứ ba đảm bảo thời gian thi công nhanh, không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công, giải phóng được cần trục.

+Căn cứ vào sự phân tích so sánh trên ta chọn phương án sử dụng bê tông thường phẩm đ-ợc đ-a đến công trình bằng xe chuyên dụng và bơm đến hố móng bằng máy bơm bê tông.Bêtông thường phẩm đ-ợc chuyển đến bằng ôtô chuyên dụng, thông qua máng dẫn, bêtông đ-ợc đ-a vào thùng chứa rồi đ-ợc bơm lên theo ống bơm và trút ra tại vị trí cần đổ bêtông.

+Chọn máy đầm bê tông : chọn máy đầm dùi để đầm bê tông dài móng. Theo định mức thi công  $1 m^3$  bê tông móng cần  $0,089$  ca máy đầm dùi  $1,5$  KW. Vậy cần  $126,8205/0,089 = 11,287$  ca máy.Số ngày ấn định là 4 ngày thì cần 3 máy đầm dùi loại  $1,5$  KW.

+Biện pháp kỹ thuật :

-Đổ bê tông : chiều sâu hố móng  $h_{max} = 1,2m < [H] = 2m$ , bê tông đ-ợc phun trực tiếp từ xe vận chuyển xuống hố móng. Trong khi đổ phải kiểm tra lại vị trí cốt thép, chiều dày lớp bê tông bảo vệ, độ kín khít của ván khuôn và t-ối -ót ván khuôn.

-Bê tông đ-ợc đổ từng lớp dày khoảng  $30cm$  rồi tiến hành đầm ngay. Việc đổ bê tông phải liên tục, hết đài này mới chuyển sang đài khác.

-Trong khi đổ bê tông phải luôn kiểm tra lại vị trí cốt thép và ván khuôn.

-Đầm bê tông : để đảm bảo bê tông đổ xong đ-ợc đặc chắc, đồng đều cần đảm bảo thời gian đầm cần thiết và không bỏ sót. Thời gian đầm mỗi chỗ là  $30s$ , khoảng cách giữa các vị trí đầm không lớn hơn  $30cm$ . Khi đầm xong mỗi chỗ phải rút đầm lên từ từ và không tắt động cơ.

## **TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

### 2.8 Công tác d- ỡng hô bê tông.

+Bêtông sau khi đổ từ 4 đến 7 giờ cần đ- ợc t- ới n- ớc bảo d- ỡng ngay. Hai ngày đầu tiên thì cứ sau 2 giờ t- ới n- ớc một lần. Các ngày sau đó thì cứ 3 đến 10 giờ t- ới n- ớc một lần tùy điều kiện thời tiết.

+Cần phải che chắn sao cho bêtông móng không chịu ảnh h- ưởng của thời tiết. Thời gian giữ độ ẩm cho bêtông móng ít nhất là 7 ngày.

### 2.9 Công tác tháo dỡ ván khuôn.

Do ván khuôn thành đài và thành giằng là những ván khuôn không chịu lực nên sau khi đổ bê tông đ- ợc 1 ngày có thể bắt đầu tháo dỡ ván khuôn. Trình tự tháo dỡ ng- ợc với trình tự lắp đặt, không làm vỡ bê tông, không làm h- hở ván khuôn.

#### 1.2.10.Công tác lắp đất hố móng.

Sau khi tháo ván khuôn đài và giằng móng, ta tiến hành lắp đất đến cao trình mặt đài, giằng.

Tính toán khối l- ợng đất đắp :

$$V_{đất\ lấp} = V_{đào} - V_{bê\ tông\ đài, giằng} - V_{bê\ tông\ lót}$$

$$\rightarrow V_{lấp} = 523,458 - 126,802 - 19,6295 = 377,0265 \text{ (m}^3\text{)}$$

Theo định mức cứ 1 m<sup>3</sup> thì cần 1,22 m<sup>3</sup> cát để lắp và 0,45 công.

+L- ợng cát cần dùng:  $1,22 \cdot 377,0265 = 459,97 \text{ (m}^3\text{)}$ .

+Số công cần thiết:  $0,45 \cdot 377,0265 = 169,66 \text{ công.}$

+Số ngày ấn định là 6 ngày thì số nhân công là  $169,66/6 = 28,28$ .

Chọn 29 nhân công.

## II. THI CÔNG PHẦN THÂN.

Lập biện pháp thi công cho cột, đầm, sàn, tầng 7.

### **1. Giải pháp công nghệ.**

#### 1.1.Chọn ván khuôn.

1.1.1 Ph- ơng án 1: Ván khuôn gỗ.

+ Ưu điểm:

- Dễ gia công, lắp ghép cũng nh- tháo dỡ.

- Dễ tạo hình và không bám dính bêtông.

- Là vật liệu truyền thống, nhẹ và đơn giản.

+ Nh- ợc điểm:

- Không bền, th- ờng chỉ dùng tối đa đ- ợc 3 lần nên rất kinh tế

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

- Tuổi thọ kém nên độ luân chuyển thấp, không thích hợp với nhà cao tầng cần có tần suất sử dụng nhiều lần.
- Khi tạo thành mảng lớn thì khả năng chịu lực yếu nên l-ợng đầm đỡ, cột chống nhiều, giá thành cao.

## 1.1.2. Ph- ơng án 2: Ván khuôn thép.

+ Ưu điểm:

- Có độ bền lớn, dùng đ- ợc nhiều lần.
- Có nhiều loại ván khuôn thép luân l- u diễn hình có thể tạo hình đa dạng và rất tiện lợi.
- Tháo lắp dễ dàng.

+ Nh- ợc điểm:

- Tốn thời gian cho việc tổ hợp ván khuôn theo hình dạng cấu kiện, đặc biệt là các cấu kiện có hình dạng phức tạp.
- Phải dùng thêm gỗ để lắp và những vị trí mà ván thép không thể đặt vào đ- ợc.
- Dễ bị dính bêtông, cần phải quét lớp chống dính.
- Trọng l- ợng lớn cần phải thi công cơ giới.

Nhân xét:

Đứng tr- ớc yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất n- ớc, ngành xây dựng cũng đang từng b- ớc hiện đại hóa công nghệ thi công cũng nh- các ph- ơng tiện máy móc trong thi công. Ván khuôn thép định hình đảm bảo đ- ợc các yêu cầu tiện lợi cho thi công, có thể đẩy nhanh tiến độ thi công lại tốn ít công, giá thành không cao nên cũng đảm bảo đ- ợc yêu cầu về kinh tế. Vì vậy, ta quyết định sử dụng ván khuôn thép định hình để thi công phần thân công trình.

## 2. Thiết kế cột, đầm, sàn.

### 2.1. Thiết kế cột .

#### 2.1.1. Thiết kế ván khuôn cột.

Ván khuôn cột gồm 4 mảnh ván khuôn liên kết với nhau bằng các chốt thép, đ- ợc giữ ổn định bởi các gông và cột chống xiên ở 4 mặt cột, các tấm ván khuôn đ- ợc tổ hợp trên cơ sở kích th- ớc cột.

Cột tầng 7 có tiết diện là 250x450. Chiều cao đố cột là  $3,6 - 0,7 = 2,9$  m. Tổ hợp ván khuôn thép gồm các loại 200x1200x55 và 250x1200x55

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn:

+Tải trọng do đố bêtông: với ph- ơng án đố bêtông bằng cần trực tháp

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

---

$$p_1^{t/c} = 400 \text{ kg/m}^2$$

$$p_1^t = n \times p_1^{t/c} = 1,3 \times 400 = 520 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

+ áp lực do đầm bêtông (sử dụng đầm dùi).

$$p_2^{t/c} = 200 \text{ kg/m}^2$$

$$p_2^t = 1,3 \times 200 = 260 \text{ kg/m}^2$$

+ áp lực ngang do bêtông khi ch- a đồng cứng:

$$p_3^{t/c} = 1,5.W_0 + 0,6.W_0.(H - 1,5)$$

Với  $W_0$  : trọng l- ợng của bêtông.  $W_0 = 2500 \text{ kg/m}^3$

H : Chiều cao đố cột  $H = 2,9 \text{ m}$ .

$$p_3^t = 1,5.2500 + 0,6.2500.(2,9 - 1,5) = 5850 \text{ kg/m}^2$$

$$p_3^t = n \times p_3^{t/c} = 1,1.5850 = 6435 \text{ kg/m}^2$$

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn là :

$$p^{t/c} = 400 + 200 + 5850 = 6450 \text{ kg/m}^2$$

$$p^t = 520 + 260 + 6435 = 7215 \text{ kg/m}^2$$


Tính với ván bề rộng 0,2m thì:

$$q^{t/c} = 6450. 0,2 = 1290 \text{ kg/m}$$

$$q^t = 7215. 0,2 = 1443 \text{ kg/m}$$

Coi ván khuôn cột nh- đầm liên tục tựa lên các gông ngang chịu tải trọng phân bố đều q. Khoảng cách các gông ngang là l.

Sơ đồ tính:

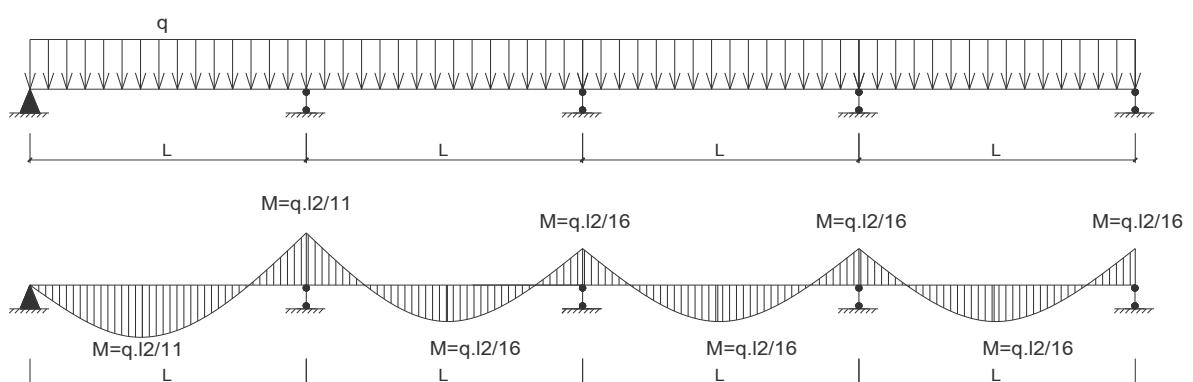

$$M_{max} = \frac{q^t l^2}{11}$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+Tính theo điều kiện bền:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{q''l^2}{11.W} \leq [\sigma] = 2100 \text{ kg/cm}^2$$

$$l \leq \sqrt{\frac{11.W.[\sigma]}{q''}} = \sqrt{\frac{11.4.42.2100}{14,43}} = 84,17 \text{ cm.}$$

+Tính theo điều kiện biến dạng:

$$f = \frac{q^{t/c}l^4}{128EJ} \leq [f] = \frac{1}{400} \rightarrow l \leq \sqrt[3]{\frac{128EJ}{400q^{t/c}}} = \sqrt[3]{\frac{128.2,1.10^6.20,02}{400.12,9}} = 101,41 \text{ cm}$$

Chọn khoảng cách giữa các gông ngang là 60 cm.

## 2.1.2. Lắp dựng ván khuôn cột.

Ván khuôn cột gồm những tấm ván khuôn thép định hình được chế tạo sẵn. Dùng cần trục hoặc vận chuyển thủ công tấm ván khuôn đến chân cột, gia công lắp ghép tấm hai tấm ván khuôn rời vào với nhau bằng hệ thống các bu lông.

Dựa vào l- ống trắc đạt chuẩn để xác định vị trí tim cột, l- ống trắc đạt này để xác lập nhờ máy kinh vĩ và th- ống thép.

Lắp dựng ván khuôn cột vào đúng vị trí thiết kế, cố định chân cột bằng khung định vị, sau đó dùng thanh chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh và cố định cột so cho thẳng đứng, đảm bảo độ ổn định của cột trong quá trình đổ bê tông.

## 2.1.3. Công tác bê tông cột.

Bê tông cột dùng loại bê tông th- ống phẩm cấp độ bền B15, bê tông đ- ợc vận chuyển về bằng các xe chở bê tông chuyên dụng, sau đó đ- ợc vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp.

### 2.1.3.1. Quy trình đổ bê tông cột.

Vệ sinh chân cột sạch sẽ, kiểm tra lại độ ổn định và độ thẳng đứng của cột lần cuối cùng trước khi đổ bê tông, t- ống n- ống xi măng vào chỗ gián đoạn nơi chân cột.

Lắp dựng hệ thống giàn giáo phục vụ đổ bê tông cột. Lắp ống voi để đổ bê tông, tránh hiện t- ượng phân tầng khi đổ bê tông.

Việc đầm bê tông đ- ợc tiến hành liên tục sau mỗi lần đổ, sử dụng máy đầm dùi kết hợp dùng búa gỗ gõ lên thành tấm ván khuôn phía ngoài.

### 2.1.3.2. Bảo d- ống bê tông và tháo ván khuôn cột.

Sau khi đổ bê tông nếu trời quá nắng hoặc mưa to ta phải che phủ ngay tránh hiện t- ượng bê tông thiếu n- ợc bị nứt chân chim hoặc rỗ bê mặt.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Đổ bê tông sau 8 đến 10 giờ tiến hành tưới nóc bảo dưỡng ngay. Trong hai ngày đầu cứ 2 đến 3 giờ phải tưới nóc một lần, sau đó cứ 3 đến 10 giờ tưới nóc một lần tùy theo điều kiện thời tiết. Bê tông phải đợt ợc bảo dưỡng giữ ẩm ít nhất 7 ngày đêm.

Tuyệt đối tránh rụng động hay va chạm trong thời gian bê tông nín kết. Trong quá trình bảo dưỡng nếu phát hiện bê tông có khuyết tật phải xử lý ngay.

Ván khuôn cột đợt ợc tháo sau 24 giờ, khi bê tông đạt cường độ  $50 \text{ kg/cm}^2$ . Với công trình này ta tháo ván khuôn cột sau khi đổ bêtông đợt ợc 48 giờ. Ván khuôn đợt ợc tháo theo trình tự từ trên xuống, phải tuân thủ các điều kiện kỹ thuật, tránh gây sứt vỡ góc cạnh cấu kiện. Sau khi tháo dỡ phải vệ sinh ván khuôn sạch sẽ, kê xếp ngăn nắp vào vị trí.

## 2.2. Tính ván khuôn, cột chống sàn.

### 2.2.1 Tính ván khuôn sàn.

Dùng ván khuôn định hình thép, kích thước  $200 \times 1200 \times 55 \text{ mm}$

$$J = 20,02 \text{ cm}^4; W = 4,42 \text{ cm}^3.$$

Xà gỗ nhóm V:  $R_u = 130 \text{ kg/cm}^2; E = 1,2 \cdot 10^5 \text{ kg/cm}^2$

+ Xà gỗ phụ bxh =  $8 \times 10 \text{ cm}$ .

+ Xà gỗ chính bxh =  $10 \times 12 \text{ cm}$ .

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn:

+ Sàn BTCT dày 10 cm.

$$p_1^{tc} = 0,1 \cdot 2500 = 250 \text{ kg/m}^2 = 0,250 \text{ T/m}^2.$$

$$P_1^{tt} = n \cdot p_1^{tc} = 1,1 \cdot 250 = 275 \text{ kg/m}^2.$$

+ Trọng lượng ván khuôn.

$$p_2^{tc} = 0,055 \cdot 7850 = 431,75 \text{ kg/m}^2 = 0,432 \text{ T/m}^2.$$

$$p_2^{tt} = n \times p_2^{tc} = 1,1 \cdot 0,432 = 0,475 \text{ T/m}^2$$

+ Tải trọng do đổ bêtông (đổ bằng máy bơm) và đầm bê tông.

$$P_3^{tc} = 600 \text{ kg/m}^2$$

$$P_3^{tt} = n \times p_2^{tc} = 1,3 \times 600 = 780 (\text{kg/m}^2)$$

+ Hoạt tải do người và dụng cụ thi công khác.

$$P_4^{tc} = 250 \text{ kg/m}^2 = 0,25 \text{ T/m}^2.$$

$$P_4^{tt} = n \cdot P_5^{tc} = 1,3 \cdot 250 = 325 \text{ kg/m}^2 = 0,325 \text{ T/m}^2.$$

→ Tổng áp lực ngang tác dụng lên ván khuôn:

$$q^{tc} = 250 + 431,75 + 600 + 250 = 1531,75 (\text{kg/m}^2).$$

$$q^{tt} = 275 + 475 + 780 + 325 = 1855 (\text{kg/m}^2).$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

---

Tính cho một dải có bề rộng 0,2 m.


$$q^{vc} = 1531.75.0,2 = 306,35 \text{ kg/m.}$$

$$q^t = 1855.0,2 = 371 \text{ kg/m.}$$

Tính cho ô sàn điển hình 4,5x6.3 m.

Gọi l là khoảng cách giữa các xà gỗ phụ, coi ván sàn là đầm liên tục đặt trên các xà gỗ phụ nh- là gối tựa chịu tải trọng phân bố đều q.

Sơ đồ tính:

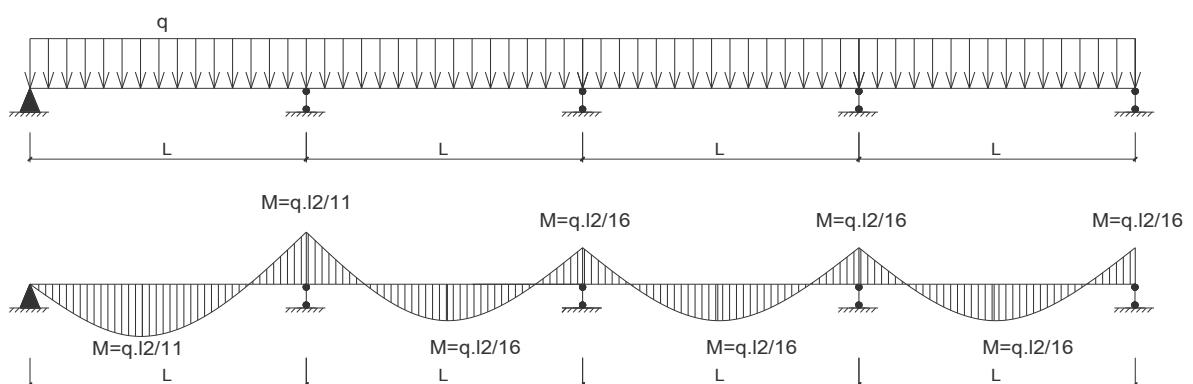

$$M = \frac{q.l^2}{11}$$

$$W = 4,42 \text{ cm}^4;$$

$$q^{vc} = 1531.75.0,2 = 306,35 \text{ kg/m.}$$

$$q^t = 1855.0,2 = 371 \text{ kg/m.}$$

+Tính theo điều kiện bên:

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{q.t^2 l^2}{11.W} \leq [\sigma] = 2100 \text{ kg/cm}^2.$$

$$l \leq \sqrt{\frac{11.4,42.2100}{3,71}} = 165,89 \text{ cm.}$$

+Tính theo điều kiện biến dạng:

$$f = \frac{q^{t/c} l^4}{128EJ} \leq [f] = \frac{1}{400} \rightarrow l \leq \sqrt[3]{\frac{128EJ}{400q^{t/c}}} = \sqrt[3]{\frac{128.2,1.10^6.20,02}{400.3,0635}} = 163,75 \text{ cm}$$

Chọn khoảng cách giữa các xà gỗ phụ là l = 60 cm.

2.2.2. Tính xà gỗ chính.

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+Xà gồ phụ đ- ợc kê lên các xà gồ chính, nhịp xà gồ chính là khoảng cách gián PAL bằng 1,2m. Xà gồ chính đ- ợc tính nh- dầm liên tục nhịp 1,2m chịu tải trọng phân bố đều.

$$q^{t/c} = 1531.1,2 = 1837,2 \text{ kg/m.}$$

$$q^t = 1855.1,2 = 2226 \text{ kg/m.}$$

$$W = \frac{b.h^2}{6} = \frac{10.12^2}{6} = 240 \text{ cm}^3.$$

$$J = \frac{b.h^3}{12} = \frac{10.12^3}{12} = 1440 \text{ cm}^4$$

+Tính theo điều kiện bén:

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{q \cdot t \cdot l^2}{11 \cdot W} \leq [\sigma] = 130 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma = \frac{22,26.120^2}{11.240} = 121,42 \text{ kg/cm}^2 < [\sigma] = 130 \text{ kg/cm}^2$$

+Tính theo điều kiện biến dạng:

$$f = \frac{q^{t/c} l^4}{128 E J} \leq [f] = \frac{1}{400} = 0,0025$$

$$f = \frac{18,37.120^4}{128.1,2.10^5.1440} = 0,0016 < [f].$$

### 2.2.3 Tính toán cột chống sàn.

+Lắp dựng hệ thống giáo PAL đỡ xà gồ chính. Xà gồ phụ đ- ợc gác lên xà gồ chính và liên kết với xà gồ chính bằng đinh 5 cm. Xà gồ đ- ợc đặt làm hai lớp, vì vậy phải căn chỉnh cao trình mõ giáo sao cho thật chính xác .

+Dùng các ván khuôn thép định hình có kích th- ớc 1200x200 đặt lên trên xà gồ. Trong quá trình lắp ghép ván sàn cần chú ý đến độ kín khít của các tấm ván, những chỗ nối ván phải tựa lên trên thanh xà gồ .

+Kiểm tra và điều chỉnh cao trình sàn nhờ hệ thống kính điều chỉnh ở đầu giáo.

Ta dùng dàn giáo hoàn thiện.

Chọn loại có khoảng cách l = 1200 mm để đỡ các xà gồ.

Tải trọng do ô bản truyền vào các xà gồ xuống giáo dạng tải trọng phân bố:

$$q = 1,885 \text{ T/m}^2$$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Bố trí 8 giáo PAL trên mặt bằng ô sàn 4,5x6,3. Diện tích của mỗi giáo là:

$$F = \frac{4,5 \times 6,3}{8} = 3,544 \text{ m}^2.$$

Tải trọng tác dụng lên 4 đầu giáo của mỗi giáo:

$$Q = \frac{3,544 \times 1,885}{4} = 1,66 \text{ T}$$

Tra bảng, có tải trọng cho phép là:  $[Q] = 5 \text{ T}$ , thỏa mãn điều kiện.

## 2.2.4. Công tác cốt thép và bê tông sàn.

+ Cốt thép đ- ợc đánh gỉ, làm vệ sinh sạch sẽ tr- ớc khi cắt uốn, sau đó đ- ợc cắt uốn theo đúng yêu cầu thiết kế.

+ Cốt thép đ- ợc vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp và đ- a vào vị trí lắp dựng. Sau đó rải thành l- ới theo đúng khoảng cách thiết kế, buộc bằng thép  $\varnothing 1$ .

+ Cốt thép phải đ- ợc lắp đặt đúng quy cách và đúng yêu cầu kĩ thuật .

+ Bê tông sàn đ- ợc vận chuyển lên cao và đổ bằng cần trục tháp toàn khối với bê tông dầm.

## 2.3. Tính ván khuôn, cột chống dầm.

### 2.3.1. Tính toán ván đáy dầm.

Bề rộng dầm dọc và ngang nhà đều là 220 mm. Ván đáy dầm đ- ợc dùng từ các tấm ván thép kích th- ớc 220x1200x55 mm, đ- ợc kê lên 2 thanh xà gồ tiết diện 50x100mm.

$$J = 22,58 \text{ cm}^4$$

$$W = 4,57 \text{ cm}^3$$

#### 2.3.1.1. Dầm dọc nhà.

Tải trọng tác dụng lên ván đáy dầm dọc (tính cho 1m dầm) gồm:

+ Tải trọng bản thân ván

$$p_1^{tc} = 0,22 \cdot 0,055 \cdot 7850 = 94,985 \text{ kg/m}$$

$$p_1^u = 1,1 \cdot 94,985 = 104,484 \text{ kg/m}$$

+ Tải trọng của bêtông cốt thép dầm

$$p_2^{tc} = 2500 \cdot 0,22 \cdot 0,4 = 220 \text{ kg/m}$$

$$p_2^u = 1,1 \cdot 220 = 242 \text{ kg/m}$$

+ Tải trọng do đổ và đầm bêtông:

$$p_3^{tc} = 600 \cdot 1 = 600 \text{ (kg/m)}$$

$$p_3^u = 1,3 \cdot 600 = 780 \text{ (kg/m)}$$

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn:

$$p^{tc} = 94,985 + 220 + 600 = 914,985 \text{ kg/m}$$

$$p^{tt} = 104,484 + 242 + 780 = 1126,48 \text{ kg/m}$$

Sơ đồ tính: coi ván đáy nh- dầm đơn giản tựa lên các cột chống với nhịp là 1.

+Tính theo điều kiện bén:

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{q \cdot t \cdot l^2}{11 \cdot W} \leq [\sigma] = 2100 \text{ kg/cm}^2.$$

$$l \leq \sqrt{\frac{11.4,57.2100}{11,26}} = 96,82 \text{ cm.}$$

+Tính theo điều kiện biến dạng:

$$f = \frac{q^{t/c} l^4}{128EJ} \leq [f] = \frac{1}{400} \rightarrow 1 \leq \sqrt[3]{\frac{128EJ}{400q^{t/c}}} = \sqrt[3]{\frac{128.2,1.10^6.22,58}{400.9,15}} = 118,36 \text{ cm}$$

Chọn khoảng cách giữa các cột chống dầm dọc là 60 cm.

### 2.3.1.2. Dầm ngang nhà.

Tải trọng tác dụng lên ván đáy dầm (tính cho 1m dầm) gồm:

+Tải trọng bản thân ván

$$p_1^{tc} = 0,22.0,055.7850 = 94,985 \text{ kg/m}$$

$$p_1^{tt} = 1,1 \cdot 94,985 = 104,484 \text{ kg/m}$$

+Tải trọng của bêtông cốt thép dầm

$$p_2^{tc} = 2500.0,22.0,7 = 385 \text{ kg/m}$$

$$p_2^{tt} = 1,1.385 = 462 \text{ kg/m}$$

+Tải trọng do đổ và đầm bêtông:

$$p_3^{tc} = 600 \cdot 1 = 600 \text{ (kg/m)}$$

$$p_3^{tt} = 1,3 \cdot 600 = 780 \text{ (kg/m)}$$

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn:

$$p^{tc} = 94,985 + 385 + 600 = 1079,985 \text{ kg/m}$$

$$p^{tt} = 104,484 + 462 + 780 = 1346,484 \text{ kg/m}$$

Sơ đồ tính: coi ván đáy nh- dầm đơn giản tựa lên các cột chống với nhịp là 1.

+Tính theo điều kiện bén:

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{q \cdot t \cdot l^2}{11 \cdot W} \leq [\sigma] = 2100 \text{ kg/cm}^2.$$

$$l \leq \sqrt{\frac{11.4,57.2100}{13,465}} = 88,54 \text{ cm.}$$

+Tính theo điều kiện biến dạng:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$f = \frac{q^{t/c} l^4}{128EJ} \leq [f] = \frac{1}{400} \rightarrow l \leq \sqrt[3]{\frac{128EJ}{400q^{t/c}}} = \sqrt[3]{\frac{128.2,1.10^6.22,58}{400.10,799}} = 112 \text{ cm.}$$

Chọn  $l = 60 \text{ cm.}$

Chống ván đáy dầm bằng giáo PAL. Để đảm bảo khoảng cách chống của ván đáy phải kê thêm xà gồ giữa các giáo PAL sao cho khoảng cách chống là 60 cm.

## 2.3.2. Tính toán ván thành dầm.

### 2.3.2.1. Ván thành dầm dọc.

Dầm dọc có kích th- ớc 220x400 mm. Ván thành dầm dọc là ván khuôn thép định hình loại 200x1200x55 có:

$$J = 20,02 \text{ cm}^4.$$

$$W = 4,42 \text{ cm}^3.$$

Coi ván thành nh- dầm liên tục tựa trên các gối tựa là các nẹp đứng chịu tải trọng phân bố đều  $q$ .

Các tải trọng tác dụng:

+áp lực ngang do vữa bêtông khi ch- a đông cứng :

$$p_1^{tc} = 2500 . 0,22 . 0,2 = 110 \text{ kg/m}$$

$$p_1^{tt} = n. p_1^{tc} = 1,1.110 = 121 \text{ kg/m}$$

+Hoạt tải do đổ bêtông : đổ bằng cần trực lấy  $p^{tc} = 400 \text{ kg/m}^2$

$$p_2^{tc} = 0,2.400 = 80 \text{ kg/m}$$

$$p_2^{tt} = 1,3.80 = 104 \text{ kg/m}$$

+Hoạt tải do đầm bêtông: đầm sâu bằng đầm dùi 200 kg/m<sup>2</sup>

$$P_3^{tc} = 0,2.200 = 40 \text{ kg/m}$$

$$P_3^{tt} = 1,3.40 = 52 \text{ kg/m}$$

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván thành:

$$q^{tc} = 110 + 80 + 40 = 230 \text{ kg/m}$$

$$q^{tt} = 121 + 104 + 52 = 277 \text{ kg/m}$$

Tính theo điều kiện b刎n.

$$\sigma_{max} = \frac{M}{W} = \frac{q^{tt} J^2}{11.W} \leq [\sigma] = 2100 \text{ kg/cm}^2$$

$$l \leq \sqrt{\frac{11.W.[\sigma]}{q^{tt}}} = \sqrt{\frac{11.4,42.2100}{2,77}} = 191,98 \text{ cm}$$

Tính theo điều kiện biến dạng.

Sinh viên: Phạm Xuân Thắng

Lớp: XD904

MSSV: 091440

Trang:133

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$f = \frac{q^{t/c} l^4}{128EJ} \leq [f] = \frac{1}{400} \rightarrow l \leq \sqrt[3]{\frac{128EJ}{400q^{t/c}}} = \sqrt[3]{\frac{128.2,1.10^6.20,02}{400.2,3}} = 180 \text{ cm}$$

Chọn khoảng cách các nẹp đứng ván thành dầm dọc là 60 cm vừa đảm bảo các điều kiện bền, điều kiện biến dạng lại vừa phù hợp với khoảng cách chống của ván đáy dầm.

## 2.3.2.2. Ván khuôn thành dầm khung.

Dầm khung có kích th- óc 220x700 mm. Ván thành dầm khung là ván khuôn thép định hình loại 200x1200x55mm có:  $J = 20,02 \text{ cm}^4$ ;  $W = 4,42 \text{ cm}^3$  và loại 250x1200x55 mm có:  $J = 22,58 \text{ cm}^4$ ;  $W = 4,57 \text{ cm}^3$ .

Lấy ván có khích thước nhỏ hơn để tính nên kết quả t- ơng tự nh- ván khuôn thành dầm dọc.

## 2.3.3. Trình tự lắp dựng ván khuôn dầm.

+Lắp dựng hệ giáo công tác phục vụ lắp dựng ván khuôn dầm .

+Cột chống đơn đ- ợc lắp dựng liên kết tr- óc với thanh ngang đỡ ván đáy dầm.

Sau đó đ- ợc dựng vào vị trí, điều chỉnh cao độ cho đúng theo thiết kế .

+Lắp ghép ván đáy dầm, các tấm ván khuôn đáy dầm phải đ- ợc lắp kín khít, đúng tim trực dầm theo thiết kế .

+Ván khuôn thành dầm đ- ợc lắp ghép sau khi công tác cốt thép dầm đ- ợc thực hiện xong. Ván thành dầm đ- ợc cố định bằng các nẹp đứng và các chống xiên. Để đảm bảo khoảng cách giữa hai ván thành , ta dùng các thanh chống ngang ở phía trên thành dầm , các thanh chống này đ- ợc bỏ đi khi đổ bê tông .

## 2.3.4. Công tác cốt thép và đổ bê tông dầm.

+Cốt thép đ- ợc đánh gi, làm vệ sinh sạch sẽ tr- óc khi cắt uốn, sau đó đ- ợc cắt uốn theo đúng yêu cầu thiết kế .

+Cốt thép đ- ợc vận chuyển lên cao bằng cần trực tháp và đ- a vào vị trí lắp dựng . Sau khi lắp xong ván đáy dầm, sàn, ta tiến hành lắp đặt cốt thép.Cốt thép phải đ- ợc lắp đặt đúng quy cách và đúng yêu cầu kĩ thuật .

+Bê tông dầm đ- ợc vận chuyển lên cao và đổ bằng cần trực tháp toàn khối với bê tông sàn .

## 3. Kỹ thuật thi công phần thân.


### 3.1. Công tác cốt thép

#### 3.1.1 Gia công cốt thép.

Tr- óc khi đ- a vào vị trí cần thực hiện các công tác chuẩn bị sau:

## **TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

- + Nắn thẳng và đánh rỉ cốt thép ( nếu cần ): Có thể dùng bàn chải sắt hoặc kéo qua kéo lại trên bàn cát để làm sạch rỉ. Ngoài ra còn có thể dùng máy cạo rỉ chạy điện để làm sạch cốt thép có đường kính > 12mm . Việc nắn cốt thép đ- ợc thực hiện nhờ máy nắn.
- + Nh- ng với cốt thép có đường kính nhỏ ( nhỏ hơn hoặc bằng 8mm ) thì ta dùng vam tay để uốn. Việc cạo rỉ cốt thép đ- ợc tiến hành sau công tác uốn cốt thép.
- +Cắt cốt thép: Lấy mức cắt cốt thép các thanh riêng lẻ thì dùng th- ớc bằng thép cuộn và đánh dấu bằng phấn. Dùng th- ớc dài để đo, tránh dùng th- ớc ngắn để phòng sai số tích luỹ khi đo.
- +Tr- ờng hợp máy cắt và bàn làm việc cố định, vạch dấu kích th- ớc lên bàn làm việc, nh- vậy thao tác thuận tiện tránh đ- ợc sai số. Hoặc có thể dùng một thanh mâu để đo cho tất cả các thanh khác giống nó.
- +Để cắt cốt thép dùng dao cắt nửa cơ khí, cắt đ- ợc các thanh thép có đường kính, 20mm . Máy này thao tác đơn giản, dịch chuyển dễ dàng, năng suất t- ơng đối cao.
- +Với các thanh thép có đường kính lớn, ta dùng máy cắt cốt thép để cắt.
- + Uốn cốt thép:Với các thanh thép có đường kính nhỏ dùng vam và thớt uốn để uốn. Thớt uốn đ- ợc đóng đinh cố định vào bàn gỗ để thi công.
- +Thao tác : Khi uốn các thanh thép phức tạp cần phải uốn thử. Tr- ớc tiên phải lấy dấu, l- u ý độ dãn dài của cốt thép. Khi uốn cần đánh dấu lên bàn uốn tùy theo kích th- ớc từng đoạn rồi căn cứ vào dấu đó để uốn.
- +Đối với các thanh có đường kính lớn thì phải dùng máy uốn. Nó có một thiết bị chủ yếu là mâm uốn. Mâm uốn làm bằng thép đúc, trên mâm có lỗ , lỗ giữa cắm trực tâm, lỗ xung quanh cắm trực uốn. Khi mâm quay trực tâm và trực uốn đều quay nhờ đó có thể nắn đ- ợc thép.

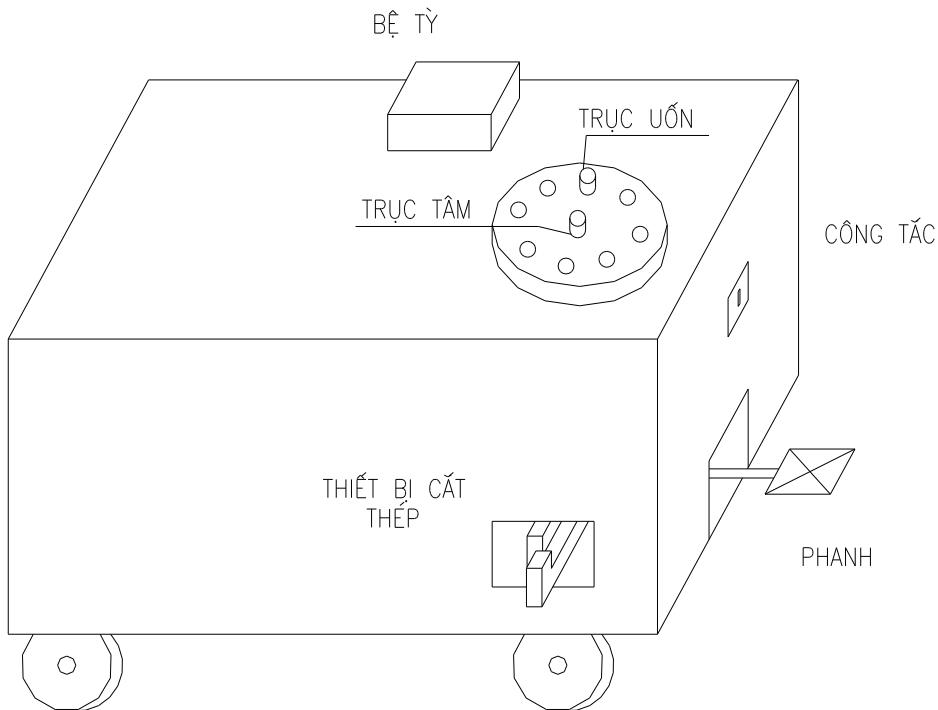

### 3.1.2 Đặt cốt thép cột:

+ Cốt thép đ- ợc gia công ở phía d- ối, cắt uốn theo đúng hình dạng kích th- ớc thiết kế. Xếp đặt bố trí theo từng chủng loại để thuận tiện cho thi công.

+ Để thi công cột thuận tiện, quá trình buộc cốt thép phải tiến hành tr- ớc khi ghép ván khuôn. Cốt thép đ- ợc buộc thành khung nhờ các dây thép mềm D=1mm. Sau đó dùng trục đ- a vào vị trí cần thiết. Định vị tạm thời khung thép bằng cột chống. Tiến hành hàn khung cốt thép vào những đoạn thép đã chờ sẵn, chú ý không để các đoạn nối trùng nhau trên một tiết diện. Các khoảng cách nối phải đảm bảo đúng kỹ thuật.

+ Để đảm bảo khoảng cách cần thiết cho các lớp bê tông bảo vệ cốt thép, dùng các miếng đệm hình vành khuyên cài vào các cốt đai. Khoảng cách giữa chúng khoảng 1m.

### 3.1.3 Đặt cốt thép dầm, sàn:

+ Việc đặt cốt thép dầm cần tiến hành xen kẽ với công tác ván khuôn. Sau khi đặt xong ván khuôn, cốt thép đã buộc sẵn thành khung đúng với yêu cầu thiết kế đ- ợc cần cẩu lắp vào đúng vị trí.

+ Việc buộc cốt thép tại vị trí thiết kế từ những thanh riêng rẽ chỉ áp dụng trong tr- ờng hợp đặc biệt.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+Thép sàn đ- ợc đ- a lên thành từng bó đúng chiều dài thiết kế và tiến hành ghép buộc ngay trên mặt sàn.

+Khi buộc xong cốt thép cần đặt các miếng kê để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

+Tr- ớc khi thực hiện các công tác cốt thép trên phải nghiệm thu ván khuôn.

## 3.2 .Công tác ván khuôn:

### 3.2.1 Chuẩn bị:

+Ván khuôn công cụ kích th- ớc bé phải là tập hợp các tấm khuôn có kích th- ớc không lớn lăm (phù hợp với khả năng tháo lắp bằng thủ công): các tấm có kích th- ớc khác nhau, khi lắp ghép với nhau có thể tạo thành khuôn cho các đối t- ợng của kết cấu công trình. Có các tấm chính và tấm phụ. Trong một bộ ván khuôn, đa số là các tấm chính với các kích th- ớc khác nhau, còn các tấm phụ chỉ dùng để ghép nối bổ sung vào những chỗ kích th- ớc bị lẻ khi lắp các tấm chính.

+Từ việc modun hoá kích th- ớc của kết cấu bê tông, có thể modun hoá kích th- ớc của tấm khuôn, tạo điều kiện thi công thuận lợi và hạ giá thành. Chiều dài và chiều rộng tấm khuôn lấy trên cơ sở hệ modun của thiết kế công trình.

+Khi lựa chọn các tấm khuôn, cần làm sao cho các tấm phụ có số l- ợng tối thiểu, còn số l- ợng các tấm chính không v- ợt quá 6-7 loại để tránh phức tạp khi chế tạo và thi công.

+Trên tấm khuôn phải bố trí hệ thống lỗ lắp ráp dùng cho việc liên kết ván khuôn.Cần có khả năng lắp, tháo cục bộ từng tấm khuôn, để "mở cửa" và "đóng cửa" phù hợp với yêu cầu công nghệ đổ bê tông.

Các tấm khuôn phải có khả năng ghép với nhau thành tấm lớn, đ- ợc gia cố vững chắc bằng hệ thống gông s- ờn đứng và ngang để tháo lắp bằng cơ giới.

Trong thực tế, công trình cần thi công rất đa dạng và modun kích th- ớc có thể khác nhau. Do vậy, cần chế tạo bộ ván khuôn công cụ kích th- ớc bé có tính chất đồng bộ về chủng loại để có đ- ợc tính "vạn năng" trong sử dụng.

### 3.2.2 Lắp dựng ván khuôn cột:

+Ván khuôn cột ghép sẵn thành từng tấm bằng kích th- ớc mặt cột, gồm 2 mảng trong và 2 mảng ngoài, liên kết giữa chúng bằng móc sắt.

+Chân cột có 1lỗ cửa nhỏ để làm vệ sinh tr- ớc khi đổ bê tông.

+Do đổ bằng cần trục tháp nên ở giữa thân cột không cần để lỗ cửa đổ bê tông.

+Chân cột dùng các nẹp ngang để đặt ván khuôn cột lên khung định vị.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

+Ván khuôn cột đ- ợc lắp sau khi đã đặt cốt thép cột. Lúc đầu ghép 3 mặt ván với nhau, đ- a vào vị trí mới ghép tấm ván còn lại.

+Để giữ cho ván khuôn ổn định, ta cố định chúng bằng giàn giáo.

+Để đ- a ván khuôn cột vào đúng vị trí thiết kế cần thực hiện theo các b- ớc sau:

-Xác định tim ngang và dọc của cột, vạch mặt cắt của cột lên nền, ghim khung định vị chân ván khuôn cột lên sàn.

- Ghép 3 mặt ván đã đóng với nhau vào vị trí, ghép tấm còn lại , chống sơ bộ , đợi kiểm tra tim và cạnh, chống và neo kĩ.

- Kiểm tra lại độ thẳng đứng để chuẩn bị đổ bê tông.

## 3.2.3 Lắp dựng ván khuôn dầm:

Việc lắp dựng ván khuôn dầm tiến hành theo các b- ớc:

+ Ghép ván khuôn dầm ngang nhà ( dầm khung).

+ Ghép ván khuôn dầm dọc (dầm giằng).

+ Ván khuôn dầm đ- ợc đỡ bằng hệ giáo thép.

- Đầu tiên đặt ván đáy dầm vào vị trí, điều chỉnh đúng cao độ tim, cốt rồi mới lắp ván thành.

- Ván thành đ- ợc có định bằng 2 thanh nẹp d- ới chân đóng ghim vào thanh ngang đầu cột chống. Tại mép trên ván thành đ- ợc ghép vào ván khuôn sàn. Khi không có sàn thì dùng thanh chéo chống xiên vào ván thành từ phía ngoài.

## 3.2.4 Lắp ván khuôn sàn:

+Sau khi lắp xong ván dầm mới tiến hành lắp ván sàn.

+Tr- ớc hết dựng hệ thống giáo PAL và các dầm đỡ ( xà gỗ ).

+Sau đó các ván khuôn sàn đ- ợc lát kín trên dầm đỡ.

+Kiểm tra lại độ thẳng bằng cao trình của sàn dựa vào th- ớc thuỷ bình.

## 3.3. Công tác đổ bê tông:

+Bê tông sử dụng ở đây là bê tông th- ơng phẩm trộn sẵn chở đến từ nhà máy trên những ôtô chuyên dụng. Chất l- ợng bê tông cần theo dõi chặt chẽ.

+Để vận chuyển bê tông lên cao, dùng máy bơm bê tông và cần trực tháp.

+Khi tiến hành công tác đổ bê tông cần tuân theo các yêu cầu chung nh- sau :

-Bê tông vận chuyển đến phải đổ ngay.

-Đổ bê tông từ trên cao xuống bắt đầu từ chỗ sâu nhất.

-Không đ- ợc để bê tông rơi tự do quá 2,5m.

-Chiều dày mỗi lớp đổ bê tông phải đảm bảo đầm thấu suốt để bê tông đặc chắc.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

-Bê tông phải đổ liên tục đổ tới đâu đầm ngay tới đó. Khi cần dừng, phải dừng quá trình đổ bê tông ở những mạch dừng đúng qui định.

Đối với từng cấu kiện cần phải có những l- u ý sau:

+ Đổ bê tông cột:

-Tr- ớc khi đổ phải hành dọn rửa sạch chân cột, đánh sờn bề mặt bê tông cũ rồi mới đổ.

- T- ới n- ớc ván khuôn.

- Kiểm tra lại ván khuôn.

- Bê tông đ- ợc đầm bằng đầm dùi, chiều dày mỗi lớp đầm từ 20 - 40cm, đầm lớp sau phải ăn sâu xuống lớp tr- ớc 5 - 10cm. Thời gian đầm tại một vị trí phụ thuộc vào máy đầm, khoảng 30 - 40 giây. Khi trong bê tông có n- ớc xi măng nổi lên là đ- ợc.

-Trong khi đổ bê tông có thể gõ nhẹ lên thành ván khuôn để tăng độ nén chặt của bê tông.

- Đổ bê tông cột cần bố trí các giáo cạnh cột để đổ bê tông.

+Đổ bê tông đầm sàn:

- Tr- ớc khi đổ bê tông sàn cần phải đánh dấu các cao độ đổ bê tông ( có thể bằng các mẫu gỗ có cao độ bằng chiều dày sàn, khi đổ qua thì rút bỏ) đảm bảo chiều dày thiết kế của sàn.


- Cũng nh- cột, khi đổ lớp bê tông mới lên lớp bê tông cũ thì phải đánh sờn, dọn rửa sạch mặt tiếp xúc giữa 2 lớp.

- Khi đổ bê tông không hắt theo h- ống tiến bê tông dễ bị phân tầng mà nên đổ từ xa đến gần lớp sau úp lên lớp tr- ớc tránh phân tầng.


- Trong nhà bê tông đổ theo h- ống dọc nhà vuông góc với dầm chính tránh tạo mạch ngừng trên dầm chính.

- Khi cần thiết phải dừng quá trình đổ bê tông phải dừng tại những vị trí qui định, có lực cắt nhỏ. Mạch ngừng để thẳng đứng.

MẠCH NGỪNG ĐỂ ĐỨNG




HƯỚNG ĐỔ BÊ TÔNG



# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

- Sau khi đổ bê tông xong, tiến hành bảo dưỡng bê tông sau 2-5 h bằng cách tưới nước giữ ẩm cho bê tông.
- Chỉ được phép đi lại trên bê tông khi bê tông đã đạt cường độ  $12 \text{ kg/cm}^2$  ( với  $t = 20^\circ\text{C}$  thì khoảng 24 h ).

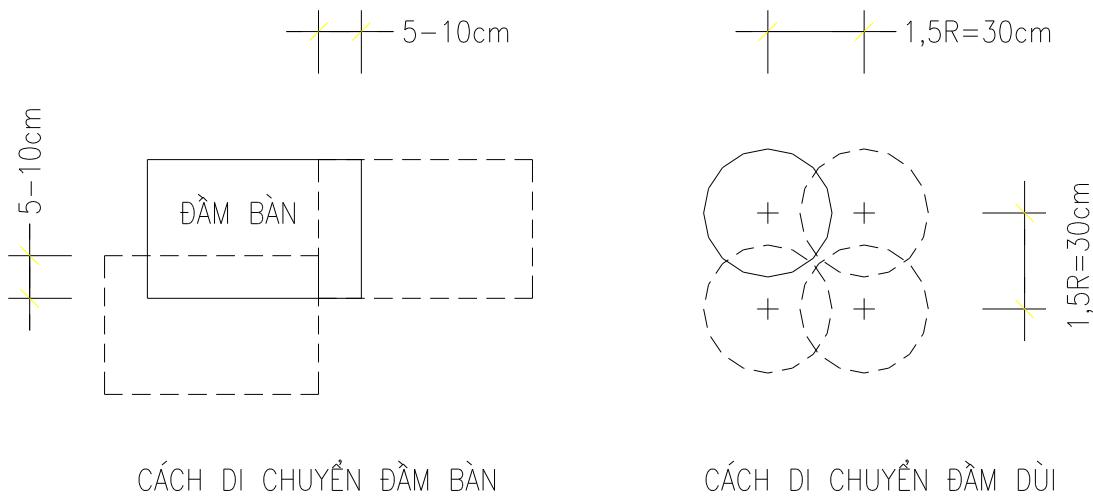

## 3.4. Công tác xây.

### 3.4.1. Tuyến công tác xây:


Công tác xây thường được tiến hành thi công theo phương ngang trong một tầng và theo phương đứng đối với các tầng.

Để đảm bảo năng xuất lao động cao của người thợ trong suốt thời gian làm việc, ta chia đội thợ xây thành từng tổ, sự phân công lao động trong các tổ đó phải phù hợp với đoạn cần làm.

Trên mặt bằng xây ở mỗi tầng ta đã chia thành các phân đoạn, những khi đi vào cụ thể ở mỗi phân đoạn cần chia ra các phân khu trong mỗi tuyến công tác cho từng thợ. Nhờ vậy sẽ phân chia đều đợc khối lượng công tác, các quá trình đợc thực hiện liên tục, nhịp nhàng, liên quan chặt chẽ đến nhau.

Các tuyến xây bố trí như sau:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

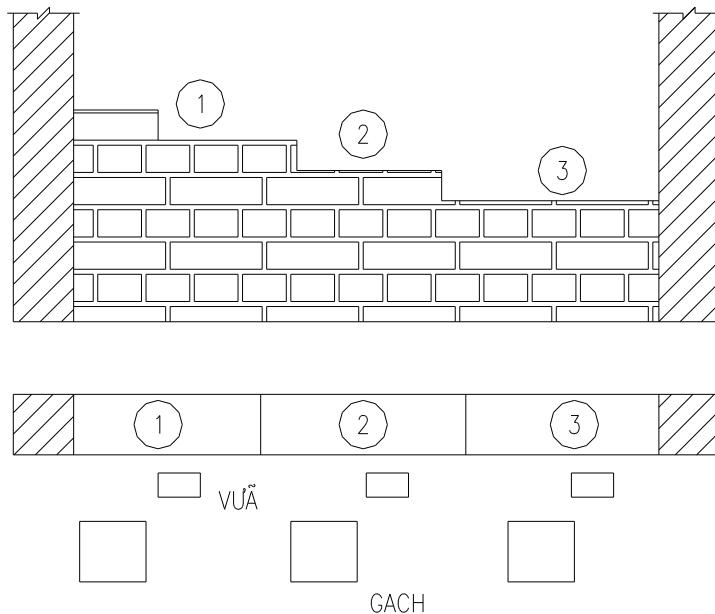

Các vị trí 1,2,3... là vị trí ng-ời thợ đứng xây. Mỗi một thợ phụ sẽ phục vụ vữa và gạch cho hai thợ cả. Gạch vữa đ-ợc máy chuyển đến từng tầng.

#### 2.3.4.2. Biện pháp kỹ thuật.

T-ờng xây cao từ 3,3- 4 m phải chia làm hai lần. Lần thứ nhất xây xong để vữa có thời gian khô và liên kết với gạch. Khối xây ổn định về co ngót mới tiếp tục xây lần hai. Nh- vậy bố trí giáo xây đ-ợc dễ dàng, thuận tiện.

Khối xây phải đảm bảo chắc chắn, mạch vữa phải đầy.

Các mỏ mốc phải ăn theo dây dọi, nhìn từ 2 phái phải vuông góc với nhau. Gạch bắt góc phải chọn viên tốt, vuông vắn đại diện cho chiều dày chung của góc.

Khi xây phải căng dây ở 2 mặt bên t-ờng, ốp th-ớc tâm để kiểm tra độ phẳng của 2 mặt t-ờng. Xây vài hàng phải kiểm tra độ ngang bằng của mặt lớp xây bằng nivô.

Xây không đ-ợc để trùng mạch, khi phát hiện ra phải sửa ngay.

#### 3.5. Công tát trát:

Việc hoàn thiện đ-ợc tiến hành từ trên xuống d-ới từ trong ra ngoài, đảm bảo khi hoàn thiện xong tầng d-ới cùng là có thể bàn giao đ-a công trình vào sử dụng.

Công việc trát t-ờng đ-ợc tiến hành sau công tác xây 3 ngày, thời gian đủ để ổn định khối xây và ráo mạch vữa.

Lớp trát phải bảo đảm yêu cầu không bong, vỡ phòng rộp, không đ-ợc có các chỗ sần sùi trên mặt.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Tr- óc khi trát phải t- ói ẩm mặt trát.

Trát làm 2 lớp, lớp đầu se mới trát lớp táp.

Đặt các mốc trên bê mặt trát để đảm bảo chiều dày của lớp trát đồng nhất theo đúng qui phạm kỹ thuật và bê mặt đ- ợc phẳng.

Cán bằng th- óc dày ít nhất 2m.

## 3.6.Công tác lát nền.

Lát nền đ- ợc thực hiện sau khi đã trát xong t- òng.

Khi lát phải đánh mốc ở 3 góc, - óm thử gạch vào, căng dây rồi mới lát.

Mạch vữa phải đảm bảo đều, nhỏ, các đ- ờng mạch phải đảm bảo thẳng đều và vuông góc với nhau.

Bê mặt sàn khi lát xong phải phẳng, có đủ độ dốc cần thiết muốn vậy khi lát phải liên tục kiểm tra độ ngang bằng bằng th- óc nivô.

## **4.Lựa chọn máy thi công.**

### 4.1. Chon cân trục tháp.

Đối với các công trình cao tầng việc lựa chọn thiết bị vận chuyển lên cao là rất quan trọng . Một trong những loại máy có thể thoả mãn các yêu cầu về chiều cao nâng , tầm với và đ- ợc sử dụng phổ biến là cân trục tháp . Những yếu tố ảnh h- ưởng đến việc lựa chọn cân trục là : mặt bằng thi công , hình dáng kích th- óc công trình , khối l- ợng vận chuyển , giá thành thuê máy .

+Tính toán khối l- ợng vận chuyển :

Cân trục tháp chủ yếu phục vụ cho công tác bê tông , cốt thép , ván khuôn . Vì thi công bê tông cột và thi công bê tông dầm sàn đ- ợc tổ chức thi công xen kẽ nhau nên khi tính toán khối l- ợng cho công tác bê tông ta chỉ tính cho khối l- ợng bê tông cần vận chuyển lớn nhất , còn công tác cốt thép và ván khuôn tính cả cho thi công cột , lõi thang máy , dầm và sàn . Xét tr- ờng hợp cân trục phục vụ cho cả ba công tác trên cùng một ngày.

- Khối l- ợng bê tông phục vụ lớn nhất trong một ca ứng với công tác đổ bê tông dầm sàn :

$$V_{bt} = 56,509/2 = 28.02 \text{ m}^3 \rightarrow \text{Khối l- ợng bê tông: } 28,02 \times 2,5 = 70,07 \text{ T}$$

- Khối l- ợng ván khuôn cần phục vụ trong một ca :  $G_{vk} = 11,6 \text{ T}$ .

- Khối l- ợng cốt thép tính cho một ca t- ơng ứng là:  $G_{ct} = 2,196 \text{ T}$ .

→ Nh- vậy tổng khối l- ợng cần vận chuyển cho một ca là :

$$G_{vc} = 70,7 + 11,6 + 2,196 = 84,496 \text{ T}$$

+Chọn cân trục tháp:

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Cần trục đ- ợc chọn phải đáp ứng đ- ợc các yêu cầu kỹ thuật thi công công trình.  
Các thông số lựa chọn cần trục: H, R, Q , năng suất cần trục.

- H : Độ cao nâng vật :  $H = H_0 + h_1 + h_2 + h_3$

Trong đó:

$H_0$  : chiều cao công trình .  $H_0 = 34$  m.

$h_1$  : khoảng cách an toàn lấy khoảng 1 m .

$h_2$  : chiều cao của thùng đổ bêtông lấy  $h_2 = 1,5$ m .

$h_3$  : chiều cao của thiết bị treo buộc lấy  $h_3 = 1,5$  m

Vậy :

$$H = 34 + 1 + 1,5 + 1,5 = 38 \text{ m}$$

- R : Bán kính nâng vật :

Cần trục đặt cố định ở giữa công trình, bao quát cả công trình nên bán kính đ- ợc tính khi quay tay cần đến vị trí xa nhất. Cần trục là loại quay tay cần , đối trọng ở trên cao và thay đổi tầm với bằng xe trục .

Tầm với yêu cầu :

$$R = \sqrt{m^2 + n^2} = \sqrt{13,7^2 + 20,3^2} = 24,24 \text{ m}$$

Trong đó :

$$m = L/2 + a + b_g = 12 + 0,5 + 1,2 = 13,7 \text{ m.}$$

$$n = B + a + b_g + b + 0,5d = 15,3 + 0,5 + 1,2 + 0,8 + 2,5 = 20,3 \text{ m.}$$

L : chiều dài công trình . L = 24 m .

B : chiều rộng công trình . B = 15,3 m .

a : khoảng cách từ mép công trình đến mép giáo a = 0,5 m.

bg: bề rộng của giáo, bg = 1,2m.

b : khoảng cách từ mép giáo đến mép khối bulông neo, b = 0,8m.

d : bề rộng của khối bulông neo chân cần trục . d = 5m.

Từ các thông số trên ta chọn loại cần trục tháp đầu quay hiệu CITY CRANE MC80 mã số P16A1( Hãng POTAIN - Pháp sản xuất ) với các thông số sau

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

---

:

Các thông số	Đơn vị tính	Giá trị
Chiều cao H	m	50
Vận tốc quay cần	vòng/phút	8
Vận tốc nâng vật	m/phút	33
Vận tốc xe	m/phút	58
Chiều dài tay cần Rmax	m	30
Trọng tải nhỏ nhất Q	T	1.6
Trọng tải lớn nhất Q0	T	5
Tổng công suất động cơ	kW	26,4

Tính năng suất của cần trục trong một ca:

Năng suất của cần trục đ- ợc tính theo công thức:

$$N = Q \times n_{ck} \times k_{tt} \times k_{tg} \times z .$$

Trong đó:

$n_{ck}$  : 3600 /T là Số lần cầu vật của cần trục.

$Q$  : sức nâng của cần trục .  $Q = 5$  (T)

$T$  : chu kì làm việc của cần trục .  $T = E \times \sum t_i$  .

$E$  : hệ số kết hợp đồng thời các động tác .  $E = 0,8$ .

$t_i$  : thời gian thực hiện thao tác i với vận tốc vi trên một đoạn di chuyển là si  $\rightarrow t_i = si/vi$  (s) .

$$\text{Thời gian nâng hạ} : tn/h = \frac{2 \times 49,3}{33} 60 = 180 \text{ (s)}.$$

$$\text{Thời gian quay cần} : tq = \frac{0,5}{8} 60 = 3,75 \text{ (s)}.$$

$$\text{Thời gian di chuyển xe con} : t_{xe} = \frac{48}{58} 60 = 49,66 \text{ (s)}.$$

Thời gian treo buộc tháo dỡ :  $t_{th} = tb = 60$  (s).

$$T = 0,8 \times (180 + 3,75 + 49,66 + 60 + 60) = 353,4 \times 0,8 = 282,72 \text{ (s)}.$$

$k_{tt} = 0,7$  – hệ số sử dụng tải trọng nâng .

$k_{tg} = 0,7$  – hệ số sử dụng thời gian .

$z$  : thời gian làm việc một ca .  $z = 8h$ .

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$\rightarrow N = \frac{3600}{282,72} \times 5 \times 8 \times 0,7 \times 0,7 = 249,57 \text{ tấn /ca} > N \text{ yêu cầu} = 70,07 \text{T/ca.}$$

Nh- vậy cần cầu đủ khả năng làm việc .

## 4.2 Chon vân thăng.

Sử dụng vân thăng PGX-800-16 có các thông số sau

Các thông số	Đơn vị tính	Giá trị
Chiều cao H	m	50
Vận tốc nâng vật	m/s	16
Trọng tải lớn nhất Q	Kg	800
Tầm với	m	1,3
Công suất động cơ	kW	3,1

## 5. Các bảng tính khối lượng cho toàn nhà.

Bảng 5.1. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG CỘT

Tầng	Cột	a(m)	b(m)	h(m)	Số l- ượng	V(m <sup>3</sup> )	V tầng (m <sup>3</sup> )
Tầng 1	A	0.6	0.35	3.7	6	4.66	18.02
	B	0.55	0.35	3.7	6	4.27	
	C	0.55	0.35	3.7	6	4.27	
	D	0.5	0.35	3.7	6	3.89	
	Cột Sảnh	0	0	3.7	2	0.93	
Tầng 2	A	0.6	0.35	2.9	6	3.65	14.13
	B	0.55	0.35	2.9	6	3.35	
	D	0.55	0.35	2.9	6	3.35	
	C4	0.5	0.35	2.9	6	3.05	
	Cột Sảnh	0	0	2.9	2	0.73	
Tầng 3,4	A	0.6	0.35	2.9	12	7.31	26.80
	B	0.55	0.35	2.9	12	6.70	
	C	0.55	0.35	2.9	12	6.70	
	D	0.5	0.35	2.9	12	6.09	
Tầng 5,6,7	A	0.5	0.22	2.9	18	5.74	21.25
	B	0.45	0.22	2.9	18	5.17	
	C	0.45	0.22	2.9	18	5.17	
	D	0.45	0.22	2.9	18	5.17	
Tầng 8,9	A	0.3	0.22	2.9	12	2.30	9.19
	B	0.3	0.22	2.9	12	2.30	
	C	0.3	0.22	2.9	12	2.30	
	D	0.3	0.22	2.9	12	2.30	
<b>Tổng</b>						<b>89.38</b>	

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

Bảng 5.2. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG DÂM

Tầng	Dâm	b(m)	h(m)	l(m)	Số l- ợng	V (m3)	V tầng(m3)	Tổng V(m3)
Tầng 2	Dâm dọc	0.22	0.4	4.5	20	0.396	7.92	23.18338
	Dâm khung	0.22	0.7	6.3	12	0.9702	11.6424	
	Dâm hành lang	0.22	0.3	2.7	6	0.1782	1.0692	
	Dâm chiếu tối	0.22	0.5	3.26	1	0.3586	0.3586	
	Dâm chiếu nghỉ	0.22	0.3	5.58	1	0.36828	0.36828	
	Dâm TM	0.22	0.5	6	2	0.66	1.32	
	Dâm VS1	0.11	0.3	6.3	1	0.2079	0.2079	
	Dâm VS2	0.11	0.3	4.5	2	0.1485	0.297	
Tầng 3÷mái	Dâm dọc	0.22	0.4	4.5	160	0.396	63.36	191.38064
	Dâm khung	0.22	0.7	6.3	96	0.9702	93.1392	
	Dâm hành lang	0.22	0.3	2.7	48	0.1782	8.5536	
	Dâm chiếu tối	0.22	0.5	3.26	8	0.3586	2.8688	
	Dâm chiếu nghỉ	0.22	0.3	5.58	8	0.36828	2.94624	
	Dâm TM	0.22	0.5	6	16	0.66	10.56	
	Dâm VS1	0.11	0.3	6.3	8	0.2079	1.6632	
	Dâm VS2	0.11	0.3	4.5	16	0.1485	2.376	
	Dâm congson	0.22	0.7	1.2	32	0.1848	5.9136	
<b>Tổng</b>								<b>214.56402</b>

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

---

Bảng 5.3. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG SÀN

Tầng	Sàn	B	L	$\delta$	Số l- ợng	V(m <sup>3</sup> )	V tầng(m <sup>3</sup> )	Tổng V(m <sup>3</sup> )
Tầng 2	O1	4.28	6.08	0.1	8	2.60224	20.81792	32.13961
	O2	4.28	2.48	0.1	4	1.06144	4.24576	
	O3	4.28	1.2	0.1	2	0.5136	1.0272	
	O4	5.78	2.48	0.1	1	1.43344	1.43344	
	O5	5.78	4.825	0.1	1	2.78885	2.78885	
	O6	5.78	0.98	0.1	1	0.56644	0.56644	
	Oth	-	-	0.1	1	1.26	1.26	
Tầng 3	O1	4.28	6.08	0.1	8	2.60224	20.81792	33.39961
	O2	4.28	2.48	0.1	4	1.06144	4.24576	
	O3	4.28	1.2	0.1	2	0.5136	1.0272	
	O4	5.78	2.48	0.1	1	1.43344	1.43344	
	O5	5.78	4.825	0.1	1	2.78885	2.78885	
	O6	5.78	0.98	0.1	1	0.56644	0.56644	
	Oth	-	-	0.1	1	1.26	1.26	
	Osanh	5.78	2.7	0.1	1	1.26	1.26	
Tầng 4÷9	O1	4.28	6.08	0.1	48	2.60224	124.9075	192.83766
	O2	4.28	2.48	0.1	24	1.06144	25.47456	
	O3	4.28	1.2	0.1	12	0.5136	6.1632	
	O4	5.78	2.48	0.1	6	1.43344	8.60064	
	O5	5.78	4.825	0.1	6	2.78885	16.7331	
	O6	5.78	0.98	0.1	6	0.56644	3.39864	
	Oth	-	-	0.1	6	1.26	7.56	
Tầng mái	O1	4.28	6.08	0.1	8	2.60224	20.81792	34.39385
	O2	4.28	2.48	0.1	4	1.06144	4.24576	
	O3	4.28	1.2	0.1	2	0.5136	1.0272	
	O4	5.78	2.48	0.1	1	1.43344	1.43344	
	O5	5.78	4.825	0.1	1	2.78885	2.78885	
	O6	5.78	0.98	0.1	1	0.56644	0.56644	
	O'th	5.78	6.08	0.1	1	3.51424	3.51424	
<b>Tổng</b>								<b>292.77073</b>

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

---

Bảng 5.4. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG CẦU THANG

CK	a	b	$\delta$	Số l- ợng	V(m <sup>3</sup> )	Tổng V(m <sup>3</sup> )
Chiều tối	1.5	2.82	0.1	9	0.423	3.807
Chiều nghỉ	1.5	2.82	0.1	9	0.423	3.807
Bản thang	1.25	3.5	0.1	18	0.4375	7.875
<i>Tổng</i>					1.2835	<b>15.489</b>

Bảng 5.5. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VÁN KHUÔN CỘT

Tầng	Cột	a(m)	b(m)	h(m)	Số l- ợng	S(m <sup>2</sup> )	S tầng (m <sup>2</sup> )
Tầng 1	A	0.6	0.35	3.7	6	42.18	169.13
	B	0.55	0.35	3.7	6	39.96	
	C	0.55	0.35	3.7	6	39.96	
	D	0.5	0.35	3.7	6	37.74	
	Cột Sảnh	0	0	3.7	2	9.29	
Tầng 2	A	0.6	0.35	2.9	6	33.06	132.56
	B	0.55	0.35	2.9	6	31.32	
	D	0.55	0.35	2.9	6	31.32	
	C4	0.5	0.35	2.9	6	29.58	
	Cột Sảnh	0	0	2.9	2	7.28	
Tầng 3,4	A	0.6	0.35	2.9	12	66.12	250.56
	B	0.55	0.35	2.9	12	62.64	
	C	0.55	0.35	2.9	12	62.64	
	D	0.5	0.35	2.9	12	59.16	
Tầng 5,6,7	A	0.5	0.22	2.9	18	75.17	285.01
	B	0.45	0.22	2.9	18	69.95	
	C	0.45	0.22	2.9	18	69.95	
	D	0.45	0.22	2.9	18	69.95	
Tầng 8,9	A	0.3	0.22	2.9	12	36.19	144.77
	B	0.3	0.22	2.9	12	36.19	
	C	0.3	0.22	2.9	12	36.19	
	D	0.3	0.22	2.9	12	36.19	
<i>Tổng</i>							<b>982.03</b>

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

---

Bảng 5.6. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VÁN KHUÔN DÂM

Tầng	Dâm	b(m)	h(m)	l(m)	Số l- ợng	S(m <sup>2</sup> )	S tầng (m <sup>2</sup> )	Tổng S ( m <sup>2</sup> )
Tầng 2	Dâm dọc	0.22	0.4	4.5	20	5.58	111.6	307.8756
	Dâm khung	0.22	0.7	6.3	12	11.59	139.104	
	Dâm hành lang	0.22	0.3	2.7	6	2.81	16.848	
	Dâm chiếu tối	0.22	0.5	3.26	1	4.69	4.6944	
	Dâm chiếu nghỉ	0.22	0.3	5.58	1	5.80	5.8032	
	Dâm TM	0.22	0.5	6	2	8.64	17.28	
	Dâm VS1	0.11	0.3	6.3	1	5.17	5.166	
	Dâm VS2	0.11	0.3	4.5	2	3.69	7.38	
Tầng 3÷mái	Dâm dọc	0.22	0.4	4.5	160	5.58	892.8	2533.6608
	Dâm khung	0.22	0.7	6.3	96	11.59	1112.832	
	Dâm hành lang	0.22	0.3	2.7	48	2.81	134.784	
	Dâm chiếu tối	0.22	0.5	3.26	8	4.69	37.5552	
	Dâm chiếu nghỉ	0.22	0.3	5.58	8	5.80	46.4256	
	Dâm TM	0.22	0.5	6	16	8.64	138.24	
	Dâm VS1	0.11	0.3	6.3	8	5.17	41.328	
	Dâm VS2	0.11	0.3	4.5	16	3.69	59.04	
	Dâm congson	0.22	0.7	1.2	32	2.21	70.656	
<b>Tổng</b>								<b>2841.5364</b>

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

---

Bảng 5.7. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VÁN KHUÔN SÀN

Tầng	Sàn	B	L	$\delta$	Số lượng	S(m <sup>2</sup> )	S tầng (m <sup>2</sup> )	Tổng S tầng (m <sup>2</sup> )
Tầng 2	O1	4.28	6.08	0.1	8	26.0224	208.1792	321.3961
	O2	4.28	2.48	0.1	4	10.6144	42.4576	
	O3	4.28	1.2	0.1	2	5.136	10.272	
	O4	5.78	2.48	0.1	1	14.3344	14.3344	
	O5	5.78	4.825	0.1	1	27.8885	27.8885	
	O6	5.78	0.98	0.1	1	5.6644	5.6644	
	Oth	-	-	0.1	1	12.6	12.6	
Tầng 3	O1	4.28	6.08	0.1	8	26.0224	208.1792	337.0021
	O2	4.28	2.48	0.1	4	10.6144	42.4576	
	O3	4.28	1.2	0.1	2	5.136	10.272	
	O4	5.78	2.48	0.1	1	14.3344	14.3344	
	O5	5.78	4.825	0.1	1	27.8885	27.8885	
	O6	5.78	0.98	0.1	1	5.6644	5.6644	
	Oth	-	-	0.1	1	12.6	12.6	
	Osanh	5.78	2.7	0.1	1	15.606	15.606	
Tầng 4÷9	O1	4.28	6.08	0.1	48	26.0224	1249.0752	1928.3766
	O2	4.28	2.48	0.1	24	10.6144	254.7456	
	O3	4.28	1.2	0.1	12	5.136	61.632	
	O4	5.78	2.48	0.1	6	14.3344	86.0064	
	O5	5.78	4.825	0.1	6	27.8885	167.331	
	O6	5.78	0.98	0.1	6	5.6644	33.9864	
	Oth	-	-	0.1	6	12.6	75.6	
Tầng mái	O1	4.28	6.08	0.1	8	26.0224	208.1792	343.9385
	O2	4.28	2.48	0.1	4	10.6144	42.4576	
	O3	4.28	1.2	0.1	2	5.136	10.272	
	O4	5.78	2.48	0.1	1	14.3344	14.3344	
	O5	5.78	4.825	0.1	1	27.8885	27.8885	
	O6	5.78	0.98	0.1	1	5.6644	5.6644	
	O'th	5.78	6.08	0.1	1	35.1424	35.1424	
<b>Tổng</b>							<b>2930.7133</b>	

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

---

Bảng 5.8. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VÁN KHUÔN CẦU THANG

CK	A	b	$\delta$	Số lượng	S(m <sup>2</sup> )	Tổng S(m <sup>2</sup> )
Chiếu tối	1.5	2.82	0.1	9	4.23	38.07
Chiếu nghỉ	1.5	2.82	0.1	9	4.23	38.07
Bản thang	1.25	3.5	0.1	18	4.375	78.75
<b>Tổng</b>					12.835	<b>154.89</b>

Bảng 5.9. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP CỘT

Tầng	Khối lượng thép trong 1m <sup>3</sup> bê tông(kg)	Thể tích BT	Tổng khối lượng(kg)
Tầng 1	75 kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông cột	18.02	1351.5
Tầng 2	75 kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông cột	18.02	1351.5
Tầng 3	75 kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông cột	14.13	1059.75
Tầng 4	75 kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông cột	13.4	1005
Tầng 5	75 kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông cột	13.4	1005
Tầng 6	75 kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông cột	7.08	531
Tầng 7	75 kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông cột	7.08	531
Tầng 8	75 kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông cột	4.59	344.25
Tầng 9	75 kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông cột	4.59	344.25
<b>Tổng</b>			<b>7523.25</b>

Bảng 5.10. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP DÂM

Tầng	Khối lượng thép trong 1m <sup>3</sup> bê tông(kg)	Thể tích BT	Tổng khối lượng(kg)
Tầng 2	55kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông dầm	23.18338	1275.0859
Tầng 3	55kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông dầm	23.9225	1315.7375
Tầng 4	55kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông dầm	23.9225	1315.7375
Tầng 5	55kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông dầm	23.9225	1315.7375
Tầng 6	55kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông dầm	23.9225	1315.7375
Tầng 7	55kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông dầm	23.9225	1315.7375
Tầng 8	55kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông dầm	23.9225	1315.7375
Tầng 9	55kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông dầm	23.9225	1315.7375
Tầng mái	55kg trong 1m <sup>3</sup> bê tông dầm	23.9225	1315.7375
<b>Tổng</b>			<b>11800.9859</b>

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

---

Bảng 5.11. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP SÀN

Tầng	Khối lượng thép trong 1m3 bê tông(kg)	Thể tích BT	Tổng khối l- ợng(kg)
Tầng 2	55 kg trong 1m3 bê tông sàn	32.1396	1767.678
Tầng 3	55 kg trong 1m3 bê tông sàn	33.399	1836.945
Tầng 4	55 kg trong 1m3 bê tông sàn	32.1396	1767.678
Tầng 5	55 kg trong 1m3 bê tông sàn	32.1396	1767.678
Tầng 6	55 kg trong 1m3 bê tông sàn	32.1396	1767.678
Tầng 7	55 kg trong 1m3 bê tông sàn	32.1396	1767.678
Tầng 8	55 kg trong 1m3 bê tông sàn	32.1396	1767.678
Tầng 9	55 kg trong 1m3 bê tông sàn	32.1396	1767.678
Tầng mái	55 kg trong 1m3 bê tông sàn	34.39385	1891.66175
<b>Tổng</b>			<b>16102.35275</b>

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

---

Bảng 5.12. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP CẦU THANG

Tầng	Khối lượng thép trong 1m3 bê tông(kg)	Thể tích BT	Tổng khối l- ợng(kg)
Tầng 1	55 kg trong 1m3 bê tông cầu thang	1.2835	70.5925
Tầng 2	55 kg trong 1m3 bê tông cầu thang	1.2835	70.5925
Tầng 3	55 kg trong 1m3 bê tông cầu thang	1.2835	70.5925
Tầng 4	55 kg trong 1m3 bê tông cầu thang	1.2835	70.5925
Tầng 5	55 kg trong 1m3 bê tông cầu thang	1.2835	70.5925
Tầng 6	55 kg trong 1m3 bê tông cầu thang	1.2835	70.5925
Tầng 7	55 kg trong 1m3 bê tông cầu thang	1.2835	70.5925
Tầng 8	55 kg trong 1m3 bê tông cầu thang	1.2835	70.5925
Tầng 9	55 kg trong 1m3 bê tông cầu thang	1.2835	70.5925
<b>Tổng</b>			<b>635.3325</b>

**CH- ƠNG 2.**  
**THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG.**

**I.MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA.**

Ngày nay, do sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các thành tựu khoa học công nghệ, các thiết bị máy móc cơ giới hoá hiện đại đ- ợc ứng dụng ngày càng rộng rãi trong ngành xây dựng góp phần nâng cao chất l- ợng công trình cũng nh- rút ngắn đ- ợc thời gian thi công công trình. Vì vậy , bên cạnh yếu tố chất l- ợng công trình, việc đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công công trình, đồng thời sử dụng các trang thiết bị máy móc, vật t- , nhân công một cách có hiệu quả để sớm đ- a công trình đi vào hoạt động, khai thác cũng là những yếu tố quan trọng đối với bất kì một công trình xây dựng nào. Tuy nhiên, để làm đ- ợc điều này chúng ta phải tiến hành lập đ- ợc một kế hoạch thi công công trình từ giai đoạn khởi công cho đến lúc hoàn thành, bàn giao và đ- a công trình vào sử dụng. Trong kế hoạch thi công đó, tất cả các công việc đều nằm trong các mối quan hệ ràng buộc với nhau, nhằm đảm bảo công trình đ- ợc thi công liên tục và đạt chất l- ợng, hiệu quả cao nhất .

Muốn đ- ợc nh- vậy thì ngay từ đầu chúng ta phải đ- a ra đ- ợc các giải pháp công nghệ hợp lí, thích hợp với các điều kiện thi công cụ thể để sao cho với công nghệ ấy có đ- ợc thời gian thi công là ngắn nhất.

**II.LỰA CHỌN PH-ƠNG ÁN LẬP TIẾN ĐỘ.**

Trong tổ chức xây dựng việc lập tiến độ là một vấn đề hết sức quan trọng và khó khăn. Việc lập tiến độ phụ thuộc và mặt bằng thi công công trình và biện pháp thi công, công nghệ thi công. Nếu chọn tiến độ thi công phù hợp sẽ tiết kiệm đ- ợc thời gian và nhân lực và sử dụng nhân lực một cách hợp lý nhất.

Có 3 ph- ơng án là lập tiến độ thi công công trình theo sơ đồ ngang, dây chuyền và sơ đồ mạng.

+Nếu chọn theo ph- ơng án sơ đồ ngang thì ta chỉ có thể biết về mặt thời gian mà không biết về không gian của tiến độ thi công. Nh- ng theo ph- ơng án này lại hợp với những mặt bằng thi công trung bình và nhỏ, tiện trong công việc sử dụng bê tông th- ơng phẩm và các ph- ơng tiện cơ giới khác. Tuy nhiên việc điều chỉnh nhân lực trong sơ đồ ngang là một vấn đề khó khăn.

+Nếu chọn theo ph- ơng án dây chuyền thì ta có thể biết cả về thời gian lẫn không gian của tiến độ thi công. Nh- ng theo ph- ơng án này rất khó bố trí nhân

## **TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

lực một cách điều hoà và liên tục nhất là trong các mặt bằng thi công trung bình và nhỏ cộng với việc sử dụng bê tông thường phẩm và máy bơm thì điều gần như không thể xảy ra.

+Còn sơ đồ mạng thì có thể điều hoà được các vấn đề trên như việc lập sơ đồ mạng lại tốn nhiều công sức và với những mặt bằng thi công trung bình và nhỏ là điều không cần thiết. Do đó trong phạm vi đồ án ta không chọn phương án này.

→ Qua các đánh giá sơ bộ trên ta nhận thấy việc chọn sơ đồ ngang là rất hợp lý với công trình này nên ta quyết định chọn phương án lập tiến độ thi công theo sơ đồ ngang.

### **III.CƠ SỞ LẬP TIẾN ĐỘ.**

Trên cơ sở tính toán khối lượng các công tác cho toàn nhà, dựa vào định mức thi công: định mức 24-1776-2007, tính ra số ngày công, ca máy, thời gian thực hiện. Dùng phần mềm PROJECT để lập tiến độ và biểu đồ nhân lực.

Đối đây là các công tác trong tiến độ thi công theo sơ đồ ngang.Ta đã ra khống lượng, định mức, ca máy, ngày công theo thứ tự từ phần ngầm đến phần thân, còn trình tự thời gian thực hiện các công việc được thể hiện chi tiết trong bản vẽ TC-04.

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

---

*Bảng III. TÍNH TOÁN SỐ LIỆU LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG*

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Định mức		Số ca máy	Số công	Số CN/ngày	Thời gian làm	Ghi chú
				Ca máy	Công					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b><i>Phần móng</i></b>									
3	Công tác ép cọc	m	2880	0.036	0.18	104	518.4	24.686	21	ĐM/100
4	Công tác đào đất bằng máy	m3	323.5	0.005	0.01	1.56	1.617	0.8087	2	ĐM/100
5	Công tác đào đất thủ công	m3	200	-	0.5	-	99.98	24.995	4	
6	Công tác phá đầu cọc	m3	64	0.3	0.6	19.2	38.4	9.6	4	
7	Công tác đổ bê tông lót móng	m3	19.63	0.095	1.42	1.86	27.87	27.874	1	
8	GC+LD cốt thép giằng+đài móng	Tấn	12.68	1.12	8.34	14.2	105.8	35.256	3	ĐM/100
9	GC+LD ván khuôn giằng+đài móng	m2	290.4	0.005	0.22	1.4	64.56	21.521	3	0.7*ĐM/100
10	Đổ bê tông giằng+đài móng	m3	126.8	0.03	0.89	3.8	112.9	56.435	2	
11	Dỡ ván khuôn móng	m2	290.4	0.002	0.1	0.6	27.67	27.67	1	0.3*ĐM/100
12	Xây t-ờng móng	m3	16.91	-	1.67	-	28.24	14.118	2	
13	Lắp đất hố móng thủ công	m3	377	-	0.45	-	169.7	28.277	6	
14	<b><i>Tầng 1</i></b>									
15	Gia công lắp dựng cốt thép cột	Tấn	1.352	1.49	8.48	2.01	11.46	11.461	1	

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

16	Gia công lắp dựng ván khuôn cột	m2	169.1	0.018	0.2	2.96	33.74	11.247	3	0.7*ĐM/100
17	Đổ bê tông cột	m3	18.02	-	3.49	-	62.89	62.89	1	
18	Dỡ ván khuôn cột	m2	169.1	0.008	0.09	1.27	14.46	14.461	1	0.3*ĐM/100
19	Gia công lắp dựng cốt thép đầm	Tấn	1.275	1.456	9.1	1.86	11.6	11.603	1	
20	Gia công lắp dựng ván khuôn đầm	m2	307.9	0.018	0.16	5.39	49.57	16.523	3	0.7*ĐM/100
21	Đổ bê tông đầm	m3	23.18	-	2.56	-	59.34	29.67	2	
22	Dỡ ván khuôn đầm	m2	307.9	0.008	0.07	2.31	21.24	21.243	1	0.3*ĐM/100
23	Gia công lắp dựng cốt thép sàn	Tấn	1.768	0.4	14.6	0.71	25.86	12.931	2	
24	Gia công lắp dựng ván khuôn sàn	m2	321.4	0.018	0.14	5.62	45	14.998	3	0.7*ĐM/100
25	Đổ bê tông sàn	m3	32.14	-	2.56	-	82.28	41.138	2	
26	Dỡ ván khuôn sàn	m2	321.4	0.008	0.06	2.41	19.28	19.284	1	0.3*ĐM/100
27	Bảo d- ống bê tông	-	-	-	-	-	-	1	1	
28	Xây t- ờng	m3	57.35	-	1.92	-	110.1	27.528	4	
29	Gia công lắp dựng cốt thép cầu thang	Tấn	0.071	0.4	18.1	0.03	1.28	1.2798	1	
30	Gia công lắp dựng ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.32	-	4.107	4.1072	1	0.7*ĐM/100
31	Đổ bê tông cầu thang	m3	1.284	-	2.56	-	3.286	3.2858	1	
32	Dỡ ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.14	-	1.758	1.7584	1	0.3*ĐM/100

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

33	Trát trần	m2	321.4	-	0.5	-	160.7	40.175	4	
34	Trát t-ờng trong	m2	310	-	0.22	-	68.19	22.73	3	
35	Trát cột	m2	169.1	-	0.57	-	96.4	32.135	3	
36	Lát nền	m2	321.4	-	0.15	-	48.21	24.105	2	Gạch 400x400
37	Sơn t-ờng	m2	310	-	0.07	-	20.46	10.228	2	1lót+2phủ
38	Lắp cửa	m2	132.8	-	0.48	-	63.09	21.031	3	Khuôn kép
39	<b>Tầng 2</b>									
40	Gia công lắp dựng cốt thép cột	Tấn	1.352	1.49	8.85	2.01	11.96	11.961	1	
41	Gia công lắp dựng ván khuôn cột	m2	132.6	0.018	0.2	2.32	26.45	8.8152	3	0.7*ĐM/100
42	Đỗ bê tông cột	m3	14.13	-	3.81	-	53.84	26.918	2	
43	Dỗ ván khuôn cột	m2	132.6	0.008	0.09	0.99	11.33	11.334	1	0.3*ĐM/100
44	Gia công lắp dựng cốt thép dầm	Tấn	1.316	1.456	9.1	1.92	11.98	11.976	1	
45	Gia công lắp dựng ván khuôn dầm	m2	316.7	0.018	0.16	5.54	50.99	16.996	3	0.7*ĐM/100
46	Đỗ bê tông dầm	m3	23.92	-	2.96	-	70.8	35.402	2	
47	Dỗ ván khuôn dầm	m2	316.7	0.008	0.07	2.38	21.85	21.852	1	0.3*ĐM/100
48	Gia công lắp dựng cốt thép sàn	Tấn	1.837	0.4	14.6	0.73	26.88	13.438	2	
49	Gia công lắp dựng ván khuôn sàn	m2	337	0.018	0.14	5.9	47.18	15.727	3	0.7*ĐM/100
50	Đỗ bê tông sàn	m3	33.39	-	2.96	-	98.83	49.417	2	
51	Dỗ ván khuôn sàn	m2	337	0.008	0.06	2.53	20.22	20.22	1	0.3*ĐM/100
52	Bảo d-ờng bê tông	-	-	-	-	-	-	1	1	

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

53	Xây t-ờng	m3	58.87	-	1.97	-	116	28.993	4	
54	Gia công lắp dựng cốt thép cầu thang	Tấn	0.071	0.4	18.5	0.03	1.307	1.3067	1	
55	Gia công lắp dựng ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.32	-	4.107	4.1072	1	0.7*ĐM/100
56	Đổ bê tông cầu thang	m3	1.284	-	2.96	-	3.799	3.7992	1	
57	Dỡ ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.14	-	1.758	1.7584	1	0.3*ĐM/100
58	Trát trần	m2	337	-	0.5	-	168.5	42.125	4	
59	Trát t-ờng trong	m2	362.2	-	0.22	-	79.69	26.564	3	
60	Trát cột	m2	132.6	-	0.57	-	75.56	25.186	3	
61	Lát nền	m2	337	-	0.15	-	50.55	25.275	2	Gạch 400x400
62	Sơn t-ờng	m2	362.2	-	0.07	-	23.91	11.954	2	1lót+2phủ
63	Lắp cửa	m2	155.2	-	0.48	-	73.74	24.58	3	Khuôn kép
64	<b>Tầng 3</b>									
65	Gia công lắp dựng cốt thép cột	Tấn	1.06	1.49	8.85	1.58	9.379	9.3788	1	
66	Gia công lắp dựng ván khuôn cột	m2	125.3	0.018	0.2	2.19	24.99	8.3311	3	0.7*ĐM/100
67	Đổ bê tông cột	m3	13.4	-	3.81	-	51.05	25.527	2	
68	Dỡ ván khuôn cột	m2	125.3	0.008	0.09	0.94	10.71	10.711	1	0.3*ĐM/100
69	Gia công lắp dựng cốt thép đầm	Tấn	1.316	1.456	9.1	1.92	11.98	11.976	1	
70	Gia công lắp dựng ván khuôn đầm	m2	316.7	0.018	0.16	5.54	50.99	16.996	3	0.7*ĐM/100
71	Đổ bê tông đầm	m3	23.92	-	2.96	-	70.8	35.402	2	
72	Dỡ ván khuôn	m2	316.7	0.008	0.07	2.38	21.85	21.852	1	0.3*ĐM/100

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

	dầm									
73	Gia công lắp dựng cốt thép sàn	Tấn	1.768	0.4	14.6	0.71	25.86	12.931	2	
74	Gia công lắp dựng ván khuôn sàn	m2	321.4	0.018	0.14	5.62	44.99	14.998	3	0.7*ĐM/100
75	Đỗ bê tông sàn	m3	32.14	-	2.96	-	95.13	47.566	2	
76	Dỡ ván khuôn sàn	m2	321.4	0.008	0.06	2.41	19.28	19.283	1	0.3*ĐM/100
77	Bảo d-õng bê tông	-	-	-	-	-	-	1	1	
78	Xây t-ờng	m3	66.1	-	1.97	-	130.2	32.556	4	
79	Gia công lắp dựng cốt thép cầu thang	Tấn	0.071	0.4	18.5	0.03	1.307	1.3067	1	
80	Gia công lắp dựng ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.32	-	4.107	4.1072	1	0.7*ĐM/100
81	Đỗ bê tông cầu thang	m3	1.284	-	2.96	-	3.799	3.7992	1	
82	Dỡ ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.14	-	1.758	1.7584	1	0.3*ĐM/100
83	Trát trần	m2	321.4	-	0.5	-	160.7	40.174	4	
84	Trát t-ờng trong	m2	389.5	-	0.22	-	85.68	28.561	3	
85	Trát cột	m2	125.3	-	0.57	-	71.41	23.803	3	
86	Lát nền	m2	321.4	-	0.15	-	48.21	24.104	2	Gạch 400x400
87	Sơn t-ờng	m2	389.5	-	0.07	-	25.7	12.852	2	1lót+2phủ
88	Lắp cửa	m2	166.9	-	0.48	-	79.28	26.427	3	Khuôn kép
89	<b>Tầng 4</b>									
90	Gia công lắp dựng cốt thép cột	Tấn	1.005	1.49	8.85	1.5	8.894	8.8943	1	
91	Gia công lắp dựng ván khuôn cột	m2	125.3	0.018	0.2	2.19	24.99	8.3311	3	0.7*ĐM/100

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

92	Đỗ bê tông cột	m3	13.4	-	3.81	-	51.05	25.527	2	
93	Dỗ ván khuôn cột	m2	125.3	0.008	0.09	0.94	10.71	10.711	1	0.3*ĐM/100
94	Gia công lắp dựng cốt thép dầm	Tấn	1.316	1.456	9.1	1.92	11.98	11.976	1	
95	Gia công lắp dựng ván khuôn dầm	m2	316.7	0.018	0.16	5.54	50.99	16.996	3	0.7*ĐM/100
96	Đỗ bê tông dầm	m3	23.92	-	2.96	-	70.8	35.402	2	
97	Dỗ ván khuôn dầm	m2	316.7	0.008	0.07	2.38	21.85	21.852	1	0.3*ĐM/100
98	Gia công lắp dựng cốt thép sàn	Tấn	1.768	0.4	14.6	0.71	25.86	12.931	2	
99	Gia công lắp dựng ván khuôn sàn	m2	321.4	0.018	0.14	5.62	44.99	14.998	3	0.7*ĐM/100
100	Đỗ bê tông sàn	m3	32.14	-	2.96	-	95.13	47.566	2	
101	Dỗ ván khuôn sàn	m2	321.4	0.008	0.06	2.41	19.28	19.283	1	0.3*ĐM/100
102	Bảo d- ồng bê tông	-	-	-	-	-	-	1	1	
103	Xây t- ờng	m3	66.1	-	1.97	-	130.2	32.556	4	
104	Gia công lắp dựng cốt thép cầu thang	Tấn	0.071	0.4	18.5	0.03	1.307	1.3067	1	
105	Gia công lắp dựng ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.32	-	4.107	4.1072	1	0.7*ĐM/100
106	Đỗ bê tông cầu thang	m3	1.284	-	2.96	-	3.799	3.7992	1	
107	Dỗ ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.14	-	1.758	1.7584	1	0.3*ĐM/100
108	Trát trần	m2	321.4	-	0.5	-	160.7	40.174	4	
109	Trát t- ờng trong	m2	389.5	-	0.22	-	85.68	28.561	3	

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

110	Trát cột	m2	125.3	-	0.57	-	71.41	23.803	3	
111	Lát nền	m2	321.4	-	0.15	-	48.21	24.104	2	Gạch 400x400
112	Sơn t-ờng	m2	389.5	-	0.07	-	25.7	12.852	2	1lót+2phủ
113	Lắp cửa	m2	166.9	-	0.48	-	79.28	26.427	3	Khuôn kép
114	<b>Tầng 5</b>									
115	Gia công lắp dụng cốt thép cột	Tấn	1.005	1.49	9.74	1.5	9.789	9.7887	1	
116	Gia công lắp dụng ván khuôn cột	m2	95	0.017	0.21	1.62	19.95	9.975	2	0.7*ĐM/100
117	Đổ bê tông cột	m3	7.08	-	4.19	-	29.67	14.833	2	
118	Dỡ ván khuôn cột	m2	95	0.008	0.09	0.71	8.55	8.55	1	0.3*ĐM/100
119	Gia công lắp dụng cốt thép dầm	Tấn	1.316	1.456	10.1	1.92	13.29	13.292	1	
120	Gia công lắp dụng ván khuôn dầm	m2	316.7	0.018	0.18	5.54	55.42	18.474	3	0.7*ĐM/100
121	Đổ bê tông dầm	m3	23.92	-	3.26	-	77.98	38.99	2	
122	Dỡ ván khuôn dầm	m2	316.7	0.008	0.08	2.38	23.75	23.753	1	0.3*ĐM/100
123	Gia công lắp dụng cốt thép sàn	Tấn	1.768	0.4	16.1	0.71	28.46	14.23	2	
124	Gia công lắp dụng ván khuôn sàn	m2	321.4	0.017	0.16	5.46	50.62	16.873	3	0.7*ĐM/100
125	Đổ bê tông sàn	m3	32.14	-	3.26	-	104.8	52.387	2	
126	Dỡ ván khuôn sàn	m2	321.4	0.008	0.07	2.41	21.69	21.694	1	0.3*ĐM/100
127	Bảo d-õng bê tông	-	-	-	-	-	-	1	1	
128	Xây t-ờng	m3	66.1	-	2.16	-	142.8	35.696	4	
129	Gia công lắp dụng cốt thép	Tấn	0.071	0.4	20.4	0.03	1.437	1.4373	1	

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

	cầu thang									
130	Gia công lắp dựng ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.32	-	4.107	4.1072	1	0.7*ĐM/100
130	Đổ bê tông cầu thang	m3	1.284	-	3.26	-	4.184	4.1842	1	
132	Dỡ ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.14	-	1.758	1.7584	1	0.3*ĐM/100
133	Trát trần	m2	321.4	-	0.5	-	160.7	40.174	4	
134	Trát t-òng trong	m2	389.5	-	0.22	-	85.68	28.561	3	
135	Trát cột	m2	95	-	0.57	-	54.15	18.05	3	
136	Lát nền	m2	321.4	-	0.15	-	48.21	24.104	2	Gạch 400x400
137	Sơn t-òng	m2	389.5	-	0.07	-	25.7	12.852	2	1lót+2phủ
138	Lắp cửa	m2	166.9	-	0.48	-	79.28	26.427	3	Khuôn kép
139	<b>Tầng 6</b>									
140	Gia công lắp dựng cốt thép cột	Tấn	0.531	1.49	9.74	0.79	5.172	5.1719	1	
141	Gia công lắp dựng ván khuôn cột	m2	95	0.017	0.21	1.62	19.95	9.975	2	0.7*ĐM/100
142	Đổ bê tông cột	m3	7.08	-	4.19	-	29.67	14.833	2	
143	Dỡ ván khuôn cột	m2	95	0.008	0.09	0.71	8.55	8.55	1	0.3*ĐM/100
144	Gia công lắp dựng cốt thép đầm	Tấn	1.316	1.456	10.1	1.92	13.29	13.292	1	
145	Gia công lắp dựng ván khuôn đầm	m2	316.7	0.018	0.18	5.54	55.42	18.474	3	0.7*ĐM/100
146	Đổ bê tông đầm	m3	23.92	-	3.26	-	77.98	38.99	2	
147	Dỡ ván khuôn đầm	m2	316.7	0.008	0.08	2.38	23.75	23.753	1	0.3*ĐM/100
148	Gia công lắp dựng cốt thép	Tấn	1.768	0.4	16.1	0.71	28.46	14.23	2	

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

	sàn									
149	Gia công lắp dựng ván khuôn sàn	m2	321.4	0.017	0.16	5.46	50.62	16.873	3	0.7*ĐM/100
150	Đổ bê tông sàn	m3	32.14	-	3.26	-	104.8	52.387	2	
151	Dỡ ván khuôn sàn	m2	321.4	0.008	0.07	2.41	21.69	21.694	1	0.3*ĐM/100
152	Bảo d- ống bê tông	-	-	-	-	-	-	1	1	
153	Xây t- ờng	m3	66.1	-	2.16	-	142.8	35.696	4	
154	Gia công lắp dựng cốt thép cầu thang	Tấn	0.071	0.4	20.4	0.03	1.437	1.4373	1	
155	Gia công lắp dựng ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.32	-	4.107	4.1072	1	0.7*ĐM/100
156	Đổ bê tông cầu thang	m3	1.284	-	3.26	-	4.184	4.1842	1	
157	Dỡ ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.14	-	1.758	1.7584	1	0.3*ĐM/100
158	Trát trần	m2	321.4	-	0.5	-	160.7	40.174	4	
159	Trát t- ờng trong	m2	389.5	-	0.22	-	85.68	28.561	3	
160	Trát cột	m2	95	-	0.57	-	54.15	18.05	3	
160	Lát nền	m2	321.4	-	0.15	-	48.21	24.104	2	Gạch 400x400
162	Sơn t- ờng	m2	389.5	-	0.07	-	25.7	12.852	2	1lót+2phủ
163	Lắp cửa	m2	166.9	-	0.48	-	79.28	26.427	3	Khuôn kép
164	<i>Tầng 7</i>									
165	Gia công lắp dựng cốt thép cột	Tấn	0.531	1.49	9.74	0.79	5.172	5.1719	1	
166	Gia công lắp dựng ván khuôn cột	m2	95	0.017	0.21	1.62	19.95	9.975	2	0.7*ĐM/100
167	Đổ bê tông cột	m3	7.08	-	4.19	-	29.67	14.833	2	
168	Dỡ ván khuôn cột	m2	95	0.008	0.09	0.71	8.55	8.55	1	0.3*ĐM/100

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

169	Gia công lắp dựng cốt thép dầm	Tấn	1.316	1.456	10.1	1.92	13.29	13.292	1	
170	Gia công lắp dựng ván khuôn dầm	m2	316.7	0.018	0.18	5.54	55.42	18.474	3	0.7*ĐM/100
171	Đổ bê tông dầm	m3	23.92	-	3.26	-	77.98	38.99	2	
172	Dỡ ván khuôn dầm	m2	316.7	0.008	0.08	2.38	23.75	23.753	1	0.3*ĐM/100
173	Gia công lắp dựng cốt thép sàn	Tấn	1.768	0.4	16.1	0.71	28.46	14.23	2	
174	Gia công lắp dựng ván khuôn sàn	m2	321.4	0.017	0.16	5.46	50.62	16.873	3	0.7*ĐM/100
175	Đổ bê tông sàn	m3	32.14	-	3.26	-	104.8	52.387	2	
176	Dỡ ván khuôn sàn	m2	321.4	0.008	0.07	2.41	21.69	21.694	1	0.3*ĐM/100
177	Bảo d- ống bê tông	-	-	-	-	-	-	1	1	
178	Xây t- ờng	m3	66.1	-	2.16	-	142.8	35.696	4	
179	Gia công lắp dựng cốt thép cầu thang	Tấn	0.071	0.4	20.4	0.03	1.437	1.4373	1	
180	Gia công lắp dựng ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.32	-	4.107	4.1072	1	0.7*ĐM/100
181	Đổ bê tông cầu thang	m3	1.284	-	3.26	-	4.184	4.1842	1	
182	Dỡ ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.14	-	1.758	1.7584	1	0.3*ĐM/100
183	Trát trần	m2	321.4	-	0.5	-	160.7	40.174	4	
184	Trát t- ờng trong	m2	389.5	-	0.22	-	85.68	28.561	3	
185	Trát cột	m2	95	-	0.57	-	54.15	18.05	3	
186	Lát nền	m2	321.4	-	0.15	-	48.21	24.104	2	Gạch 400x400

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

187	Sơn t-ờng	m2	389.5	-	0.07	-	25.7	12.852	2	1lót+2phủ
188	Lắp cửa	m2	166.9	-	0.48	-	79.28	26.427	3	Khuôn kép
189	<i>Tầng 8</i>									
190	Gia công lắp dựng cốt thép cột	Tấn	0.344	1.16	11.2	0.4	3.856	3.8562	1	
191	Gia công lắp dựng ván khuôn cột	m2	72.4	0.017	0.21	1.23	15.2	7.602	2	0.7*ĐM/100
192	Đổ bê tông cột	m3	4.6	-	4.19	-	19.27	9.637	2	
193	Dỡ ván khuôn cột	m2	72.4	0.008	0.09	0.54	6.516	6.516	1	0.3*ĐM/100
194	Gia công lắp dựng cốt thép đầm	Tấn	1.316	1.456	10.1	1.92	13.29	13.292	1	
195	Gia công lắp dựng ván khuôn đầm	m2	316.7	0.018	0.18	5.54	55.42	18.474	3	0.7*ĐM/100
196	Đổ bê tông đầm	m3	23.92	-	3.26	-	77.98	38.99	2	
197	Dỡ ván khuôn đầm	m2	316.7	0.008	0.08	2.38	23.75	23.753	1	0.3*ĐM/100
198	Gia công lắp dựng cốt thép sàn	Tấn	1.768	0.4	16.1	0.71	28.46	14.23	2	
199	Gia công lắp dựng ván khuôn sàn	m2	321.4	0.017	0.16	5.46	50.62	16.873	3	0.7*ĐM/100
200	Đổ bê tông sàn	m3	32.14	-	3.26	-	104.8	52.387	2	
201	Dỡ ván khuôn sàn	m2	321.4	0.008	0.07	2.41	21.69	21.694	1	0.3*ĐM/100
202	Bảo d-õng bê tông	-	-	-	-	-	-	1	1	
203	Xây t-ờng	m3	66.1	-	2.16	-	142.8	35.696	4	
204	Gia công lắp dựng cốt thép cầu thang	Tấn	0.071	0.4	20.4	0.03	1.437	1.4373	1	
205	Gia công lắp dựng ván	m2	12.84	-	0.32	-	4.107	4.1072	1	0.7*ĐM/100

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

	khuôn cầu thang								
206	Đỗ bê tông cầu thang	m3	1.284	-	3.26	-	4.184	4.1842	1
207	Dỡ ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.14	-	1.758	1.7584	1
208	Trát trần	m2	321.4	-	0.5	-	160.7	40.174	4
209	Trát t-òng trong	m2	389.5	-	0.22	-	85.68	28.561	3
210	Trát cột	m2	72.4	-	0.57	-	41.27	13.756	3
211	Lát nền	m2	321.4	-	0.15	-	48.21	24.104	2
212	Sơn t-òng	m2	389.5	-	0.07	-	25.7	12.852	2
213	Lắp cửa	m2	166.9	-	0.48	-	79.28	26.427	3
214	<b>Tầng 9</b>								
215	Gia công lắp dựng cốt thép cột	Tấn	0.344	1.16	11.2	0.4	3.856	3.8562	1
216	Gia công lắp dựng ván khuôn cột	m2	72.4	0.017	0.21	1.23	15.2	7.602	2
217	Đỗ bê tông cột	m3	4.6	-	4.19	-	19.27	19.274	1
218	Dỡ ván khuôn cột	m2	72.4	0.008	0.09	0.54	6.516	6.516	1
219	Gia công lắp dựng cốt thép đầm	Tấn	1.316	1.456	10.1	1.92	13.29	13.292	1
220	Gia công lắp dựng ván khuôn đầm	m2	316.7	0.018	0.18	5.54	55.42	18.474	3
221	Đỗ bê tông đầm	m3	23.92	-	3.26	-	77.98	38.99	2
222	Dỡ ván khuôn đầm	m2	316.7	0.008	0.08	2.38	23.75	23.753	1
223	Gia công lắp dựng cốt thép sàn	Tấn	1.891	0.4	16.1	0.76	30.45	15.223	2
224	Gia công lắp dựng ván	m2	321.4	0.017	0.16	5.46	50.62	16.873	3
									0.7*ĐM/100

**TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG**

	khuôn sàn									
225	Đổ bê tông sàn	m3	32.14	-	3.26	-	104.8	52.387	2	
226	Dỡ ván khuôn sàn	m2	321.4	0.008	0.07	2.41	21.69	21.694	1	0.3*ĐM/100
227	Bảo d- ống bê tông	-	-	-	-	-	-	1	1	
228	Xây t- ờng	m3	66.1	-	2.16	-	142.8	35.696	4	
229	Gia công lắp dựng cốt thép cầu thang	Tấn	0.071	0.4	20.4	0.03	1.437	1.4373	1	
230	Gia công lắp dựng ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.32	-	4.107	4.1072	1	0.7*ĐM/100
231	Đổ bê tông cầu thang	m3	1.284	-	3.26	-	4.184	4.1842	1	
232	Dỡ ván khuôn cầu thang	m2	12.84	-	0.14	-	1.758	1.7584	1	0.3*ĐM/100
233	Trát trần	m2	321.4	-	0.5	-	160.7	40.174	4	
234	Trát t- ờng trong	m2	389.5	-	0.22	-	85.68	28.561	3	
235	Trát cột	m2	72.4	-	0.57	-	41.27	13.756	3	
236	Lát nền	m2	321.4	-	0.15	-	48.21	24.104	2	Gạch 400x400
237	Sơn t- ờng	m2	389.5	-	0.07	-	25.7	12.852	2	1lót+2phủ
238	Lắp cửa	m2	166.9	-	0.48	-	79.28	26.427	3	Khuôn kép
239	<i>Phản mái+Hoàn thiện</i>									
240	Bê tông xỉ tạo dốc	m3	18.8	-	3.26	-	61.27	30.636	2	
241	Xi măng chống thấm	m2	375.9	-	0.11	-	39.84	19.922	2	Dày 3cm
242	Lát gạch chống nóng	m2	375.9	-	0.17	-	63.9	31.951	2	22x22x10,5
243	Xây t- ờng mái	m3	20.98	-	2.16	-	45.32	22.658	2	
244	Trát tòng mái phía trong	m2	95.38	-	0.22	-	20.98	20.983	1	

## TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

245	Trát t- ờng ngoài	m2	1892	-	0.32	-	605.3	30.266	20	
246	Sơn t- ờng ngoài	m2	1892	-	0.07	-	138.1	13.809	10	1lót+2phủ
247	Lắp điện n- ớc	-	-	-	-	-	-	8	5	
248	Dọn vệ sinh	-	-	-	-	-	-	4	1	

### IV. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG.

Tổng mặt bằng xây dựng là mặt bằng khu đất đ- ợc cấp để xây dựng và các mặt bằng lân cận khác mà trên đó bố trí các hạng mục công trình cần xây dựng, các máy móc thiết bị phục cho thi công. Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ nh- x- ờng gia công sản xuất, kho bã, lán trại, nhà làm việc, hệ thống giao thông, mạng l- ói cung cấp điện, n- ớc... phục vụ cho công tác thi công xây dựng cũng nh- cho đời sống của con ng- ời trên công tr- ờng.

Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng hợp lí sẽ góp phần đảm bảo xây dựng công trình đạt hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất l- ượng thi công, sớm đ- a công trình vào sử dụng.

#### 1. Đ- ờng trên công tr- ờng.

Công tr- ờng đ- ợc xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 1000m<sup>2</sup>. Khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị đến công tr- ờng là nhỏ nên ph- ơng tiện hợp lí hơn cả là ôtô. Vì vậy ta phải thiết kế đ- ờng ôtô chạy trong công tr- ờng .

Cần trực tháp đối trọng trên đ- ợc chọn có t- thế khi sử dụng là cố định trên mặt đất vì vậy không cần thiết kế đ- ờng ray chạy cho cầu trực mà chỉ cần thiết kế bê tông neo cho cần trực tại vị trí đứng của cần trực .

Đ- ờng ôtô chạy bao bốn mặt công trình. Để đảm bảo yếu tố kinh tế và cả yếu tố kĩ thuật ta tiến hành thiết kế mặt đ- ờng cấp thấp : xỉ than, xỉ quặng, gạch vỡ rải trên mặt đất tự nhiên rồi lu đầm kĩ. Do có xe ôtô chở thép, chiều dài xe là khá lớn nên bán kính cong tại các góc cua của xe phải đạt 5 m. Theo tiêu chuẩn thiết kế đ- ờng tạm cho một làn xe thì bề rộng đ- ờng phải đạt  $B \geq 4m$ .

Cần trực tháp có đối trọng trên đ- ợc bố trí tại vị trí chính giữa theo ph- ơng dọc công trình. Tay cần có tầm với bao quát đ- ợc mọi điểm trên công trình.

Khoảng cách từ trọng tâm quay của cần trực đến mép ngoài công trình là 5 m.

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

Vận thăng dùng để vận chuyển vật liệu rời, các nguyên vật liệu có trọng l- ợng nhỏ và kích th- ớc không lớn nh- gạch xây, gạch ốp lát, vữa xây... Thuận tiện nhất là bố trí vận thăng chở vật liệu tại những nơi gần với nơi chứa các loại vật liệu cần vận chuyển và xa so với cần trục tháp. Vậy bố trí vận thăng ở mép bên công trình và gần với kho chứa xi măng và vật liệu tổng hợp. Đối với vận thăng chở ng- ời phục vụ cho công tác thi công cũng bố trí ở mép bên công trình , gần với khu vực lán trại tạm của công nhân trên công tr- ờng.

## 2.Thiết kế kho bãi công tr- ờng.

Diện tích kho bãi tính theo công thức sau:

$$S = \alpha \cdot F = \frac{\alpha \cdot q_{dt}}{q} = \frac{\alpha \cdot t_{dt} \cdot q_{max}^{sd}}{q}$$

Trong đó :

F : diện tích cần thiết để xếp vật liệu ( $m^2$ ).

$\alpha$  : hệ số sử dụng mặt bằng , phụ thuộc loại vật liệu chứa .

$q_{dt}$  : l- ợng vật liệu cần dự trữ .

q : l- ợng vật liệu cho phép chứa trên  $1m^2$ .

$q_{max}^{sd}$ : l- ợng vật liệu sử dụng lớn nhất trong một ngày.

$t_{dt}$  : thời gian dự trữ vật liệu . Lấy  $t_{dt} = 10$  ngày

### 4.2.1.Tính toán khối l- ợng vật liệu dự trữ.

Công tác bêtông: sử dụng bêtông th- ơng phẩm nên bỏ qua diện tích kho bãi chứa cát, đá, sỏi, xi măng, phục vụ cho công tác này .

Tính toán cho các công tác còn lại .

-Công tác ván khuôn :  $q_{vk} = q_{đầm} + q_{sàn} = 638,09 \cdot 3 / 3 = 638,09 m^2$ .

-Công tác cốt thép :  $q_{ct} = q_{đầm} + q_{sàn} = 3,0827 T$

-Khối l- ợng cốt thép dự trữ là:  $\frac{3,0827 \cdot 10}{2} = 15,41 T$

-Công tác xây :  $q_{xây} = 66,104 m^3$ .

-Số l- ợng gạch xây là :  $\frac{66,104}{1,5015 \times 10^{-3}} = 44025$  viên.

-Số l- ợng gạch dự trữ là:  $\frac{44025 \cdot 3}{4} = 33019$  viên

-Vữa xây là:  $66,104 \cdot 0,29 = 19,14 m^3$ .

-Khối l- ợng vữa xây dự trữ là:  $\frac{19,14 \cdot 10}{4} = 47,85 m^3$ .

-Khối l- ợng vữa trát là :  $805,76 \cdot 0,025 = 20,144 m^3$ .

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

-Khối l-ợng vữa trát dự trữ là :  $\frac{20,144,10}{10} = 20,14 \text{ m}^3$ .

-Công tác lát nền :  $q_{lát\ nền} = \frac{321,39,10}{2} = 1606,95 \text{ m}^2$ .

-Khối l-ợng vữa lát nền dự trữ là :  $0,02 \cdot 1606,95 = 32,14 \text{ m}^3$ .

Vậy tổng khối l-ợng vữa dự trữ :  $p_{vữa\ dt} = 20,14 + 32,14 + 47,85 = 100,13 \text{ m}^3$

Tra bảng định mức cấp phối vữa ta có  $1\text{m}^3$  vữa tam hợp cát vàng mác 50# thì cần 243kg xi măng mác;  $0,892 \text{ m}^3$  cát vàng.

L-ợng xi măng dự trữ :  $100,13 \cdot 243 = 24331 \text{ kg} = 24,33 \text{ T}$ .

L-ợng cát dự trữ :  $100,13 \cdot 0,892 = 89,31 \text{ m}^3$ .

L-ợng gạch dự trữ : 30 019 viên.

L-ợng thép dự trữ : 9,248 T

L-ợng ván khuôn dự trữ :  $638,09 \text{ m}^2$ .

## 4.2.2. Diện tích các bãi.

-Diện tích kho xi măng:

$$S = \frac{1,2 \cdot 24,33}{1,3} = 22,45 \text{ m}^2$$

Trong đó:

q : L-ợng vật liệu cho phép chứa trên một mét vuông kho,  $q = 1,3 \text{T/m}^2$

$\alpha$ : Hệ số dùng vật liệu không điều hòa;  $\alpha = 1,2$ .

$q_{dt}$ : L-ợng xi măng dự trữ;  $q = 12,704 \text{ T}$

-Diện tích bãi cát:

$$S = \frac{1,1 \cdot 89,31}{2} = 49,12 \text{ m}^2$$

Trong đó :

q : L-ợng vật liệu cho phép chứa trên một mét vuông kho,  $q = 2 \text{T/m}^2$

$\alpha$ : Hệ số dùng vật liệu không điều hòa;  $\alpha = 1,1$ .

$q_{dt}$ : L-ợng cát dự trữ;  $q = 46,43 \text{ T}$

-Diện tích bãi gạch:

$$S = \frac{1,1 \cdot 30019}{700} = 47,2 \text{ m}^2$$

Trong đó :

q : L-ợng vật liệu cho phép chứa trên một mét vuông kho,  $q = 700 \text{ viên/m}^2$

$\alpha$ : Hệ số dùng vật liệu không điều hòa;  $\alpha = 1,1$ .

$q_{dt}$ : L-ợng gạch dự trữ;  $q = 30019 \text{ viên}$

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

-Kho ván khuôn:

$$S = \frac{1,3.638,09}{45} = 18,433 \text{ m}^2$$

Trong đó:

q : L- ợng vật liệu cho phép chứa trên một mét vuông kho, q = 45 m<sup>2</sup>/ m<sup>2</sup>

α: Hệ số dùng vật liệu không điều hoà; α = 1,3.

q<sub>dt</sub>: L- ợng ván khuôn dự trữ ; q = 638,09 T

-Kho thép.

$$S = \frac{1,3.15,41}{4} = 5 \text{ m}^2$$

Trong đó:

q : L- ợng vật liệu cho phép chứa trên một mét vuông kho, q = 4T/ m<sup>2</sup>

α: Hệ số dùng vật liệu không điều hoà; α = 1,3.

q<sub>dt</sub>: L- ợng thép dự trữ; q = 9,248 T

## 3.Tính toán lán trại công tr- ờng.

Dân số trên công tr- ờng : N = 1,06 × ( A+B+C+D+E)

Trong đó :

A: nhóm công nhân xây dựng cơ bản, tính theo số CN có mặt đồng nhất trong ngày theo biểu đồ nhân lực: A=109(ng- ời).

B : Số công nhân làm việc tại các x- ưởng gia công :

$$B = 30\%. A = 32 \text{ (ng- ời).}$$

C : Nhóm ng- ời ở bộ phận chỉ huy và kỹ thuật : C = 4÷8 % (A+B) .

Lấy C = 4 %. (A+B) = 4 %. (109 + 32) = 6 (ng- ời).

D : Nhóm ng- ời ở bộ phận hành chính : D = 4÷8 % (A+B +C) .

Lấy D = 4 %. (A+B+C) = 4 %. (109 + 32+6) = 6 (ng- ời).

E: Nhóm nhân viên phục vụ: E = 3% (A+B +C) = 3%. (109+32+6) = 5 (ng- ời)

Vậy tổng dân số trên công tr- ờng :

$$N = 1,06. (109+32+6+6+5) = 168(\text{ng- ời}).$$

Diện tích nhà làm việc cán bộ công tr- ờng : S<sub>1</sub> = 4 . 6 = 24 m<sup>2</sup>.

Diện tích nhà bảo vệ : S<sub>2</sub> = 10 (m<sup>2</sup>).

Diện tích nhà vệ sinh , nhà tắm : S<sub>3</sub> =  $\frac{2,5.109}{25} = 10,9 \text{ m}^2$

Diện tích nhà tạm cho công nhân đáp ứng cho 30% số công nhân:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$S_4 = 30\%.2.109 = 65.4 \text{ m}^2$$

Diện tích nhà hành chính :  $S_5 = 4.6 = 24 \text{ m}^2$ .

Diện tích trạm y tế :  $S_6 = N_{\max} \times 0,04 = 109. 0,04 = 4,36 (\text{m}^2)$ .

Diện tích nhà ăn :  $S_7 = 60 (\text{m}^2)$ .

## 4.Tính toán điện, n- ớc phục vụ công trình.

### 4.1.Tính toán cấp điện cho công trình.

Công thức tính công suất điện năng .

$$P = \alpha \times [ \sum k_1 \times P_1 / \cos\varphi + \sum k_2 \times P_2 + \sum k_3 \cdot P_3 + \sum k_4 \times P_4 ]$$

Trong đó :

$\alpha = 1,1$  : hệ số kể đến hao hụt công suất trên toàn mạch.

$\cos\varphi = 0,75$ : hệ số công suất trong mạng điện .

$P_1, P_2, P_3, P_4$ : lần l-ợt là công suất các loại động cơ, công suất máy gia công sử dụng điện 1 chiều, công suất điện thấp sáng trong nhà và công suất điện thấp sáng ngoài trời .

$k_1, k_2, k_3, k_4$  : hệ số kể đến việc sử dụng điện không đồng thời cho từng loại.

$-k_1 = 0,75$  : đối với động cơ .

$-k_2 = 0,75$  : đối với máy hàn cắt .

$-k_3 = 0,8$  : điện thấp sáng trong nhà .

$-k_4 = 1$  : điện thấp sáng ngoài nhà .

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

Bảng thống kê sử dụng điện :

P <sub>i</sub>	Điểm tiêu thụ	Công suất định mức	Khối lượng phục vụ	Nhu cầu dùng điện KW	Tổng nhu cầu KW
P <sub>1</sub>	Cần trục tháp	26,4 KW	1máy	26,4	41,2
	Thăng tải chở vật liệu	2,2 KW	1máy	2,2	
	Thăng tải chở ng-ời	3,1 KW	1máy	3,1	
	Máy trộn vữa	5,5 KW	1máy	5,5	
	Đầm dùi	1 KW	2máy	2	
	Đầm bàn	1 KW	2máy	2	
P <sub>2</sub>	Máy hàn	18,5 KW	1máy	18,5	22,2
	Máy cắt	1,5 KW	1máy	1,5	
	Máy uốn	2,2 KW	1máy	2,2	
P <sub>3</sub>	Điện sinh hoạt	13 W/ m <sup>2</sup>	62,4 m <sup>2</sup>	0,811	2,806
	Nhà làm việc , bảo vệ	13 W/ m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	0,702	
	Nhà ăn , trạm y tế	13 W/ m <sup>2</sup>	64,2 m <sup>2</sup>	0,834	
	Nhà tắm , vệ sinh	10 W/ m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>	0,11	
	Kho chứa VL	6 W/ m <sup>2</sup>	58,32 m <sup>2</sup>	0,349	
P <sub>4</sub>	Đ-ờng đi lại	5 KW/km	200 m	1	3,4
	Địa điểm thi công	2,4W/ m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	2,4	

Vậy :

$$P = 1,1 \times (0,75 \times 41,2 / 0,75 + 0,75 \times 22,2 + 0,8 \times 2,806 + 1 \times 3,4) = 70 \text{ KW}$$

## 4.2.Thiết kế mạng l-ới điện .

Chọn vị trí góc ít ng-ời qua lại trên công tr-ờng đặt trạm biến thế .

Mạng l-ới điện sử dụng bằng dây cáp bọc , nằm phía ngoài đ-ờng giao thông xung quanh công trình . Điện sử dụng 3 pha , 3 dây . Tại các vị trí dây dẫn cắt đ-ờng giao thông bố trí dây dẫn trong ống nhựa chôn sâu 1,5 m.

Chọn máy biến thế BT- 180 /6 có công suất danh hiệu 180 KWA.

Tính toán tiết diện dây dẫn :

- Đảm bảo độ sụt điện áp cho phép .

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

– Đảm bảo c-ờng độ dòng điện .

– Đảm bảo độ bền của dây .

Tiến hành tính toán tiết diện dây dẫn theo độ sụt cho phép sau đó kiểm tra theo 2 điều kiện còn lại .

+Tiết diện dây :

$$S = \frac{100 \sum P.l}{k.U_d^2 \cdot [\Delta U]}$$

Trong đó :

k = 57 : điện trở dây đồng .

U<sub>d</sub> = 380 V : Điện áp dây ( U<sub>pha</sub> = 220 V )

[ ΔU] : Độ sụt điện áp cho phép [ ΔU] = 2,5 (%)

$\sum P \times l$  : tổng mômen tải cho các đoạn dây .

Tổng chiều dài dây dẫn chạy xung quanh công trình L=120 m.

Điện áp trên 1m dài dây :

$$q = P / L = 70 / 120 = 0,58 \text{ KW/m}$$

$$\text{Vậy} : \sum P \times l = q \times L^2 / 2 = 4200 \text{ KW.m}$$

$$S = \frac{100 \sum P.l}{k.U_d^2 \cdot [\Delta U]} = \frac{100 \cdot 4200}{57 \cdot 380^2 \cdot 2,5} = 0,02 \text{ m}^2$$

Chọn dây đồng tiết diện 30 mm<sup>2</sup>

## 4.3.Tính toán cấp n- ợc cho công trình.

L- u l- ợng n- ợc tổng cộng dùng cho công trình .

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$$

Trong đó :

Q<sub>1</sub> : l- u l- ợng n- ợc sản xuất :  $Q_1 = \sum S_i \cdot A_i \cdot k_g / 3600 \times n$  (lít /s)

S<sub>i</sub> : khối l- ợng công việc ở các trạm sản xuất .

A<sub>i</sub> : định mức sử dụng n- ợc tính theo đơn vị sử dụng n- ợc .

k<sub>g</sub> : hệ số sử dụng n- ợc không điều hòa . Lấy k<sub>g</sub> = 1,5.

n : số giờ sử dụng n- ợc ngoài công trình, tính cho một ca làm việc, n= 8h .

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG

---

Bảng tính toán l-ợng n-ớc phục vụ cho sản xuất :

Dạng công tác	Khối l-ợng	Tiêu chuẩn dùng n-ớc	$Q_{SX(i)}$ ( lít / s)	$Q_1$ ( lít / s)
Trộn vữa xây	4.785m <sup>3</sup>	300 l m <sup>3</sup> vữa	0,05	0,34
Trộn vữa trát	2,014m <sup>3</sup>	300 l m <sup>3</sup> vữa	0,021	
Bảo d-ống BT	321,4m <sup>2</sup>	1,5 l m <sup>2</sup> sàn	0,0167	
Công tác khác			0,25	

$Q_2$  : l- u l- ợng n- ớc dùng cho sinh hoạt trên công tr- ờng :

$$Q_2 = N \times B \times k_g / 3600 \times n .$$

Trong đó :

N : số công nhân vào thời điểm cao nhất có mặt tại công tr- ờng . Theo biểu đồ tiến độ N= 109 ng- ời .

B: l- ợng n- ớc tiêu chuẩn dùng cho 1 công nhân ở công tr- ờng, B = 15 l /ng- ời  
 $k_g$ : hệ số sử dụng n- ớc không điều hòa ,  $k_g = 2,5$ .

$$Q_2 = 109.15. 2,5 / 3600.8 = 0,205 ( l/s)$$

$Q_3$  : l- u l- ợng n- ớc dùng cho sinh hoạt ở lán trại :

$$Q_3 = N . B . k_g . k_{ng} / 3600 \times n .$$

Trong đó :

N : số ng- ời nội trú tại công tr- ờng = 30% tổng dân số trên công tr- ờng

Nh- đâ tính toán ở phần tr- ớc : tổng dân số trên công tr- ờng 168 ng- ời

$$\rightarrow N = 30\% . 168 = 51 (ng- ời).$$

B : l- ợng n- ớc tiêu chuẩn dùng cho 1 ng- ời ở lán trại : B = 25 l / ng- ời .

$k_g$  : hệ số sử dụng n- ớc không điều hòa .  $k_g = 2,5$ .

$k_{ng}$  : hệ số xét đến sự không điều hòa ng- ời trong ngày.  $k_{ng} = 1,5$ .

$$Q_3 = 51. 25. 2,5. 1,5 / 3600.8 = 0,237 ( l/s)$$

$Q_4$  : l- u l- ợng n- ớc dùng cho cứu hỏa :  $Q_4 = 3 ( l/s)$ .

Nh- vây : tổng l- u l- ợng n- ớc :

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 0,34 + 0,205 + 0,237 + 3 = 3,782 l/s$$

Mạng l- ới đ- ờng ống chính có đ- ờng kính tính theo công thức:

# TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG

$$D = \sqrt{\frac{4.Q}{\pi.v.1000}} = \sqrt{\frac{4.3.782}{3,14.1,5.1000}} = 0,05667 \text{ m}$$

Chọn D = 60 mm

Mạng l- ới đ- ờng ống phụ : dùng loại ống có đ- ờng kính D = 30 mm.

N- ớc lấy từ mạng l- ới thành phố , đủ điều kiện cung cấp cho công trình .

## V. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khi thi công trình để đảm bảo đúng tiến độ và an toàn cho ng- ời và các ph- ơng tiện cơ giới ta cần phải tuân theo các nguyên tắc sau:

-Phổ biến qui tắc an toàn lao động đến mọi ng- ời tham gia trong công tr- ờng xây dựng.

-Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn thi công cho máy móc và công nhân trong công tr- ờng nhất là cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho ng- ời công nhân.

-Trong tất cả các giai đoạn thi công cần phải theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các điều lệ qui tắc kỹ thuật an toàn.

### 1. Biện pháp an toàn khi thi công bê tông cốt thép:

Các bộ phận ván khuôn tấm lớn, cũng nh- các hộp ván khuôn cột xà dầm ... đ- ợc lắp bằng cần trực phải có cấu tạo cứng, các bộ phận của chúng phải liên kết với nhau chắc chắn. Việc lắp các tấm ván khuôn cột, dầm và xà gồ phải tiến hành từ trên sàn công tác, trên dàn giáo. Sàn phải có thành chắc để bảo vệ.

Tháo ván khuôn và dàn giáo chống giữ ván khuôn chỉ đ- ợc phép theo sự đồng ý của cán bộ chỉ đạo thi công.Tháo dàn giáo ván khuôn của các kết cấu bê tông cốt thép phức tạp phải tiến hành theo cách thức và trình tự đã đề ra trong thiết kế thi công.

Các lỗ để chừa ở trên sàn bê tông cốt thép để đổ bê tông sau khi tháo ván khuôn phải che đầy chắc chắn. Các thùng để chuyển vữa bê tông bằng cần trực phải tốt. Tr- ớc khi đổ bê tông, cán bộ thi công phải kiểm tra sự đúng đắn và chắc chắn của ván khuôn đã đặt, dàn giáo chống đỡ và sàn công tác. Khi đổ bê tông ở trên cao hơn 1,5 m sàn công tác phải có thành chắn bảo vệ.

Những chỗ mà ng- ời có thể tới ở gần nhà hoặc công trình đang thi công cần phải có các l- ới chắn bảo vệ.**2. Biện pháp an toàn khi hoàn thiện:**

Khi xây ng- ời công nhân làm việc ở d- ới hố móng, trên các sàn nhà hoặc trên sàn công tác; vị trí làm việc thay đổi theo kích th- ớc t- ờng xây và có thể ở một

## **TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

độ cao khá lớn, do vậy phải tạo điều kiện làm việc an toàn cho người thợ ở bất kỳ vị trí nào.

Người thợ xây ở các cao trình mới trên đà giáo không được thấp hơn hai hàng gạch so với mặt sàn công tác. Dàn giáo phải có lan can cao ít nhất là 1m, ván làm lan can phải đóng vào phía trong, tấm ván chắn dưới cùng phải có bề rộng ít nhất là 15cm.

Để đảm bảo không xếp quá tải vật liệu lên sàn và lên dàn giáo cần phải treo các bảng qui định giới hạn và sơ đồ bố trí vật liệu... Các lỗ cửa chấn chèn khung cửa sổ cửa đi phải được che chắn.

Nếu việc xây được tiến hành từ dàn giáo trong thì cần đặt lớp bảo vệ dọc đường theo chu vi nhà.

Trong thời gian xây và khi xây xong phải dọn tất cả các gạch thừa, dụng cụ và các thứ khác để đề phòng trường hợp bị rơi xuống dưới.

Khi làm việc ở bên ngoài đường công nhân làm việc phải đeo dây an toàn. Các mảng đường nhô ra khỏi mặt đường 30cm phải xây từ dàn giáo phía ngoài.

Việc liên kết các chi tiết đúc sẵn với đường xây phải tiến hành chính xác và thận trọng, phải kịp thời xây đường lên để giữ thăng bằng.

### **3. Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với máy móc:**

Trước khi bắt đầu làm việc phải thường xuyên kiểm tra dây cáp và dây cầu đèn dùng. Không được cầu quá sức nâng của cần trục, khi cầu những vật liệu và trang thiết bị có tải trọng gần giới hạn sức nâng cần trục cần phải qua hai động tác: đầu tiên treo cao 20-30 cm kiểm tra móc treo ở vị trí đó và sự ổn định của cần trục sau đó mới nâng lên vị trí cần thiết. Tốt nhất tất cả các thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra trước khi sử dụng chúng và phải đóng nhãn hiệu có chỉ dẫn các sức cầu cho phép.

Người lái cần trục phải qua đào tạo, có chuyên môn.

Người lái cần trục khi cầu hàng bắt buộc phải báo trước cho công nhân đang làm việc ở dưới bằng tín hiệu âm thanh. Tất cả các tín hiệu cho thợ lái cần trục đều phải do tổ trưởng phát ra. Khi cầu các cầu kiện có kích thước lớn đội trưởng phải trực tiếp chỉ đạo công việc, các tín hiệu được truyền đi cho người lái cầu phải bằng điện thoại, bằng vô tuyến hoặc bằng các dấu hiệu quay - óc bằng tay, bằng cờ. Không cho phép truyền tín hiệu bằng lời nói.

Các công việc sản xuất khác chỉ được cho phép làm việc ở những khu vực không nằm trong vùng nguy hiểm của cần trục. Những vùng làm việc của cần trục phải

## **TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HẢI ĐỘNG**

có rào ngăn đặt những biển chỉ dẫn những nơi nguy hiểm cho người và xe cộ đi lại. Những tổ đội công nhân lắp ráp không được đứng dưới vật cẩu và tay cần của cần trục.

Đối với thợ hàn phải có trình độ chuyên môn cao, trước khi bắt đầu công tác hàn phải kiểm tra hiệu chỉnh các thiết bị hàn điện, thiết bị tiếp địa và kết cấu cũng như độ bền chắc cách điện. Kiểm tra dây nối từ máy đến bảng phân phối điện và tới vị trí hàn. Thợ hàn trong thời gian làm việc phải mang mặt nạ có kính màu bảo hiểm. Để đề phòng tia hàn bắn vào trong quá trình làm việc cần phải mang găng tay bảo hiểm, làm việc ở những nơi ẩm ướt phải đi ủng cao su.

### **VI. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.**

Trong mặt bằng thi công bố trí hệ thống thu nước thải và lọc nước trước khi thoát nước vào hệ thống thoát nước thành phố, không cho chảy tràn ra bẩn xung quanh.

Bao che công trường bằng hệ thống giáo đứng kết hợp với hệ thống lưới ngăn cách công trình với khu vực lân cận, nhằm đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong suốt thời gian thi công.

Đất và phế thải vận chuyển bằng xe chuyên dụng có che đậy cẩn thận, đảm bảo quy định của thành phố về vệ sinh môi trường.

Hạn chế tiếng ồn như sử dụng các loại máy móc giảm chấn, giảm rung. Bố trí vận chuyển vật liệu ngoài giờ hành chính.
